

国道19号瑞浪恵那道路の工事だより

～令和5年6月～


地域の皆様へ

皆様には平素より、国道19号瑞浪恵那道路建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

ご迷惑をおかけ致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期の完成を目指して施工してまいりますので、ご理解・ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

回覧

表面

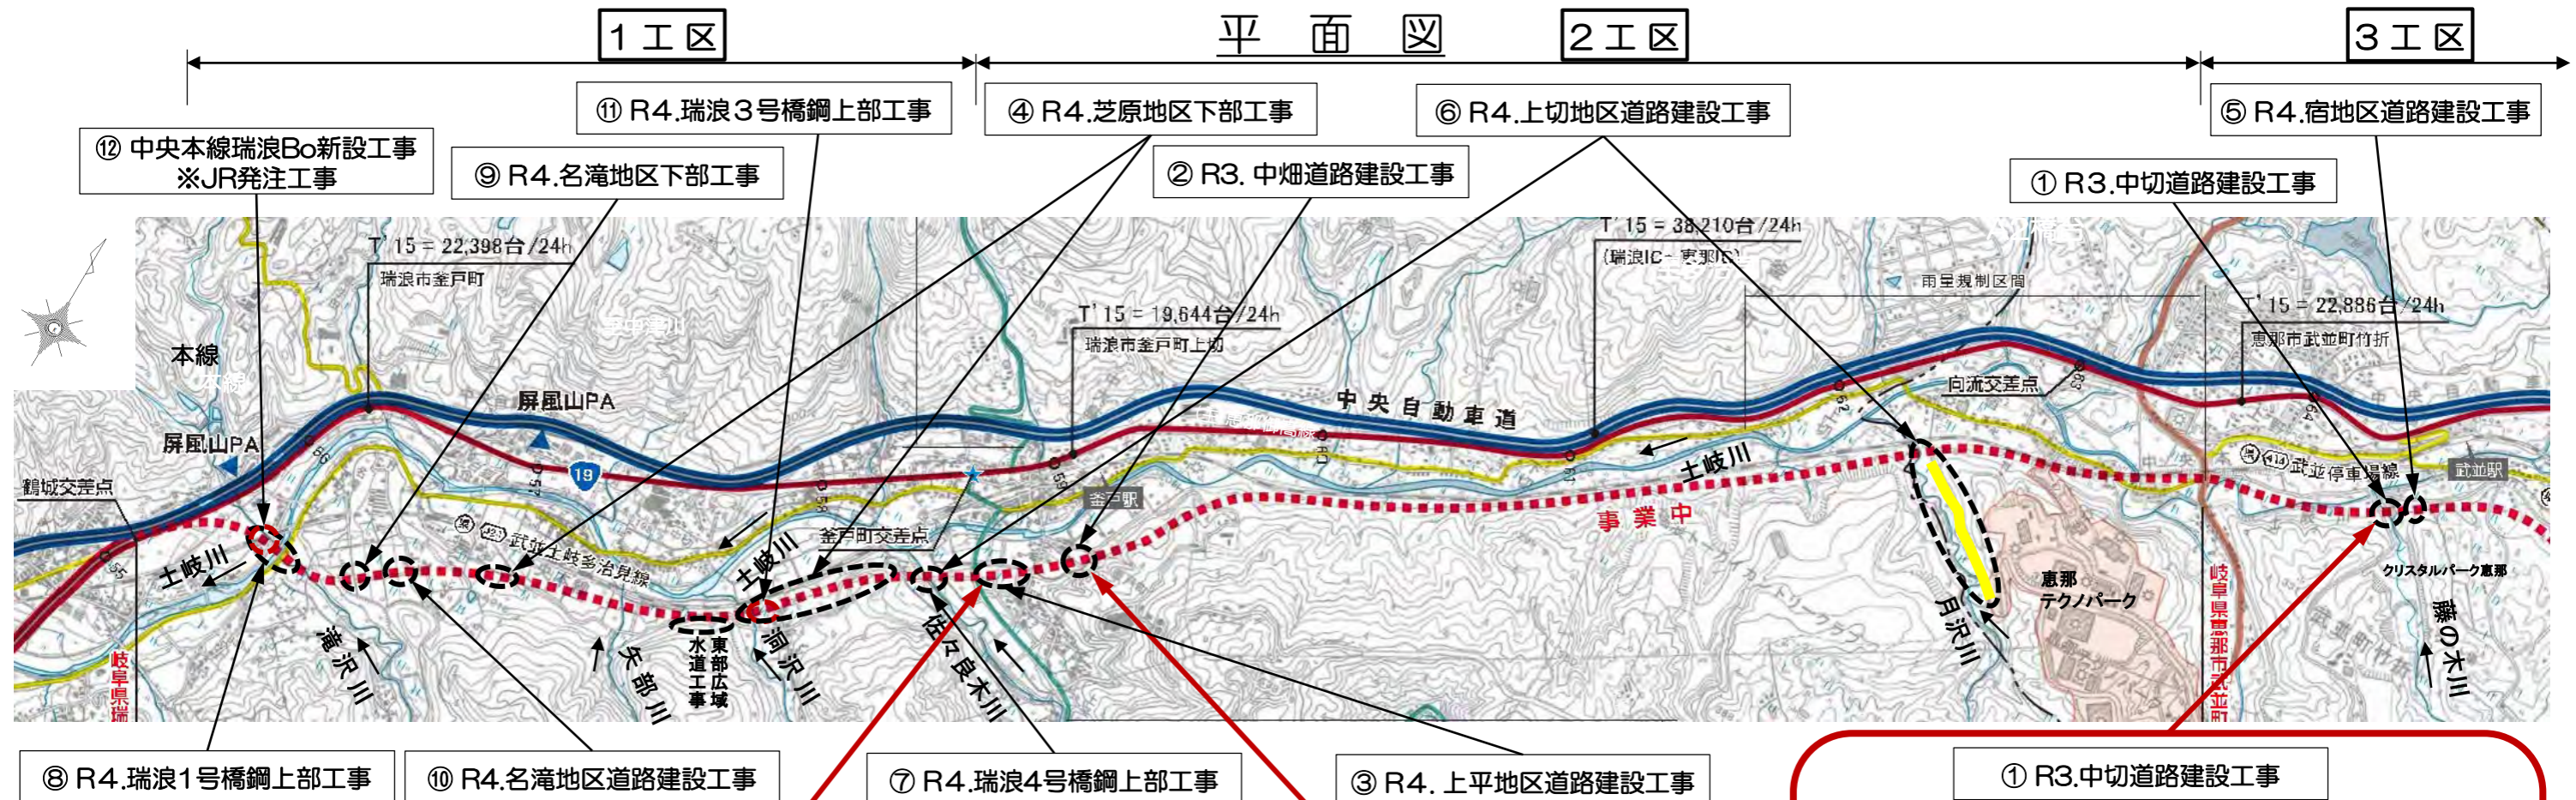

③ R4.上平地区道路建設工事



現在は本線の掘削と補強土壁工を進めています。

② R3.中畑道路建設工事



現在、2-2号門型函渠工の型枠、鉄筋、コンクリート打設作業を行っています。引き続き工事のご協力をお願いします。

① R3.中切道路建設工事



3-2号函渠工の型枠・鉄筋組立、コンクリート打設を施工しています。引き続き工事のご協力をお願いします。



瑞浪恵那道路工事連絡協議会
 国土交通省 多治見砂防国道事務所
 瑞浪国道維持出張所内 TEL0572-68-4591

【お知らせ】

地元車両優先で安全には十分配慮して通行しますので、ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。

瑞浪恵那道路工事に係る受注会社間で連絡調整を図り、協力して工事を安全かつ円滑に実施する事を目的としています。

国道19号瑞浪恵那道路の工事だより

～令和5年6月～

裏面

工事名	① R3.中切道路建設工事	工事名	② R3.中畑道路建設工事	工事名	③ R4.上平地区道路建設工事	工事名	④ R4.芝原地区下部工事	工事名	⑤ R4.宿地区道路建設工事
工期	令和4年3月31日～令和5年6月23日	工期	令和4年4月1日～令和5年6月23日	工期	令和4年9月9日～令和6年3月29日	工期	令和4年10月3日～令和6年3月29日	工期	令和4年12月6日～令和6年2月29日
施工業者	(株)中島工務店	施工業者	(株)中島工務店	施工業者	(株)中島工務店	施工業者	(株)吉川組	施工業者	(株)吉川工務店
施工箇所	恵那市武並町	施工箇所	瑞浪市釜戸町	施工箇所	瑞浪市釜戸町	施工箇所	瑞浪市釜戸町	施工箇所	恵那市武並町
6月の作業内容	カルバート工(鉄筋・型枠組立、コンクリート打設)、道路土工、地下排水工	6月の作業内容	カルバート工 型枠、鉄筋、コンクリート打設	6月の作業内容	道路土工、補強土壁工、仮設工	6月の作業内容	道路土工、仮設工	6月の作業内容	――
								<p>準備中</p>	

工事名	⑥ R4.上切地区道路建設工事	工事名	⑦ R4.瑞浪4号橋鋼上部工事	工事名	⑧ R4.瑞浪1号橋鋼上部工事	工事名	⑨ R4.名滝地区下部工事	工事名	⑩ R4.名滝地区道路建設工事
工期	令和5年1月16日～令和6年2月29日	工期	令和4年9月9日～令和6年2月29日	工期	令和4年9月27日～令和6年2月29日	工期	令和5年4月14日～令和5年9月29日	工期	令和5年4月28日～令和6年2月29日
施工業者	(株)加藤工務店	施工業者	宇野重工(株)	施工業者	瀧上工業(株)	施工業者	板垣建設(株)	施工業者	(株)鳴海組
施工箇所	瑞浪市釜戸町～恵那市武並町	施工箇所	瑞浪市釜戸町	施工箇所	瑞浪市土岐町 鶴城～下沢	施工箇所	瑞浪市土岐町	施工箇所	瑞浪市土岐町
6月の作業内容	道路土工	6月の作業内容	――	6月の作業内容	――	6月の作業内容	準備工、仮設工	6月の作業内容	――
		<p>製作中</p>		<p>製作中</p>				<p>準備中</p>	

工事名	⑪ R4.瑞浪3号橋鋼上部工事	工事名	⑫ 中央本線瑞浪Bo新設
工期	令和4年3月16日～令和7年2月28日	工期	令和4年11月9日～令和7年12月1日
施工業者	(株)北都鉄工	施工業者	名工建設(株) ※JR発注工事
施工箇所	瑞浪市釜戸町	施工箇所	瑞浪市土岐町 鶴城～下沢
6月の作業内容	――	6月の作業内容	下部工(鉄筋・型枠組立、コンクリート打設)
<p>製作中</p>			

工事用車両プレート設置箇所 (A3サイズマグネット)







左右両面

瑞浪恵那道路
中島工務店

瑞浪恵那道路
(株)吉川組

瑞浪恵那道路
加藤工務店

瑞浪恵那道路
(株)西尾建設

瑞浪恵那道路
板垣建設

瑞浪恵那道路
鳴海組

- 上記のプレートを貼った工事用車両が通行します。
- お気づきの点がございましたら、ご遠慮なく瑞浪国道維持出張所までご連絡ください。
TEL 0572-68-4591
