

国道19号瑞浪恵那道路の工事だより

～令和6年9月～


地域の皆様へ

皆様には平素より、国道19号瑞浪恵那道路建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

ご迷惑をおかけ致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期の完成を目指して施工してまいりますので、ご理解・ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

回覧

表面

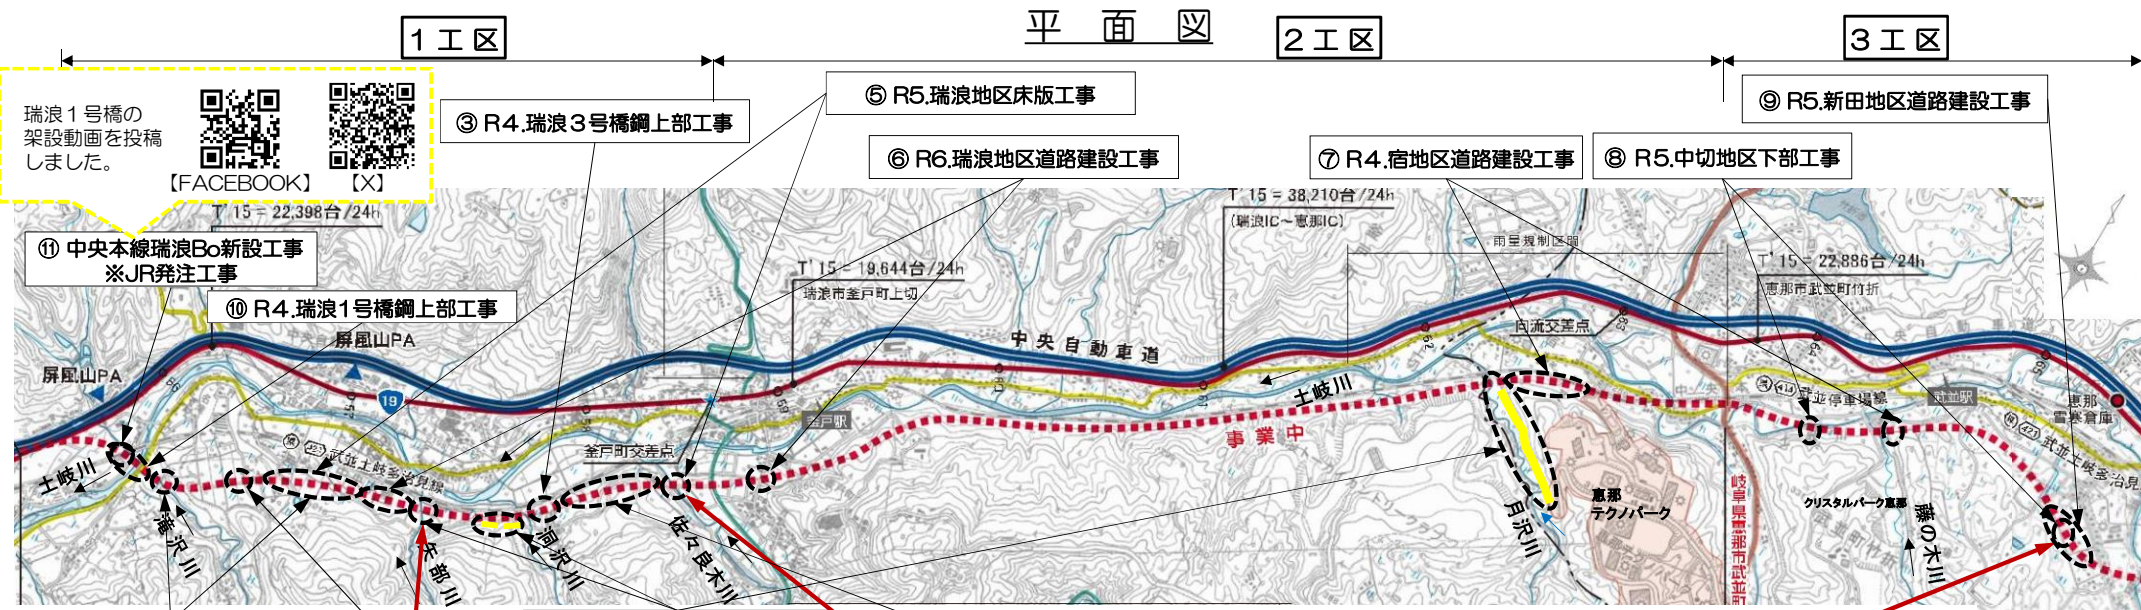


上切地区道路建設工事



6号横断函渠本体工の施工が完了しました。
舗装、護岸復旧等の周辺付帯工に着手します。
引き続きご協力の程、宜しくお願い致します。

瑞浪地区床版工事

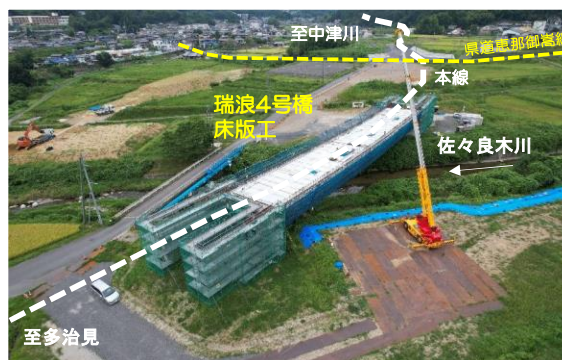

4号橋の床版コンクリート打設が完了しました。
近隣住民の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、
ご理解ご協力の程よろしくお願い致します。

中切地区下部工事



3-5号横断函渠工の約半分が完了しました。今後も細心の注意を
払い施工します。ご理解ご協力の程よろしくお願い致します。

【お知らせ】

地元車両優先で安全には十分配慮して通行しますので、ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。

瑞浪恵那道路工事に係る受注会社間で連絡調整を図り、
協力して工事を安全かつ円滑に実施する事を目的として
います。



瑞浪恵那道路工事連絡協議会

国土交通省 多治見砂防国道事務所

瑞浪国道維持出張所内 TEL0572-68-4591

国道19号瑞浪恵那道路の工事だより

～令和6年9月～

裏面

工事名 ① R5.土岐地区道路建設工事 工期 令和6年4月12日～令和7年2月28日 施工業者 (株)加藤工務店 施工箇所 瑞浪市土岐町 9月の作業内容 アンカー工、カルバート工（床堀、均しコンクリート打設） 	工事名 ② R4.上切地区道路建設工事 工期 令和5年1月16日～令和6年10月31日 施工業者 (株)加藤工務店 施工箇所 瑞浪市釜戸町～恵那市武並町 9月の作業内容 6号函渠周辺付帯工 東濃用水3号線舗装工・防護柵工 	工事名 ③ R4.瑞浪3号橋鋼上部工事 工期 令和4年3月16日～令和7年2月28日 施工業者 (株)北都鉄工 施工箇所 瑞浪市釜戸町 9月の作業内容 準備工、昇降足場工、ベント工、支承工 	工事名 ④ R6.下沢地区道路建設工事 工期 令和6年8月30日～令和8年2月27日 施工業者 板垣建設(株) 施工箇所 瑞浪市土岐町～釜戸町 9月の作業内容 準備工 	工事名 ⑤ R5.瑞浪地区床版工事 工期 令和6年4月8日～令和7年2月28日 施工業者 (株)吉川工務店 施工箇所 瑞浪市釜戸町 9月の作業内容 (瑞浪4号橋)床版工 (公文垣内地区)排水構造物工、 路体盛土工 
工事名 ⑥ R6.瑞浪地区道路建設工事 工期 令和6年7月31日～令和8年2月27日 施工業者 (株)中島工務店 施工箇所 瑞浪市釜戸町 9月の作業内容 函渠工（掘削） 仮設工（迂回路） 	工事名 ⑦ R4.宿地区道路建設工事 工期 令和4年12月6日～令和6年12月27日 施工業者 (株)吉川工務店 施工箇所 恵那市武並町 9月の作業内容 6号門型函渠工（鉄筋、型枠、コンクリート打設） 	工事名 ⑧ R5.中切地区下部工事 工期 令和5年9月1日～令和7年3月28日 施工業者 (株)中島工務店 施工箇所 恵那市武並町 9月の作業内容 (新田地区)3-5横断函渠工（鉄筋、型枠、 コンクリート打設） 	工事名 ⑨ R5.新田地区道路建設工事 工期 令和6年4月15日～令和7年2月28日 施工業者 恵中建設(株) 施工箇所 恵那市武並町 9月の作業内容 道路土工、排水構造物工 	工事名 ⑩ R4.瑞浪1号橋鋼上部工事 工期 令和4年9月27日～令和7年2月28日 施工業者 瀧上工業(株) 施工箇所 瑞浪市土岐町 鶴城～下沢 9月の作業内容 大型土のう作製 
工事名 ⑪ 中央本線瑞浪Bo新設 工期 令和4年11月9日～令和7年12月1日 施工業者 名工建設(株) ※JR発注工事 施工箇所 瑞浪市土岐町 鶴城～下沢 9月の作業内容 休工 	工事名 ⑫ R6.瑞浪地区整備工事 工期 令和6年7月31日～令和7年3月31日 施工業者 (株)鳴海組 施工箇所 瑞浪市釜戸町 9月の作業内容 準備工・仮設工 	工事用車両プレート設置箇所（A3サイズマグネット）  左右両面 ・工事ごとに番号を分けております。 （お問い合わせの際は番号をお伝えください。） プレート例  ・お気づきの点がございましたら、ご遠慮なく 瑞浪国道維持出張所までご連絡ください。 TEL 0572-68-4591		
