

国道19号瑞浪恵那道路の工事だより

～令和6年12月～


地域の皆様へ

皆様には平素より、国道19号瑞浪恵那道路建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

ご迷惑をおかけ致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期の完成を目指して施工してまいりますので、ご理解・ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

回覧

表面

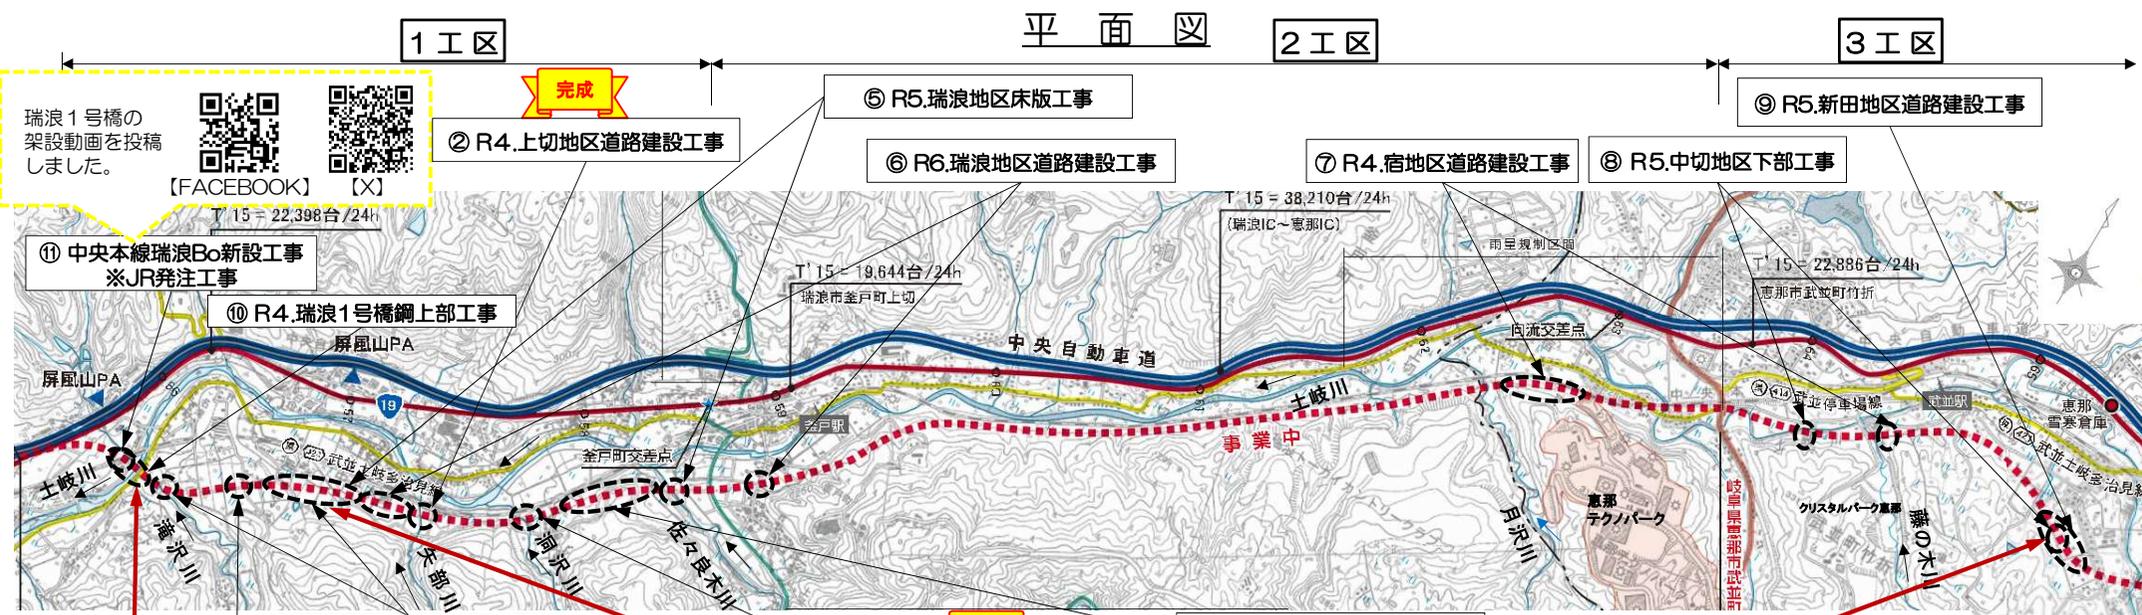

瑞浪1号橋鋼上部工事

瑞浪1号橋、12月から桁架設を行います。ご理解ご協力の程よろしくお願いたします。

瑞浪地区床版工事

現在、盛土工・排水構造土工・舗装工を施工しています。引き続きご理解とご協力の程、よろしくお願致します。

新田地区道路建設工事

現在、大型側溝とスロープ工の施工が完了しました。引き続き排水工を中心に施工していきます。ご理解ご協力の程よろしくお願いたします。

瑞浪恵那道路工事連絡協議会
国土交通省 多治見砂防国道事務所
瑞浪国道維持出張所内 TEL0572-68-4591

【お知らせ】
地元車両優先で安全には十分配慮して通行しますので、ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。

瑞浪恵那道路工事に係る受注会社間で連絡調整を図り、協力して工事を安全かつ円滑に実施する事を目的としています。

国道19号瑞浪恵那道路の工事だより

～令和6年12月～

裏面

工事名	① R5.土岐地区道路建設工事
工期	令和6年4月12日～令和7年2月28日
施工業者	(株)加藤工務店
施工箇所	瑞浪市土岐町
12月の作業内容	カルバート工（1号函渠本体工 鉄筋、型枠、コンクリート打設）

工事名	② R4.上切地区道路建設工事
工期	令和5年1月16日～令和6年10月31日
施工業者	(株)加藤工務店
施工箇所	瑞浪市釜戸町～恵那市武並町
12月の作業内容	完成

工事名	③ R4.瑞浪3号橋鋼上部工事
工期	令和4年3月16日～令和6年11月8日
施工業者	(株)北都鉄工
施工箇所	瑞浪市釜戸町
12月の作業内容	完成

工事名	④ R6.下沢地区道路建設工事
工期	令和6年8月30日～令和8年2月27日
施工業者	板垣建設(株)
施工箇所	瑞浪市土岐町～釜戸町
12月の作業内容	U型擁壁工 固結工 足場工、鉄筋工

工事名	⑤ R5.瑞浪地区床版工事
工期	令和6年4月8日～令和7年2月28日
施工業者	(株)吉川工務店
施工箇所	瑞浪市釜戸町
12月の作業内容	(瑞浪4号橋) 情報管路工・伸縮装置工 (公文垣内地区) 舗装工・排水構造物工

工事名	⑥ R6.瑞浪地区道路建設工事
工期	令和6年7月31日～令和8年2月27日
施工業者	(株)中島工務店
施工箇所	瑞浪市釜戸町
12月の作業内容	【上平地区】 函渠工（躯体工事） 【公文垣内地区】 地盤改良（準備）

工事名	⑦ R4.宿地区道路建設工事
工期	令和4年12月6日～令和6年12月27日
施工業者	(株)吉川工務店
施工箇所	恵那市武並町
12月の作業内容	護岸 ブロック積工、排水構造物工、仮設工

工事名	⑧ R5.中切地区下部工事
工期	令和5年9月1日～令和7年3月28日
施工業者	(株)中島工務店
施工箇所	恵那市武並町
12月の作業内容	(新田地区) 3-5号横断函渠工（埋戻し）、排水構造物工（側溝工、管渠工）

工事名	⑨ R5.新田地区道路建設工事
工期	令和6年4月15日～令和7年3月31日
施工業者	恵中建設(株)
施工箇所	恵那市武並町
12月の作業内容	道路土工、排水構造物工、地盤改良工

工事名	⑩ R4.瑞浪1号橋鋼上部工事
工期	令和4年9月27日～令和7年2月28日
施工業者	瀧上工業(株)
施工箇所	瑞浪市土岐町 鶴城～下沢
12月の作業内容	桁架設工、河川仮締切工

工事名	⑪ 中央本線瑞浪Bo新設
工期	令和4年11月9日～令和7年12月1日
施工業者	名工建設(株) ※JR発注工事
施工箇所	瑞浪市土岐町 鶴城～下沢
12月の作業内容	休工

工事名	⑫ R6.瑞浪地区整備工事
工期	令和6年7月31日～令和7年3月31日
施工業者	(株)鳴海組
施工箇所	瑞浪市釜戸町
12月の作業内容	道路土工・排水構造物工

工事用車両プレート設置箇所 (A3サイズマグネット)

プレート例

瑞浪恵那道路

1

- ・ 工事ごとに番号を分けております。(お問い合わせの際は番号をお伝えください。)
- ・ お気づきの点がございましたら、ご遠慮なく瑞浪国道維持出張所までご連絡ください。TEL 0572-68-4591
