
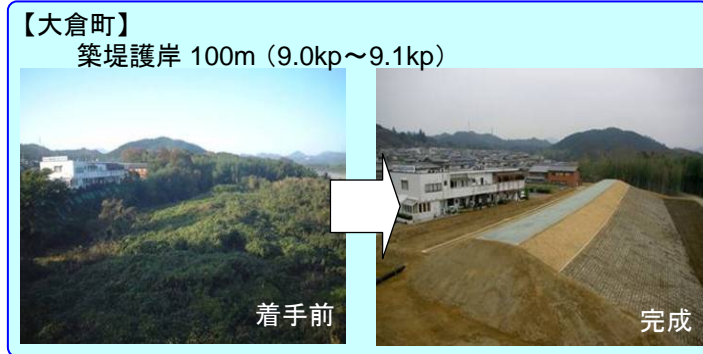
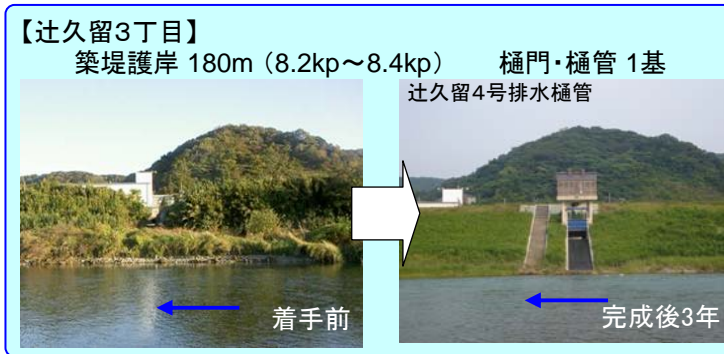



宮川床上浸水対策特別緊急事業の進捗状況（平成23年3月末）

堤防整備進捗状況



堤防工事実施状況
(整備延長3,340m)
未着手480m (14.4%)

堤防用地買収状況
(買収面積約13.7ha)
交渉中0.3ha (2.2%)



事業内容	
堤防整備(築堤・護岸)	3,340m
河道掘削	約56.8万m ³
樋門・樋管	9箇所
全体事業費	114億円
事業期間	平成18年度～平成23年度

- 凡例
- 堤防整備計画線
 - 樋門・樋管の設置箇所
 - 河道掘削箇所
 - 樹木伐採箇所
 - 築堤・河道掘削完了
 - 築堤・河道掘削実施中
 - 樋門・樋管の完成箇所
 - 樋門・樋管の実施中

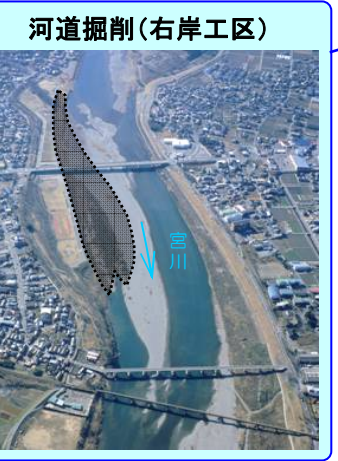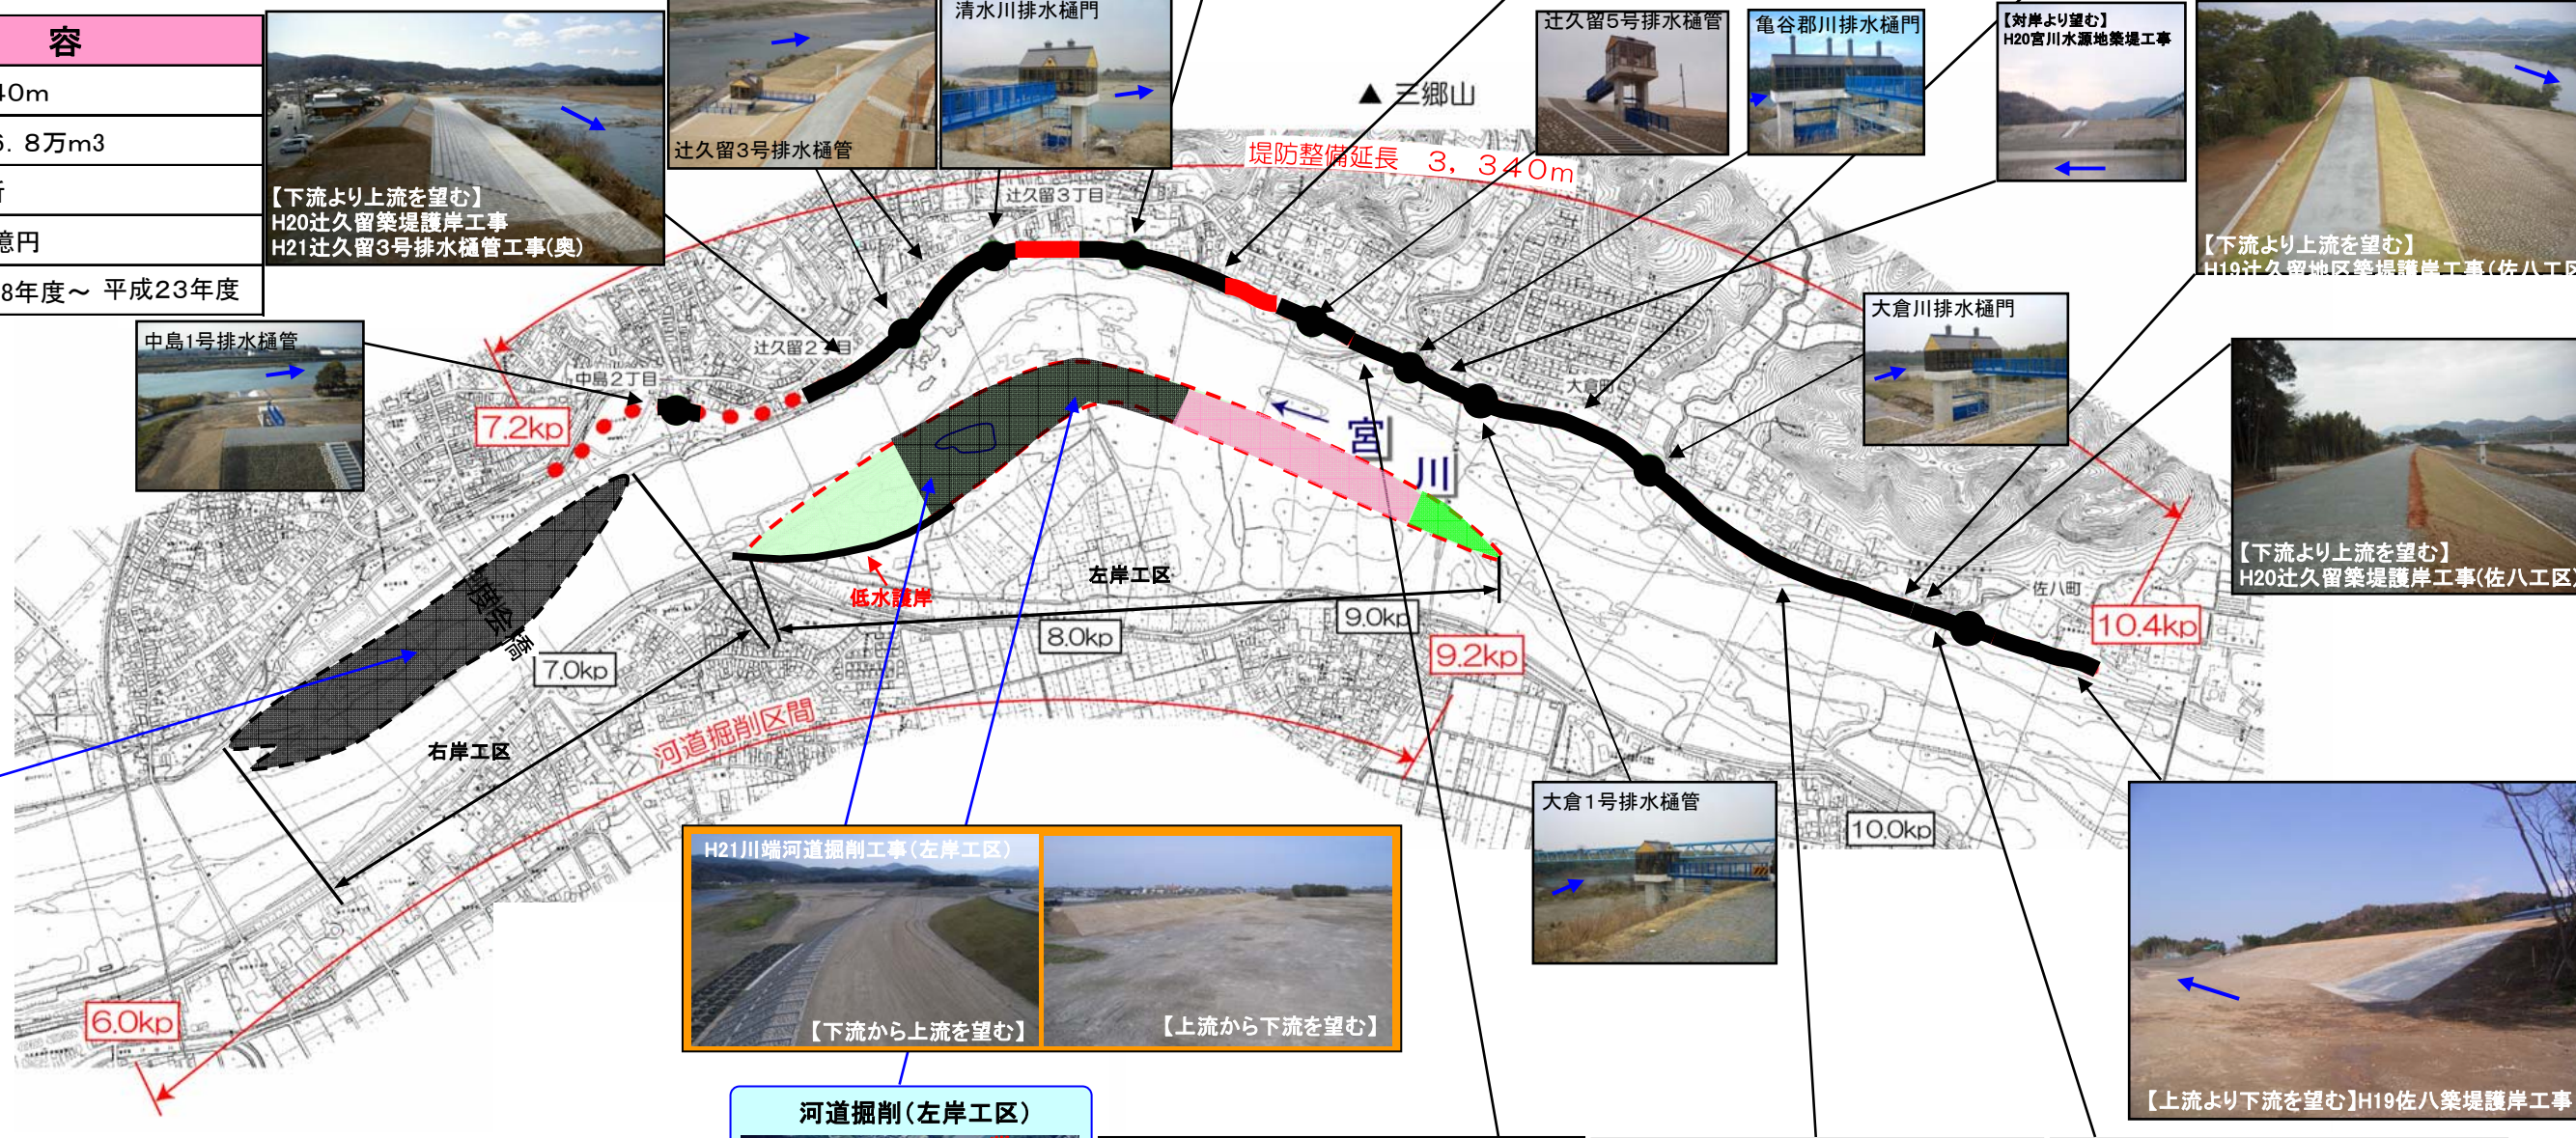

河道掘削進捗状況

河道掘削工事実施状況
(掘削土砂量約56.8万m³)
未着手15.9万m³ (28.0%)

河道掘削用地買収状況
(買収面積約42.7ha)
交渉中0.4ha (1.0%)

