



※日曜・祝日および年末年始は、通行規制を行いません。

2

完成

業者名	(株)土谷組
工事名	平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 改良工事
工事期間	平成25年11月22日～平成26年11月28日
工事内容	道路改良(土工等)1式
11月の作業内容	10月末をもちまして、無事完了致しました。 皆様のご協力有難う御座いました。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 大島 0574-50-2739

<進捗状況> 進捗率 100.0% (H26.10月末)



着工前



10月末

発注者

国土交通省 中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)

工事課

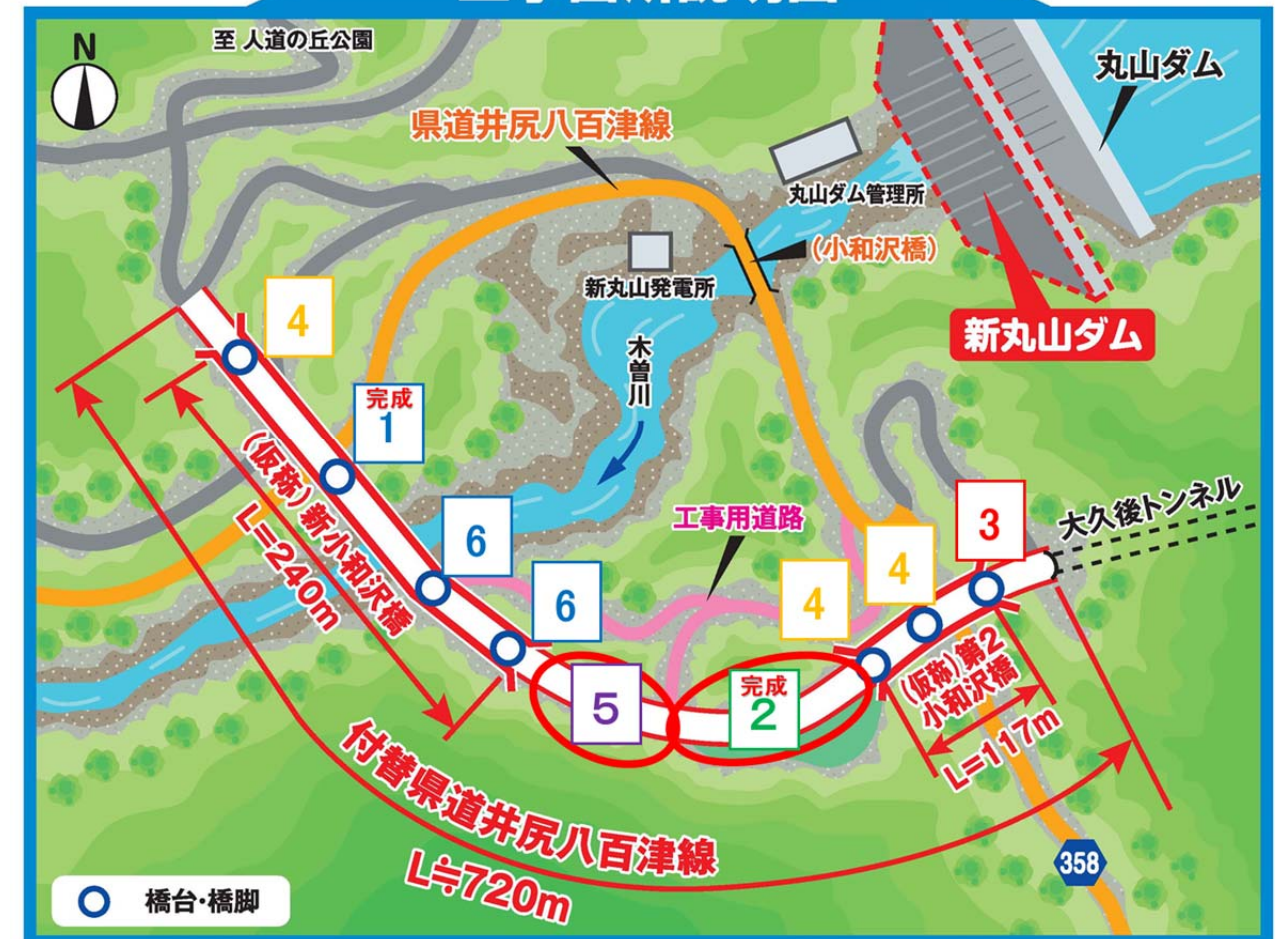
新丸山ダム

井尻八百津線関連工事だより(11月度)





皆様には日頃から、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

工事の近況状況及び平成26年11月度の工事予定をお知らせ致します。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工しますので、ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解を賜りますようお願い致します。
尚、何かお気づきの点などがございましたら、遠慮なくお申し付け下さい。




工事箇所説明図





3

業者名	曙開発(株)
工事名	平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 第2小和沢橋下部工事
工事期間	平成25年12月 7日～平成26年1月26日
工事内容	第2小和沢橋 橋台 1基、道路改良(土工等) 1式
11月の作業内容	現在橋の台座(橋台)を施工中です。10月末にはコンクリートを完了し、順次埋戻しや橋台周りの整備を行っていきます。 ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 今井 0574-43-2650
<p><進捗状況> 進捗率 70% (H26.10月末) 橋台施工中です。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">      </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 着工前 10月末 </div>	

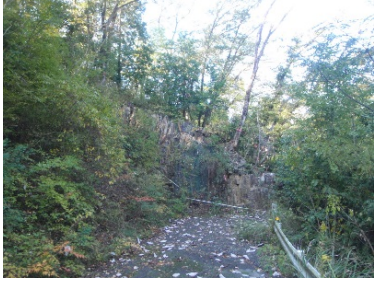

4

業者名	日産工業(株)
工事名	平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 橋梁下部工事
工事期間	平成26年 3月14日～平成27年 1月16日
工事内容	新小和沢橋 橋台 1基、第2小和沢橋 橋台 1基、橋脚 1基
11月の作業内容	(仮称)第2小和沢橋P1橋脚の基礎(深礎)工事を11月中旬ごろから施工を行う予定をしています。火薬の使用に伴い県道井尻八百津線を10分程度の通行止め(1日1回～3回予定)をさせていただく予定です。(別図規制情報参照)発破時間、発破に伴う規制については、お知らせ看板にてお知らせ致します。ご迷惑をおかけいたしますがご理解とご協力の程、宜しくお願ひ申し上げます。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 遠藤 0574-50-8629
<p><進捗状況> 進捗率 18.2% (H26.10月末)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 着工前 (第2小和沢橋 A2) 10月末 (第2小和沢橋 A2) </div>	

5

業者名	北川工務(株)
工事名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線改良工事
工事期間	平成26年 8月20日～平成27年 3月10日
工事内容	道路改良(土工等) 1式
11月の作業内容	関係機関との協議が遅れており、工事の着工も遅れています。協議が整う11月の中頃より、立木の伐採・搬出、仮水路の設置など土工工事を行う予定をしております。ご理解とご協力の程、宜しくお願ひ致します
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 瀬藤 0574-25-2323
<p><進捗状況> 進捗率 0% (H26.10月末)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   <div style="text-align: center;"> <p>未着工</p> <p>10月末</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 着工前 10月末 </div>	

6

業者名	北川工務(株)
工事名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋下部工事
工事期間	平成26年10月18日～平成27年 3月20日
工事内容	新小和沢橋 橋台 1基、橋脚 1基、道路改良(工事用道路) 1式
11月の作業内容	11月の中頃より着工する予定です。立木の伐採・搬出と仮設道路施工のための土工工事を行います。 ご理解とご協力の程、宜しくお願ひ致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 北川 0574-25-2323
<p><進捗状況> 進捗率 0% (H26.10月末)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   <div style="text-align: center;"> <p>未着工</p> <p>10月末</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 着工前 10月末 </div>	
