



※作業日予定のない、日曜・祝日および8/14~8/17は、通行規制を行いません。

回覧

地域の皆様へ

平成26年6月

新丸山ダム 井尻八百津線関連工事だより (6月度)

皆様には日頃から、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

工事の近況及び平成26年6月度の工事予定をお知らせ致します。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工しますので、ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解を賜りますようお願い致します。
尚、何かお気づきの点などがございましたら、遠慮なくお申し付け下さい。

発注者

**国土交通省 中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)
工事課**



1

業者名	(株)栗山組
工事名	平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 新小和沢橋下部工事
工事期間	平成25年10月29日～平成26年 7月31日
工事内容	新小和沢橋 橋脚 1基
6月の作業内容	橋脚の柱部分の施工を行います。6月に3回程度のコンクリート打設を行います。1日当たり20台程度の生コン車が通行します。地元の皆様へは、以前同様、「お知らせ看板」にて、お知らせ致します。宜しくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 森田 0574-49-1665

<進捗状況> 進捗率 60% (H26.5月末)



着工前



5月末

2

業者名	(株)土谷組
工事名	平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 改良工事
工事期間	平成25年11月22日～平成26年 9月30日
工事内容	道路改良(土工等)1式
6月の作業内容	主に掘削・場内路体盛土・排水構造物工を行います。路体盛土完了後、6月下旬より再度残土運搬を行う予定です。ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 大島 0574-50-2739

<進捗状況> 進捗率 12% (H26.5月末)



着工当初



5月末

3

業者名	曙開発(株)
工事名	平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 第2小和沢橋下部工事
工事期間	平成25年12月 7日～平成26年 8月22日
工事内容	第2小和沢橋 橋台 1基、道路改良(土工等)1式
6月の作業内容	6月中旬以降、橋台の基礎(深礎)工事に伴う火薬使用により、左岸側の県道井尻八百津線を10分程度(最大2回/日)通行止させていただく予定です。ご迷惑をおかけいたしますが、お待ちいただくか、大久後トンネルまたは八嵩林道へ迂回ください。宜しくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 今井 0574-43-2650

<進捗状況> 進捗率 27% (H26.5月末)

栈橋工事、掘削工事を行っています。



着工前




5月末

4

業者名	日産工業(株)
工事名	平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 橋梁下部工事
工事期間	平成26年 3月14日～平成26年 9月30日
工事内容	新小和沢橋 橋台 1基、第2小和沢橋 橋台 1基、橋脚 1基
6月の作業内容	(仮称)新小和沢橋A2橋台(丸山地区)の仮設道路の整備 → 立木の伐採・運搬 → 橋台の掘削を行います。工事に伴い、6月16日から町道小和沢線の通行止を予定しています。ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 遠藤 0574-50-8629

<進捗状況> 進捗率 0% (H26.5月末)

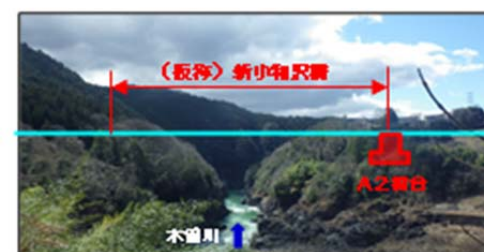

(仮称)新小和沢橋(A2橋台)



着工前(新小和沢橋A2橋台予定箇所)

※(仮称)第二小和沢橋(P1橋脚、A2橋台)は、8月頃から着手予定をしております。
