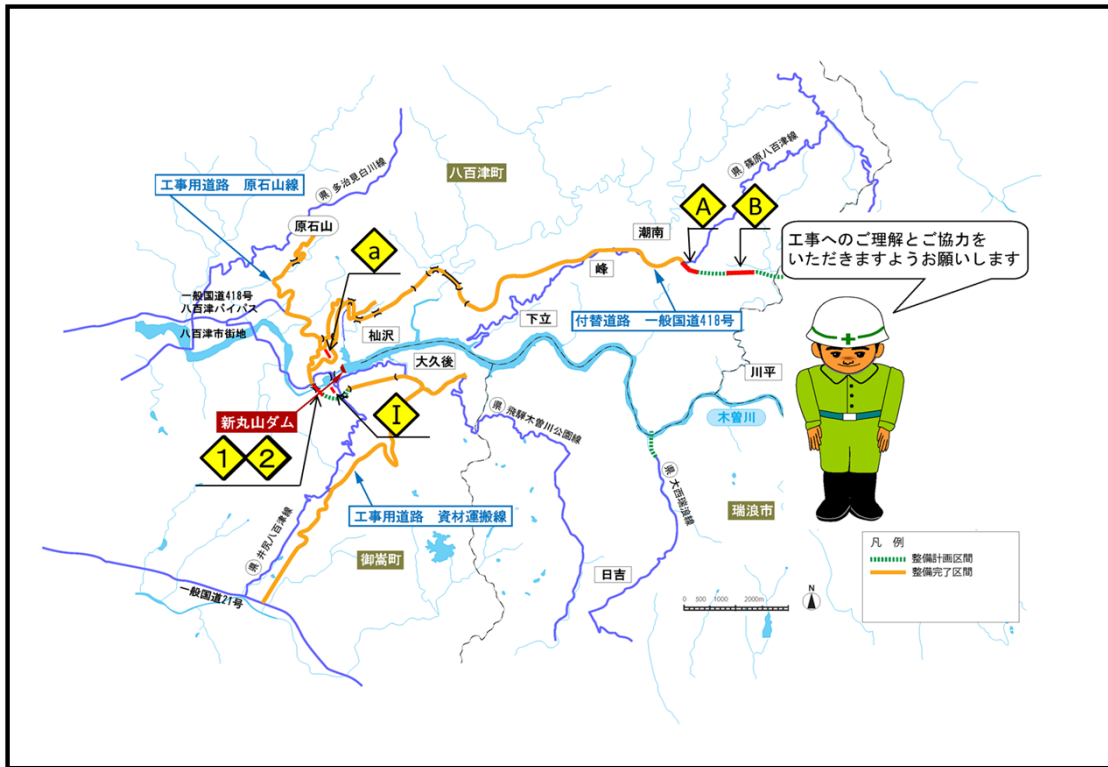


工事進捗 11月

新丸山ダム工事事務所 平成27年度



I

平成27年10月末時点

業者名	(株) 栗山組
工事名	平成26年度 新丸山ダム転流工進入路工事
工事期間	平成27年2月 4日～平成28年 2月 1日 ※ 工期末が変更されました
工事内容	ダム工事に必要な転流工（仮排水路）を整備するための工事用道路を造ります。
11月の作業内容	11月は、法面工と舗装工の施工を予定しています。 作業に伴い、大型車両が通行しますが、安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 山添 雅之 0574-43-1765
進捗率	





着工前



10月末





1

平成27年10月末時点

業 者 名	北川工務（株）
工 事 名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋下部工事
工事期間	平成26年10月18日～平成27年 12月28日 ※ 工期末が延期される予定です。
工事内容	(仮称)新小和沢橋の左岸側の下部工(A1橋台、P1橋脚)及び擁壁工等を造ります。
11月の作業内容	引き続き、P1橋脚及び擁壁工の施工を予定しています。 なお、工事に伴う騒音、振動及び工事用車両の安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 井戸 0574-25-2323
進捗率	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>着工前</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>10月末</p> </div> </div>	

2

平成27年10月末時点

業 者 名	(株)IHIインフラ建設
工 事 名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋PC上部工事
工事期間	平成27年 3月12日～平成28年 9月30日
工事内容	(仮称)新小和沢橋の上部工(橋桁)を架設します。
11月の作業内容	PC片持箱桁製作工の柱頭部部分(橋脚上の長さ12m部分)の完成に伴い、型枠支保工の解体作業を行います。 工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 河合 0574-43-4650
進捗率	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>完成イメージ</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>上流側より撮影</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>左岸側より撮影</p>  </div> </div> <p style="text-align: center;">右岸側P2橋脚</p>	


A

平成27年10月末時点

業 者 名	青協建設（株）
工 事 名	平成26年度 新丸山ダム国道418号6号橋下部工事
工事期間	平成27年1月27日～平成28年2月26日
工事内容	国道418号線6号橋のA1橋台1基、P1橋脚1基、工事用道路
11月の作業内容	A1橋台のパラペットの生コン打設を中旬に行い、またP1橋脚は初旬にフーチングの打設をし、柱の施工に入っていきます。工事用道路は中旬に舗装を行います。資材運搬車が頻繁に通行しますが、安全運転に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しく申し上げます。
問い合わせ先	現場事務所 0575-42-1021 現場代理人 川村 0574-42-1021
進捗率	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-bottom: 1px solid black; background-color: #0056b3; margin-right: 5px;"></div> <div style="flex: 1; border-bottom: 1px solid black; display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> 0102030405060708090100 </div> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>着工前</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>10月末</p> </div> </div>	



B

平成27年10月末時点

業 者 名	セントラル建設（株）
工 事 名	平成26年度 新丸山ダム国道418号潮見地区改良工事
工事期間	平成27年2月 7日～平成28年3月11日
工事内容	八百津町潮見地区において、付け替え国道418号道路工事(土工、擁壁等)を行います。
11月の作業内容	引き続き、土工事・擁壁工事・排水構造物工事を行います。現場付近は、大型工事用車両の通行が多くなりますが、安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 西尾 0574-42-2001
進捗率	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-bottom: 1px solid black; background-color: #0056b3; margin-right: 5px;"></div> <div style="flex: 1; border-bottom: 1px solid black; display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> 0102030405060708090100 </div> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>着工前</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>10月末</p> </div> </div>	

a

平成27年10月末時点

業 者 名	曙開発（株）																						
工 事 名	平成27年度 新丸山ダム管理所敷地造成工事																						
工事期間	平成27年7月29日～平成28年2月25日																						
工事内容	新丸山ダム管理所の敷地造成工事を行います。																						
11月の作業内容	引き続き樹木の伐採等の作業を行って、場内の整備を行った後、順次土砂の運搬を行う予定です。 工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。																						
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 今井 一成 TEL：0574-43-2332																						
進捗率	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; border-bottom: 1px solid black; position: relative;"> <div style="background-color: blue; width: 10%; height: 15px; position: absolute; left: 0;"></div> </div> <div style="margin-left: 5px;"> <table style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="border: none;">0</td> <td style="border: none;">10</td> <td style="border: none;">20</td> <td style="border: none;">30</td> <td style="border: none;">40</td> <td style="border: none;">50</td> <td style="border: none;">60</td> <td style="border: none;">70</td> <td style="border: none;">80</td> <td style="border: none;">90</td> <td style="border: none;">100</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> </td><td style="border: none;"> </td><td style="border: none;"> </td><td style="border: none;"> </td><td style="border: none;"> </td><td style="border: none;"> </td><td style="border: none;"> </td><td style="border: none;"> </td><td style="border: none;"> </td><td style="border: none;"> </td><td style="border: none;"> </td> </tr> </table> </div> </div>	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100											
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100													
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>着工前</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>10月末</p> </div> </div>																							
