


国道247号 西知多道路（東海JCT） 令和3年9月 工事便り

発行 第2号 令和3年10月
編集・監修：愛知県道事務所
TEL：052-761-1195

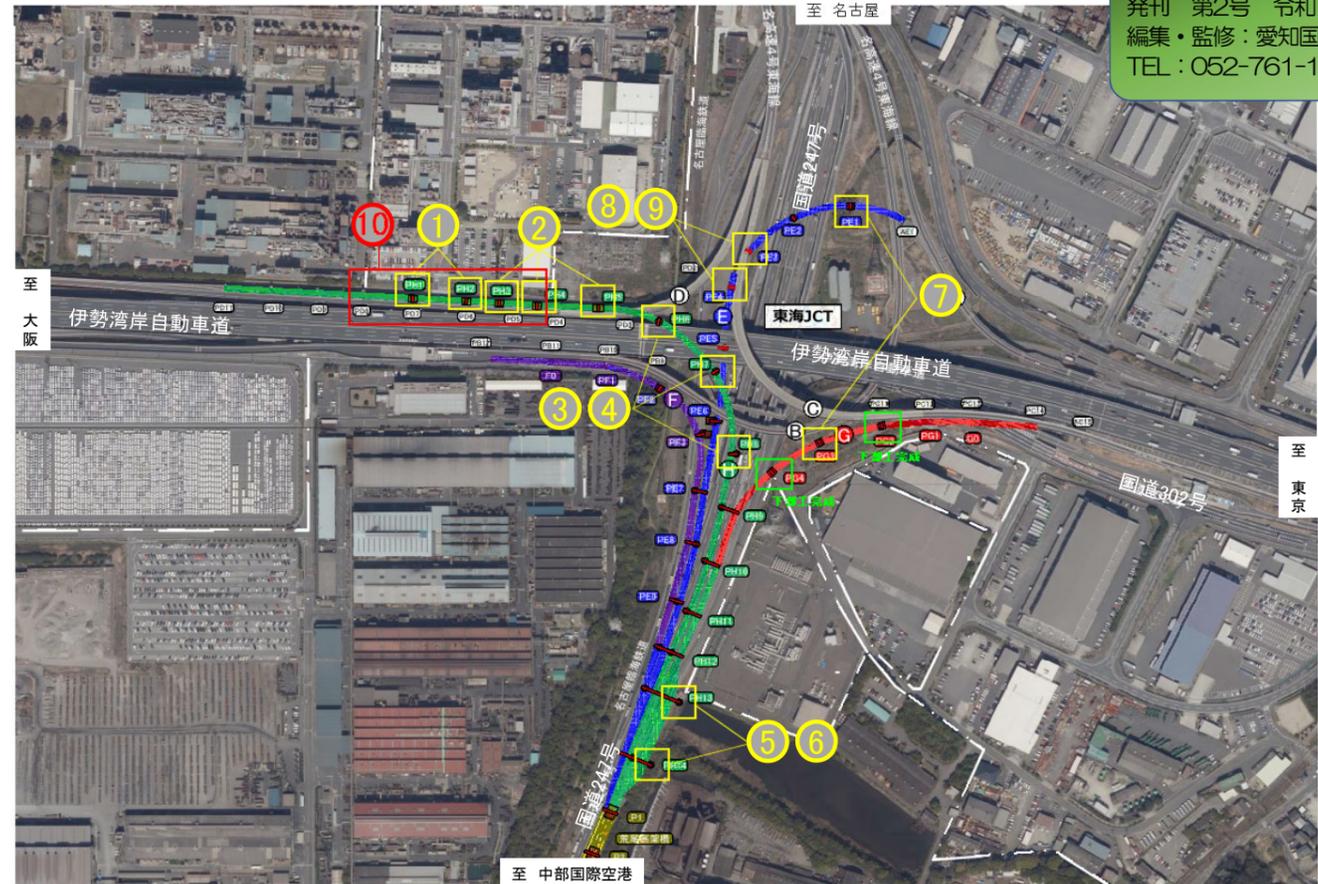

工場製作工

④ 愛知国道		⑥ 愛知国道		⑩ 愛知国道	
工事名	令和2年度 247号西知多道路 東海JCT・Hランプ橋鋼橋脚工事	工事名	令和3年度 247号西知多道路東海 JCT・Hランプ橋P13・14鋼橋脚工事	工事名	令和3年度 247号西知多道路東海JCT・H-1ランプ橋鋼上部工事
工期	令和3年2月26日～令和4年12月16日	工期	令和3年8月27日～令和6年2月29日	工期	令和3年10月1日～令和5年2月28日
施工業者	JFEエンジニアリング 株式会社 TEL 052-561-8611 FAX 052-561-8620	施工業者	佐藤鉄工 株式会社 TEL 052-961-6200 FAX 052-968-2250	施工業者	日本車輛製造 株式会社 TEL 052-882-3320 FAX 052-883-2540
進捗率	16%	進捗率	0%	進捗率	0%
次月作業予定	工場製作工	次月作業予定	準備工	次月作業予定	準備工
工事概要	東海市名和町で東海JCTの橋脚をつくっています。	工事概要	東海市名和町で東海JCTの橋脚をつくっています。	工事概要	東海市新宝町で東海JCTのランプ部の橋梁をつくっています。
今月の工事内容		今月の工事内容		今月の工事内容	
	現在、工場にてPH8の鋼製橋脚の製作をしています。		工事着手に向けて、製作準備をしています。		工事着手に向けて、製作準備をしています。

① 愛知国道	② 愛知国道	③ 愛知国道	⑤ 愛知国道	⑦ 愛知国道	⑧ 愛知国道	⑨ 愛知国道 新しい工事です							
工事名	令和2年度302号梅之郷北地区道路建設工事	工事名	令和2年度 247号西知多道路 東海JCT・Hランプ橋下部工事	工事名	令和2年度 247号西知多道路 東海JCT・Hランプ橋P13・14 基礎工事	工事名	令和元年度 247号西知多道路 東海JCT東部地区下部工事	工事名	令和元年度 247号西知多道路 東海JCT・Eランプ橋下部工事	工事名	令和3年度 愛知国道管内道路建設工事		
工期	令和2年6月4日～令和3年11月30日	工期	令和2年12月1日～令和4年3月31日	工期	令和2年10月29日～令和4年3月31日	工期	令和3年3月16日～令和4年8月26日	工期	令和2年3月1日～令和3年9月30日	工期	令和2年4月1日～令和4年3月31日	工期	令和3年9月16日～令和4年3月25日
施工業者	中日建設 株式会社 TEL 052-364-8815 FAX 052-364-8816	施工業者	矢作建設工業株式会社 TEL 052-602-5840 FAX 052-602-5840	施工業者	株式会社大林組 TEL 052-602-5707 FAX 052-602-5708	施工業者	大日本土木 株式会社 TEL 052-618-5813 FAX 052-618-5814	施工業者	中部土木 株式会社 TEL 052-883-8929 FAX 052-883-8930	施工業者	関興業株式会社 TEL 052-602-4012 FAX 052-825-5150	施工業者	常盤工業 株式会社 TEL 052-803-3431 FAX 052-803-4394
進捗率	97%	進捗率	6%	進捗率	0%	進捗率	0%	進捗率	100%	進捗率	63%	進捗率	0%
次月作業予定	仮設材の解体と排水構造物工	次月作業予定	鋼管杭・場所打ち杭に向けての掘削作業	次月作業予定	PH8橋脚基礎工事に向けての準備工	次月作業予定	工事に向けての現地調査、土壌調査	次月作業予定	作業完了	次月作業予定	杭施工に向けての準備工、構造物撤去工	次月作業予定	構造物撤去工
工事概要	東海市新宝町で西知多道路の橋脚2基をつくっています。	工事概要	東海市新宝町で西知多道路Hランプ橋の橋脚をつくっています。	工事概要	東海市新宝町で西知多道路Hランプ橋の橋脚基礎をつくっています。	工事概要	東海市名和町で東海JCTの橋脚基礎をつくっています。	工事概要	東海市浅山で橋脚をつくっています。	工事概要	東海市新宝町で橋脚の杭を作っています。	工事概要	東海市新宝町で杭施工のヤード確保のための構造物撤去を行います。
今月の工事内容	足場等の仮設材の解体と、排水構造物の復旧をしていきます。	今月の工事内容	掘削の作業ヤード確保のため、構造物を取壊しています。	今月の工事内容	施工ヤード整備に使用予定の仮置土の運搬を行っています。	今月の工事内容	工事着手に向けて、近接の既設構造物の調査や土壌調査などを行っています。	今月の工事内容	PG3橋脚の躯体構築が終わり、ブロック積み擁壁、U型側溝、防護柵の施工を実施しました。	今月の工事内容	杭施工の作業ヤード確保のため、構造物の取り壊しをしています。	今月の工事内容	工事を着手するための準備を行っています。
