
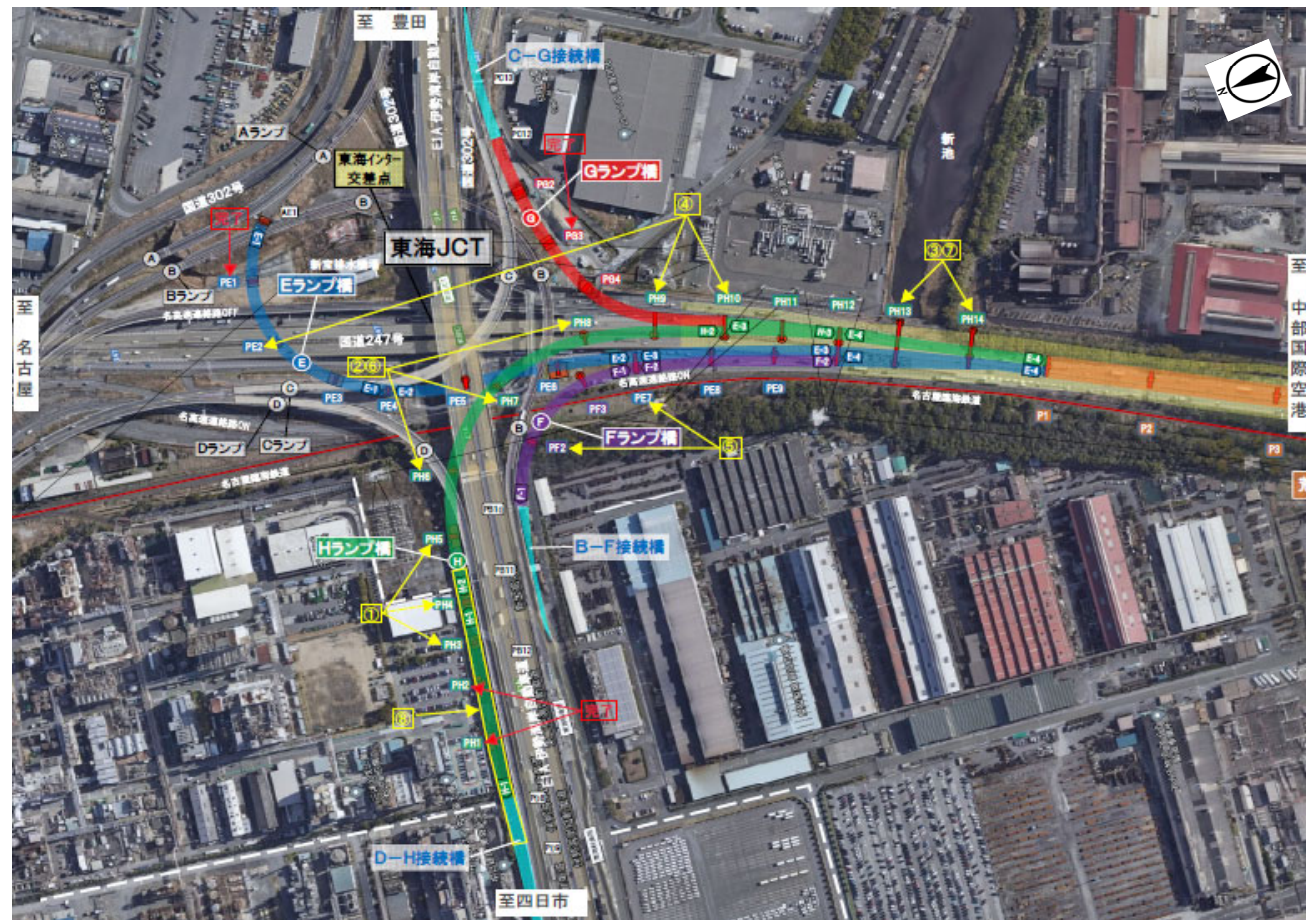
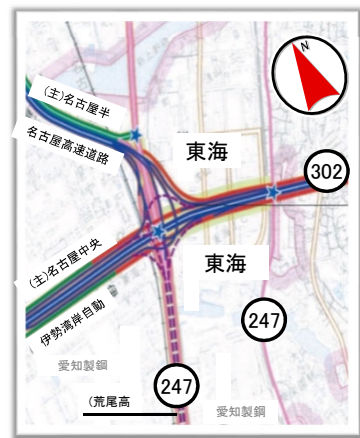


国道247号 西知多道路（東海JCT） 工事便り

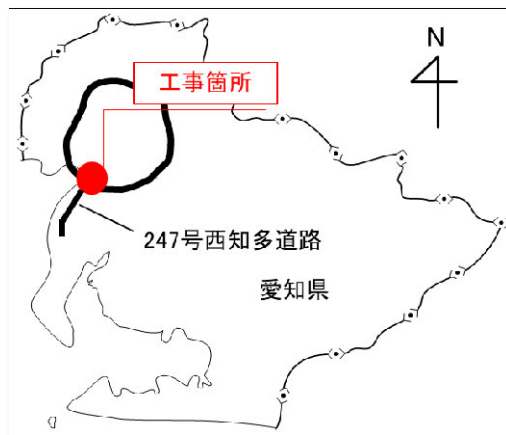



工場製作工

⑥	⑦	⑧
工事名 令和2年度 247号西知多道路 東海JCT・Hランプ橋鋼橋脚工事	工事名 令和3年度 247号西知多道路東海 JCT・Hランプ橋P13・14鋼橋脚工事	工事名 令和3年度 247号西知多道路東海JCT・ H-1ランプ橋鋼上部工事
工期 令和3年2月26日 ～ 令和5年3月31日	工期 令和3年8月27日 ～ 令和6年2月29日	工期 令和3年10月1日 ～ 令和5年2月28日
施工業者 JFEエンジニアリング 株式会社 TEL 052-561-8611 FAX 052-561-8620	施工業者 佐藤鉄工 株式会社 TEL 052-961-6200 FAX 052-968-2250	施工業者 日本車輛製造 株式会社 TEL 052-882-3320 FAX 052-883-2540
進捗率 27.4%	進捗率 0.3%	進捗率 0.6%
次月作業予定 工場製作工	次月作業予定 準備工、材料手配の着手	次月作業予定 準備工、材料手配の着手
工事概要 東海市名和町で東海JCTの橋脚をつくっています。	工事概要 東海市名和町で東海JCTの橋脚をつくっています。	工事概要 東海市新宝町で東海JCTのランプ部の橋梁をつくっています。
今月の工事内容	今月の工事内容	今月の工事内容
現在、工場にてPH7、8橋脚の溶接作業をしています。	工事着手に向けて、材料手配をしています。	工事着手に向けて、材料手配をしています。

①	②	③	④	⑤
工事名 令和2年度 247号西知多道路 東海JCT・Hランプ橋下部工事	工事名 令和2年度 247号西知多道路 東海JCT・Hランプ橋基礎工事	工事名 令和2年度 247号西知多道路 東海JCT・Hランプ橋P13・14 基礎工事	工事名 令和3年度 247号西知多道路 東海JCT・EHランプ橋基礎工事	工事名 令和3年度 247号西知多道路 東海JCT・EFランプ橋基礎工事
工期 令和2年12月1日 ～ 令和4年11月30日	工期 令和2年10月29日 ～ 令和5年3月31日	工期 令和3年3月16日 ～ 令和5年2月24日	工期 令和3年12月1日 ～ 令和5年3月24日	工期 令和4年4月1日 ～ 令和5年12月5日
施工業者 矢作建設工業株式会社 TEL 052-602-5840 FAX 052-602-5840	施工業者 株式会社大林組 TEL 052-602-5707 FAX 052-602-5708	施工業者 大日本土木 株式会社 TEL 052-618-5813 FAX 052-618-5814	施工業者 五洋建設株式会社 TEL 052-209-8950 FAX 052-201-3260	施工業者 青木あすなろ建設株式会社 TEL 052-351-7415 FAX 052-602-8338
進捗率 55.9%	進捗率 30.3%	進捗率 11.0%	進捗率 9%	進捗率 0.6%
次月作業予定 橋脚躯体の鉄筋・型枠組立、コンクリート打設	次月作業予定 PH6 遮断矢板打設 PH8 2ロッド躯体構築、沈下掘削	次月作業予定 事前計測および本体工事の準備	次月作業予定 PE2 路面覆工	次月作業予定 準備工
工事概要 東海市新宝町で西知多道路Hランプ橋の橋脚をつくっています。	工事概要 東海市新宝町で西知多道路Hランプ橋の橋脚基礎をつくっています。	工事概要 東海市名和町で東海JCTの橋脚基礎をつくっています。	工事概要 東海市名和町で西知多道路Eランプ橋とHランプ橋の橋脚基礎をつくっています。	工事概要 東海市新宝町で西知多道路Fランプ橋の橋脚基礎をつくっています。
				
今月の工事内容	今月の工事内容	今月の工事内容	今月の工事内容	今月の工事内容
橋脚底版の鉄筋組立作業を行っています。	PH8橋脚基礎のケーソン沈下掘削を行っています。	施工ヤード整備が完了し、近接構造物の事前計測を行っています。	PE2橋脚基礎施工に向けて、周辺構造物撤去を行っています。	準備工として、現地調査、道路規制及び近接施工協議資料の作成を行っています。

発行 第10号 令和 4年 6月
編集・監修：愛知国道事務所
TEL：052-761-1195

国道247号 西知多道路（荒尾） 工事便り

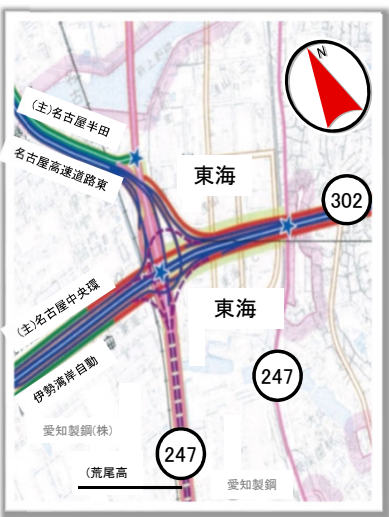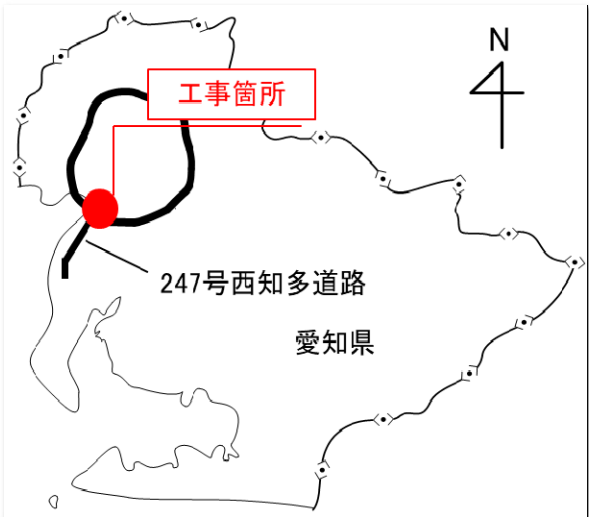

⑨		⑩	
工事名	令和3年度 247号西知多道路 荒尾OFFランプ橋下部工事	工事名	令和3年度 247号西知多道路 荒尾IC北道路建設工事
工期	令和4年2月14日 ～ 令和5年2月28日	工期	令和4年3月18日 ～ 令和5年3月24日
施工業者	オリエンタル白石株式会社 TEL 052-202-3002 FAX 052-602-7481	施工業者	日建建設株式会社 TEL 052-627-5071 FAX 052-627-5072
進捗率	9.0%	進捗率	0%
次月作業予定	施工ヤード整備工、支障物撤去工、鋼矢板打設	次月作業予定	準備工、場内整備、測量
工事概要	東海市東海町で西知多道路荒尾OFFランプ橋の橋脚をつくっています。	工事概要	東海市荒尾町で、荒尾IC下りオフランプのU型・L型擁壁をつくります。
今月の工事内容		今月の工事内容	
工事着手に向けて、現地調査と協議資料作成を行っています。		工事着手に向けて、現地調査と協議資料作成を行っています。	

⑪	
工事名	令和3年度 247号西知多道路 荒尾地区道路建設工事
工期	令和4年3月24日 ～ 令和4年12月26日
施工業者	鈴中工業株式会社 TEL 052-618-5675 FAX 052-618-5676
進捗率	0%
次月作業予定	協議資料作成、測量、敷鉄板
工事概要	東海市荒尾町で247号西知多道路 拡幅のため道路をつくっています。
今月の工事内容	
工事着手に向けて、現地調査と協議資料作成を行っています。	

発刊 第10号 令和 4年 6月
編集・監修：愛知国道事務所
TEL：052-761-1195
