
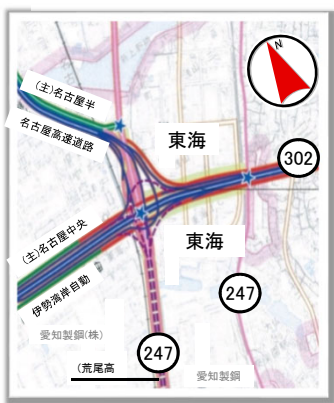
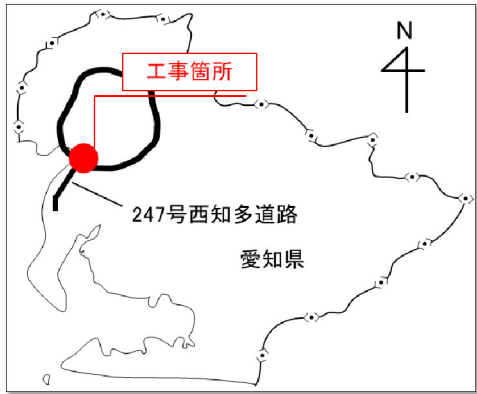



国道247号 西知多道路（東海JCT） 工事便り





工場製作工

⑥ 愛知国道	⑦ 愛知国道	⑧ 愛知国道
工事名 令和2年度 247号西知多道路 東海JCT・Hランプ橋鋼橋脚工事	工事名 令和3年度 247号西知多道路東海 JCT・Hランプ橋P13・14鋼橋脚工事	工事名 令和3年度 247号西知多道路東海JCT・H 1ランプ橋鋼上部工事
工期 令和3年2月26日 ～ 令和4年12月16日	工期 令和3年8月27日 ～ 令和5年2月29日	工期 令和3年10月1日 ～ 令和5年2月28日
施工業者 JFEエンジニアリング 株式会社 TEL 052-561-8611 FAX 052-561-8620	施工業者 佐藤鉄工 株式会社 TEL 052-961-6200 FAX 052-968-2250	施工業者 日本車輛製造 株式会社 TEL 052-882-3320 FAX 052-883-2540
進捗率 27.5%	進捗率 9.8%	進捗率 0.7%
次月作業予定 工場製作工	次月作業予定 準備工、材料手配の着手	次月作業予定 準備工、材料手配の着手
工事概要 東海市名和町で東海JCTの橋脚をつくっています。	工事概要 東海市名和町で東海JCTの橋脚をつくっています。	工事概要 東海市新宝町で東海JCTのランプ部の橋梁をつくっています。
今月の工事内容	今月の工事内容	今月の工事内容
現在、工場にてPH7、8橋脚のブロックの溶接作業をしています。	工事着手に向けて、材料手配をしています。	工事着手に向けて、製作準備をしています。

① 愛知国道	② 愛知国道	③ 愛知国道	④ 愛知国道	⑤ 愛知国道	⑫ 愛知国道
工事名 令和2年度 247号西知多道路 東海JCT・Hランプ橋下部工事	工事名 令和2年度 247号西知多道路 東海JCT・Hランプ橋基礎工事	工事名 令和2年度 247号西知多道路 東海JCT・Hランプ橋P13・14 基礎工事	工事名 令和3年度 247号西知多道路 東海JCT・EHランプ橋基礎工事	工事名 令和3年度 247号西知多道路 東海JCT・EFランプ橋基礎工事	工事名 令和4年度 247号西知多道路 荒尾地区南道路建設工事
工期 令和2年12月1日 ～ 令和4年11月30日	工期 令和2年10月29日 ～ 令和5年3月31日	工期 令和3年3月16日 ～ 令和5年2月24日	工期 令和3年12月1日 ～ 令和5年3月24日	工期 令和4年4月1日 ～ 令和5年12月5日	工期 令和4年5月11日 ～ 令和5年2月28日
施工業者 矢作建設工業株式会社 TEL 052-602-5840 FAX 052-602-5840	施工業者 株式会社大林組 TEL 052-602-5707 FAX 052-602-5708	施工業者 大日本土木 株式会社 TEL 052-618-5813 FAX 052-618-5814	施工業者 五洋建設株式会社 TEL 052-209-8950 FAX 052-201-3260	施工業者 青木あすなろ建設株式会社 TEL 052-351-7415 FAX 052-602-8338	施工業者 株式会社近藤組 TEL 052-613-9671 FAX 052-613-9672
進捗率 62.7%	進捗率 39.2%	進捗率 13%	進捗率 15.5%	進捗率 0.9%	進捗率 0.0%
次月作業予定 橋脚の躯体の鉄筋・型枠・コンクリート打設	次月作業予定 PH6 遮断矢板打設 PH8 3ロット躯体構築	次月作業予定 土留め鋼矢板圧入	次月作業予定 シートパイルの打ち込みを行います	次月作業予定 準備工	次月作業予定 構造物撤去工、道路土工
工事概要 東海市新宝町で西知多道路Hランプ橋の橋脚をつくっています。	工事概要 東海市新宝町で西知多道路Hランプ橋の橋脚基礎をつくっています。	工事概要 東海市名和町で東海JCTの橋脚基礎をつくっています。	工事概要 東海市名和町で西知多道路Eランプ橋とHランプ橋の橋脚基礎をつくっています。	工事概要 東海市新宝町で西知多道路Fランプ橋の橋脚基礎をつくっています。	工事概要 東海市新宝町で西知多道路PH7、PE6、PF3、PE7部の造成をしています。
					
今月の工事内容	今月の工事内容	今月の工事内容	今月の工事内容	今月の工事内容	今月の工事内容
橋脚躯体底版のコンクリート打設を行っています。	【PH6】地下埋設物への施工影響を遮断するための矢板を打設しています。 【PH8】2ロットの躯体を構築しました。	近接構造物の事前計測が完了し、来月からの鋼矢板圧入作業に向けて、準備をしています。	路面覆工設置作業が完了し、来月からの鋼矢板圧入作業に向けて、準備をしています。	準備工として、樹木の伐採、測量及び近接施工協議資料の作成を行っています。	施工範囲内の準備工（看板設置、除草等）を行いました。

発行 第11号 令和4年7月
編集・監修：愛知国道事務所
TEL：052-761-1195

国道247号 西知多道路（荒尾）工事便り

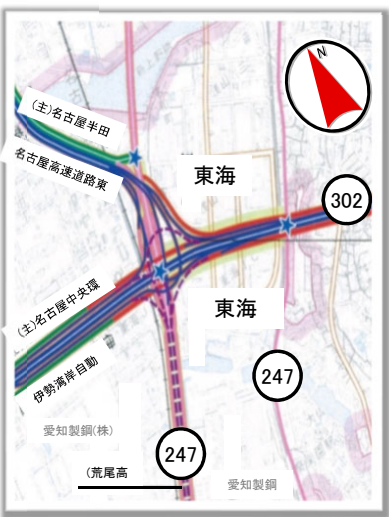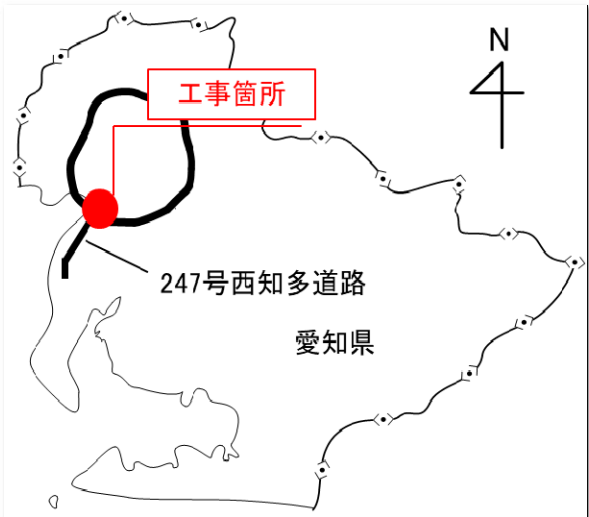

⑨ 愛知国道		⑩ 愛知国道	
工事名	令和3年度 247号西知多道路 荒尾OFFランプ橋下部工事	工事名	令和3年度 247号西知多道路 荒尾IC北道路建設工事
工期	令和4年2月14日 ～ 令和5年2月28日	工期	令和4年3月18日 ～ 令和5年3月24日
施工業者	オリエンタル白石株式会社 TEL 052-202-3002 FAX 052-602-7481	施工業者	日建建設株式会社 TEL 052-627-5071 FAX 052-627-5072
進捗率	10.0%	進捗率	1.6%
次月作業予定	鋼矢板打設、作業土工、刃口金物据付工	次月作業予定	準備工、場内整備、測量
工事概要	東海市東海町で西知多道路荒尾OFFランプ橋の橋脚をつくっています。	工事概要	東海市荒尾町で、荒尾IC下りオフランプのU型・L型擁壁をつくります。
今月の工事内容		今月の工事内容	
工事着手し、施工ヤードの整備等の準備作業を行い、鋼矢板圧入作業を進めております。		工事の着工に向けて、現地調査および協議資料の作成しています。	

⑪ 愛知国道	
工事名	令和3年度 247号西知多道路 荒尾地区道路建設工事
工期	令和4年3月24日 ～ 令和4年12月26日
施工業者	鈴中工業株式会社 TEL 052-618-5675 FAX 052-618-5676
進捗率	0%
次月作業予定	測量、鋼矢板打設準備
工事概要	東海市荒尾町で247号西知多道路 拡幅のため道路をつくっています。
今月の工事内容	
準備工として、測量および敷鉄板設置と施工のための協議資料作成を行っています。	

発刊 第11号 令和4年7月
編集・監修：愛知国道事務所
TEL：052-761-1195
