



国道41号名濃バイパス 令和3年12月 工事便り

発刊 第6号 令和4年1月
編集・監修：愛知国道事務所
TEL：052-761-1195

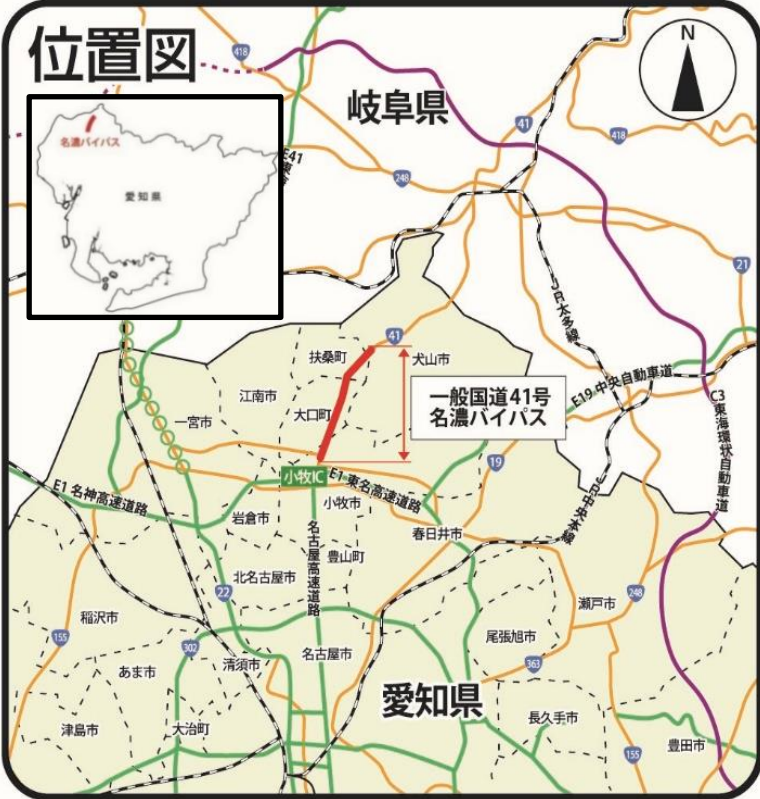


令和5年度までに順次開通予定

完成6車線開通済

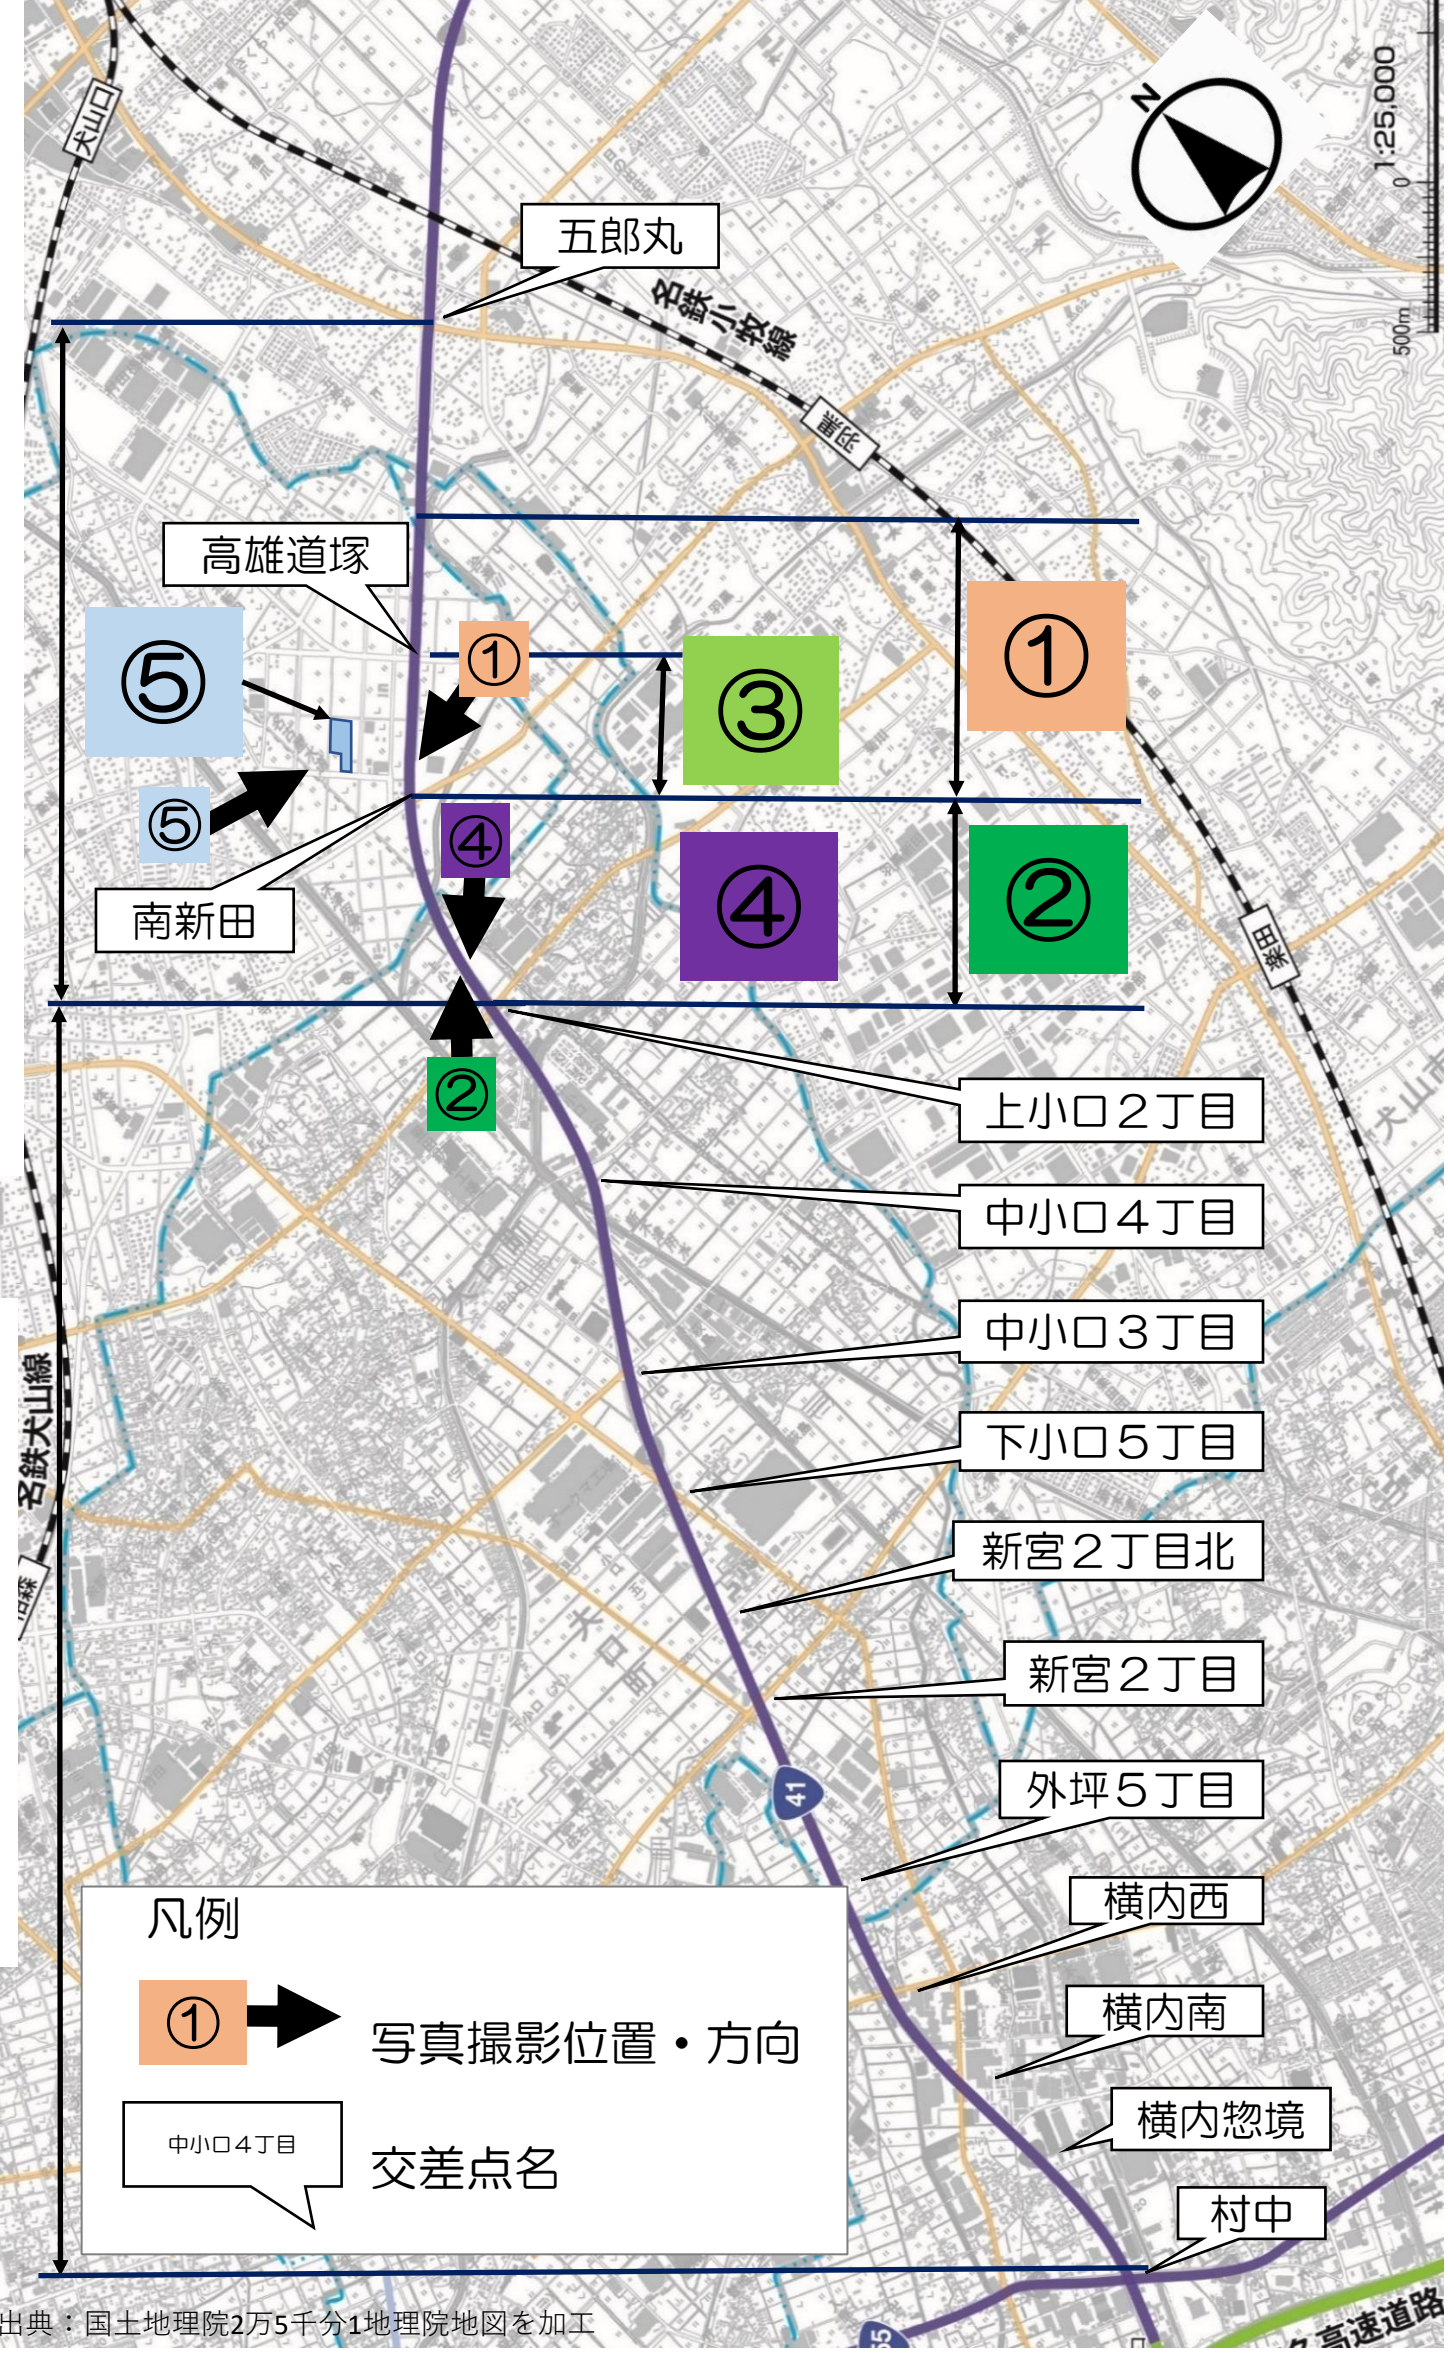

出典：国土地理院2万5千分1地理院地図を加工

事業イメージ

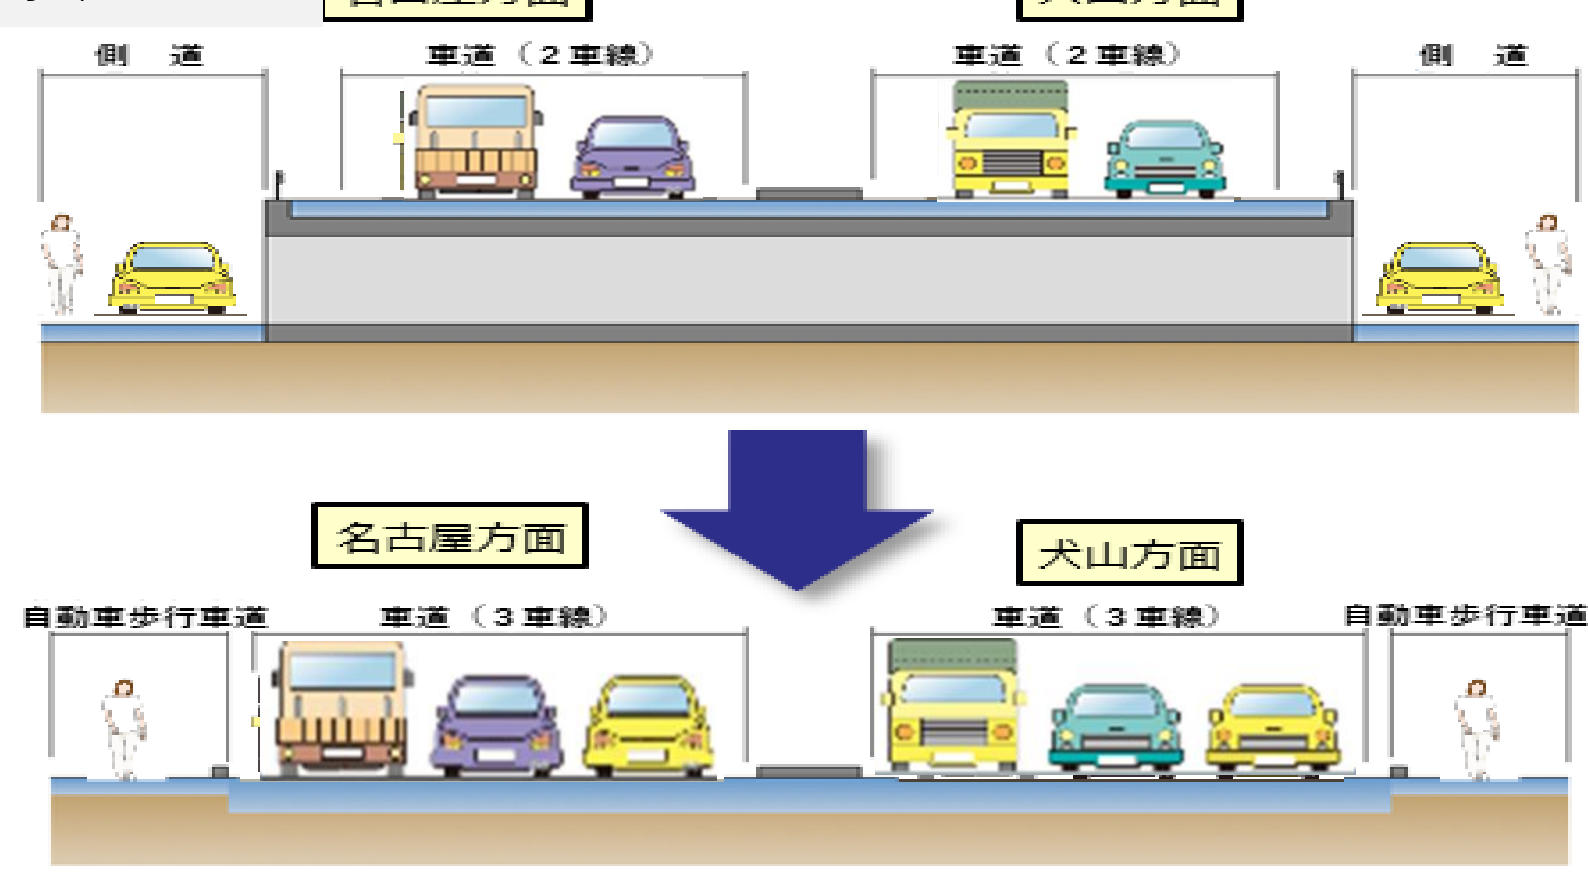

①工事のイメージ図



①		②	
工事名	令和2年度 41号名濃バイパス 高雄道塚北地区道路建設工事	工事名	令和2年度 41号名濃バイパス 上小口北地区道路建設工事
工期	令和2年8月21日 ～ 令和4年3月18日	工期	令和2年9月30日 ～ 令和4年2月28日
施工業者	みずのけんせつ 水野建設（株） TEL 0568-40-1107 FAX 0568-40-1114	施工業者	こうけん （株）光建 TEL 0587-50-2190 FAX 0587-50-2191
進捗率	88%	進捗率	90%
次月作業予定	排水構造物工、構造物撤去工	次月作業予定	舗装工、橋梁補修工
工事概要	国道41号の6車線化に伴う集中工事 に向けた盤下げ・切り回し道路の施工 を行っています。	工事概要	国道41号の6車線化に伴う拡幅工事 を行っています。
			
今月の工事内容		今月の工事内容	
切り回し道路に舗装を行いました。 （左下工事イメージ図の赤色部分）		上小口2丁目交差点付近で車道拡幅部分の舗 装を行いました。	
③		④	
工事名	令和3年度 41号名濃バイパス 高雄道塚南地区舗装工事	工事名	令和3年度 41号名濃バイパス 大口扶桑地区舗装工事
工期	令和3年10月1日 ～ 令和4年7月29日	工期	令和3年11月1日 ～ 令和4年3月23日
施工業者	ぎけん 岐建（株） TEL 0587-96-8232 FAX 0587-96-8233	施工業者	ちゅうぶ 中部土木（株） TEL 0587-50-5557 FAX 0587-50-5558
進捗率	2%	進捗率	8%
次月作業予定	構造物撤去工、仮設工	次月作業予定	構造物撤去工、縁石工
工事概要	国道41号の6車線化に伴う舗装工事 を行います。	工事概要	国道41号の6車線化に伴う舗装工事 を行います。
			
今月の工事内容		今月の工事内容	
2月に予定している集中工事の広報垂れ幕を扶 桑町役場に設置しました。		工事着工に向けて測量を行いました。	
⑤			
工事名	令和3年度 愛知国道管内 道路建設工事		
工期	令和3年9月16日 ～ 令和4年3月25日		
施工業者	とさかこうぎょう 常盤工業（株） TEL 052-803-3431 FAX 052-803-4394		
進捗率	88%		
次月作業予定	作業ヤード整備		
工事概要	国道41号の6車線化に使用する作業 ヤードを整備します		
今月の工事内容			
作業ヤードに仮囲いの設置を進めています。		かわいいフリー素材集 いらすとや：https://www.irasutoya.com	
