
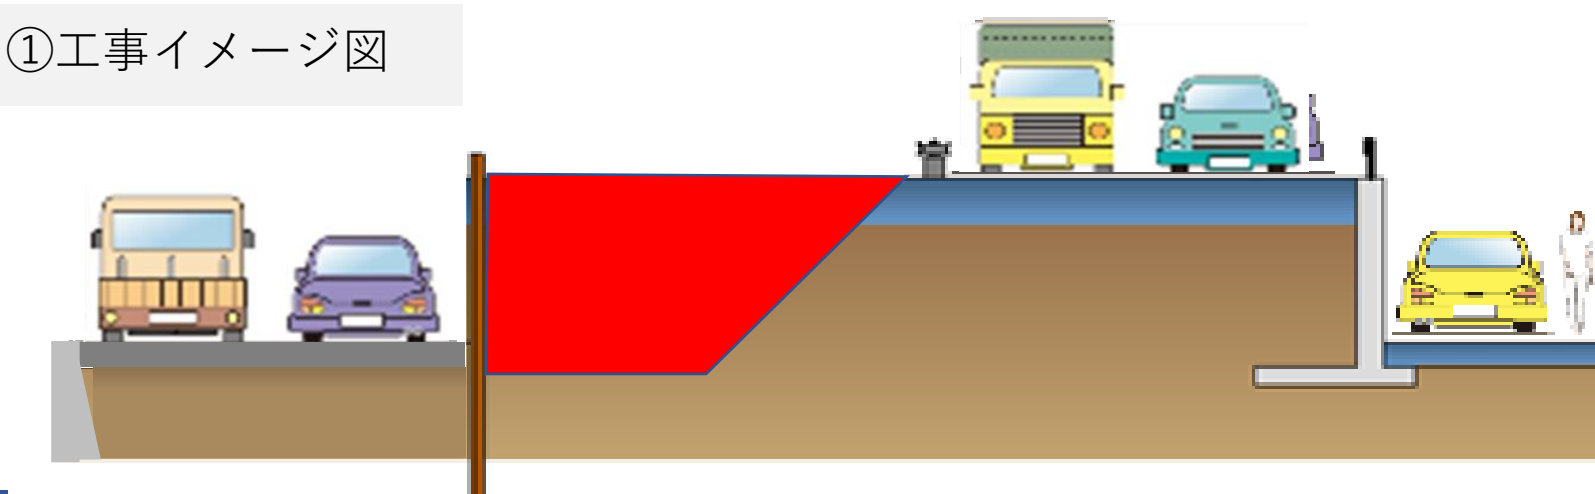
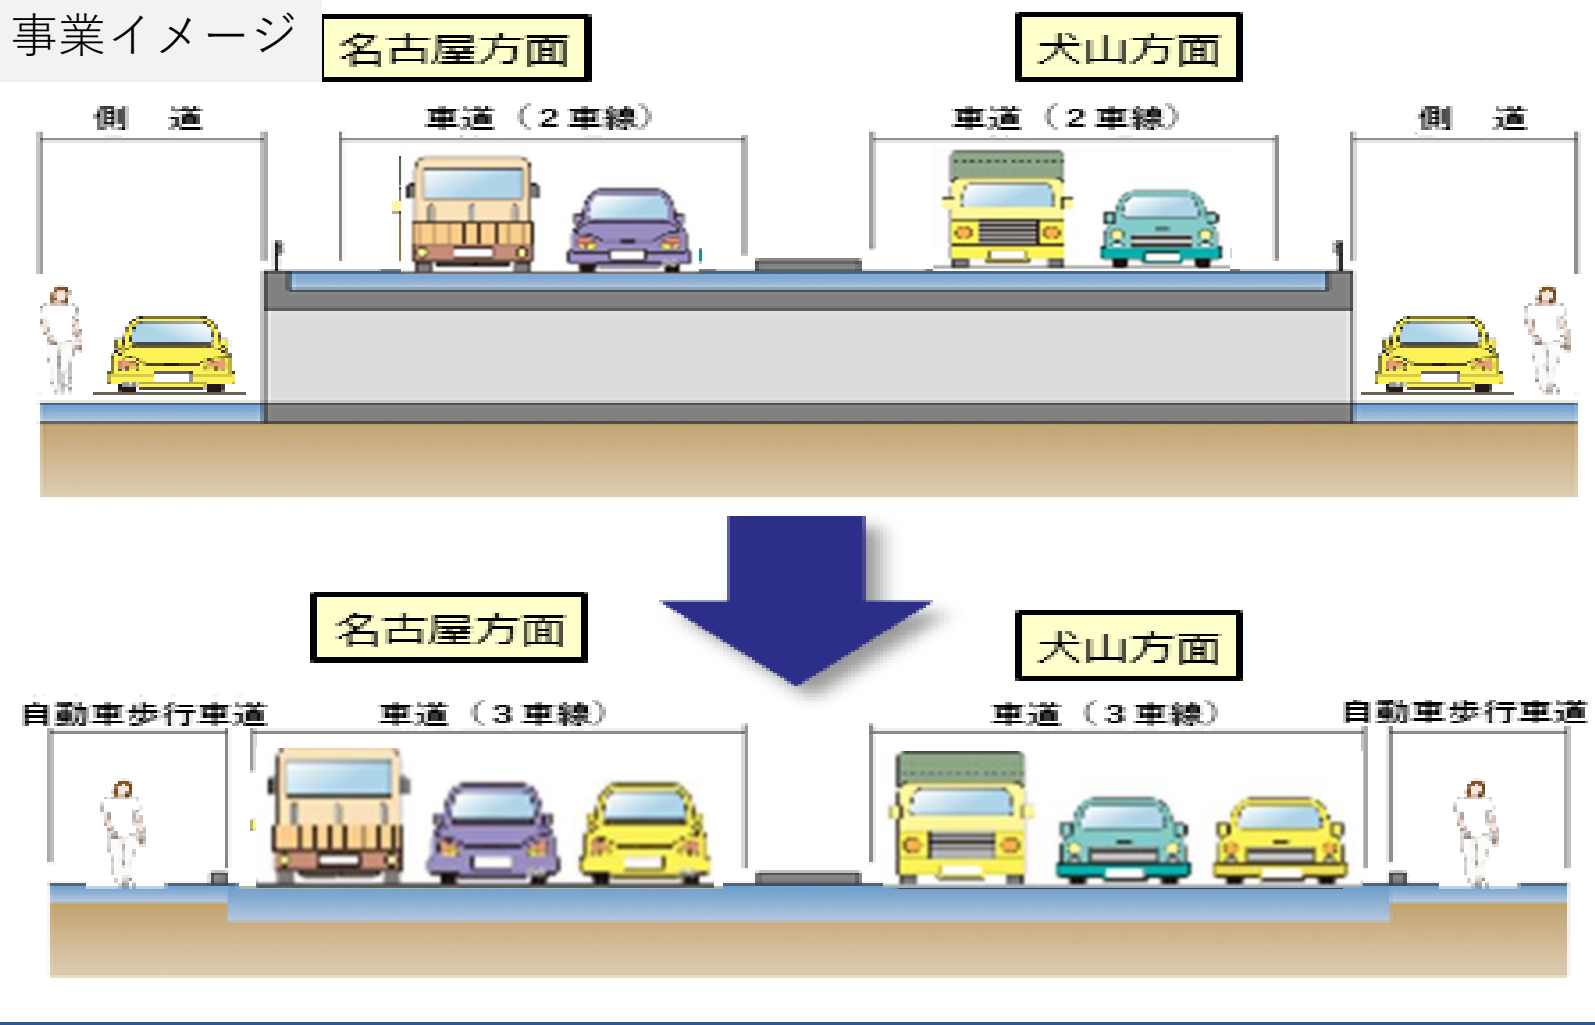
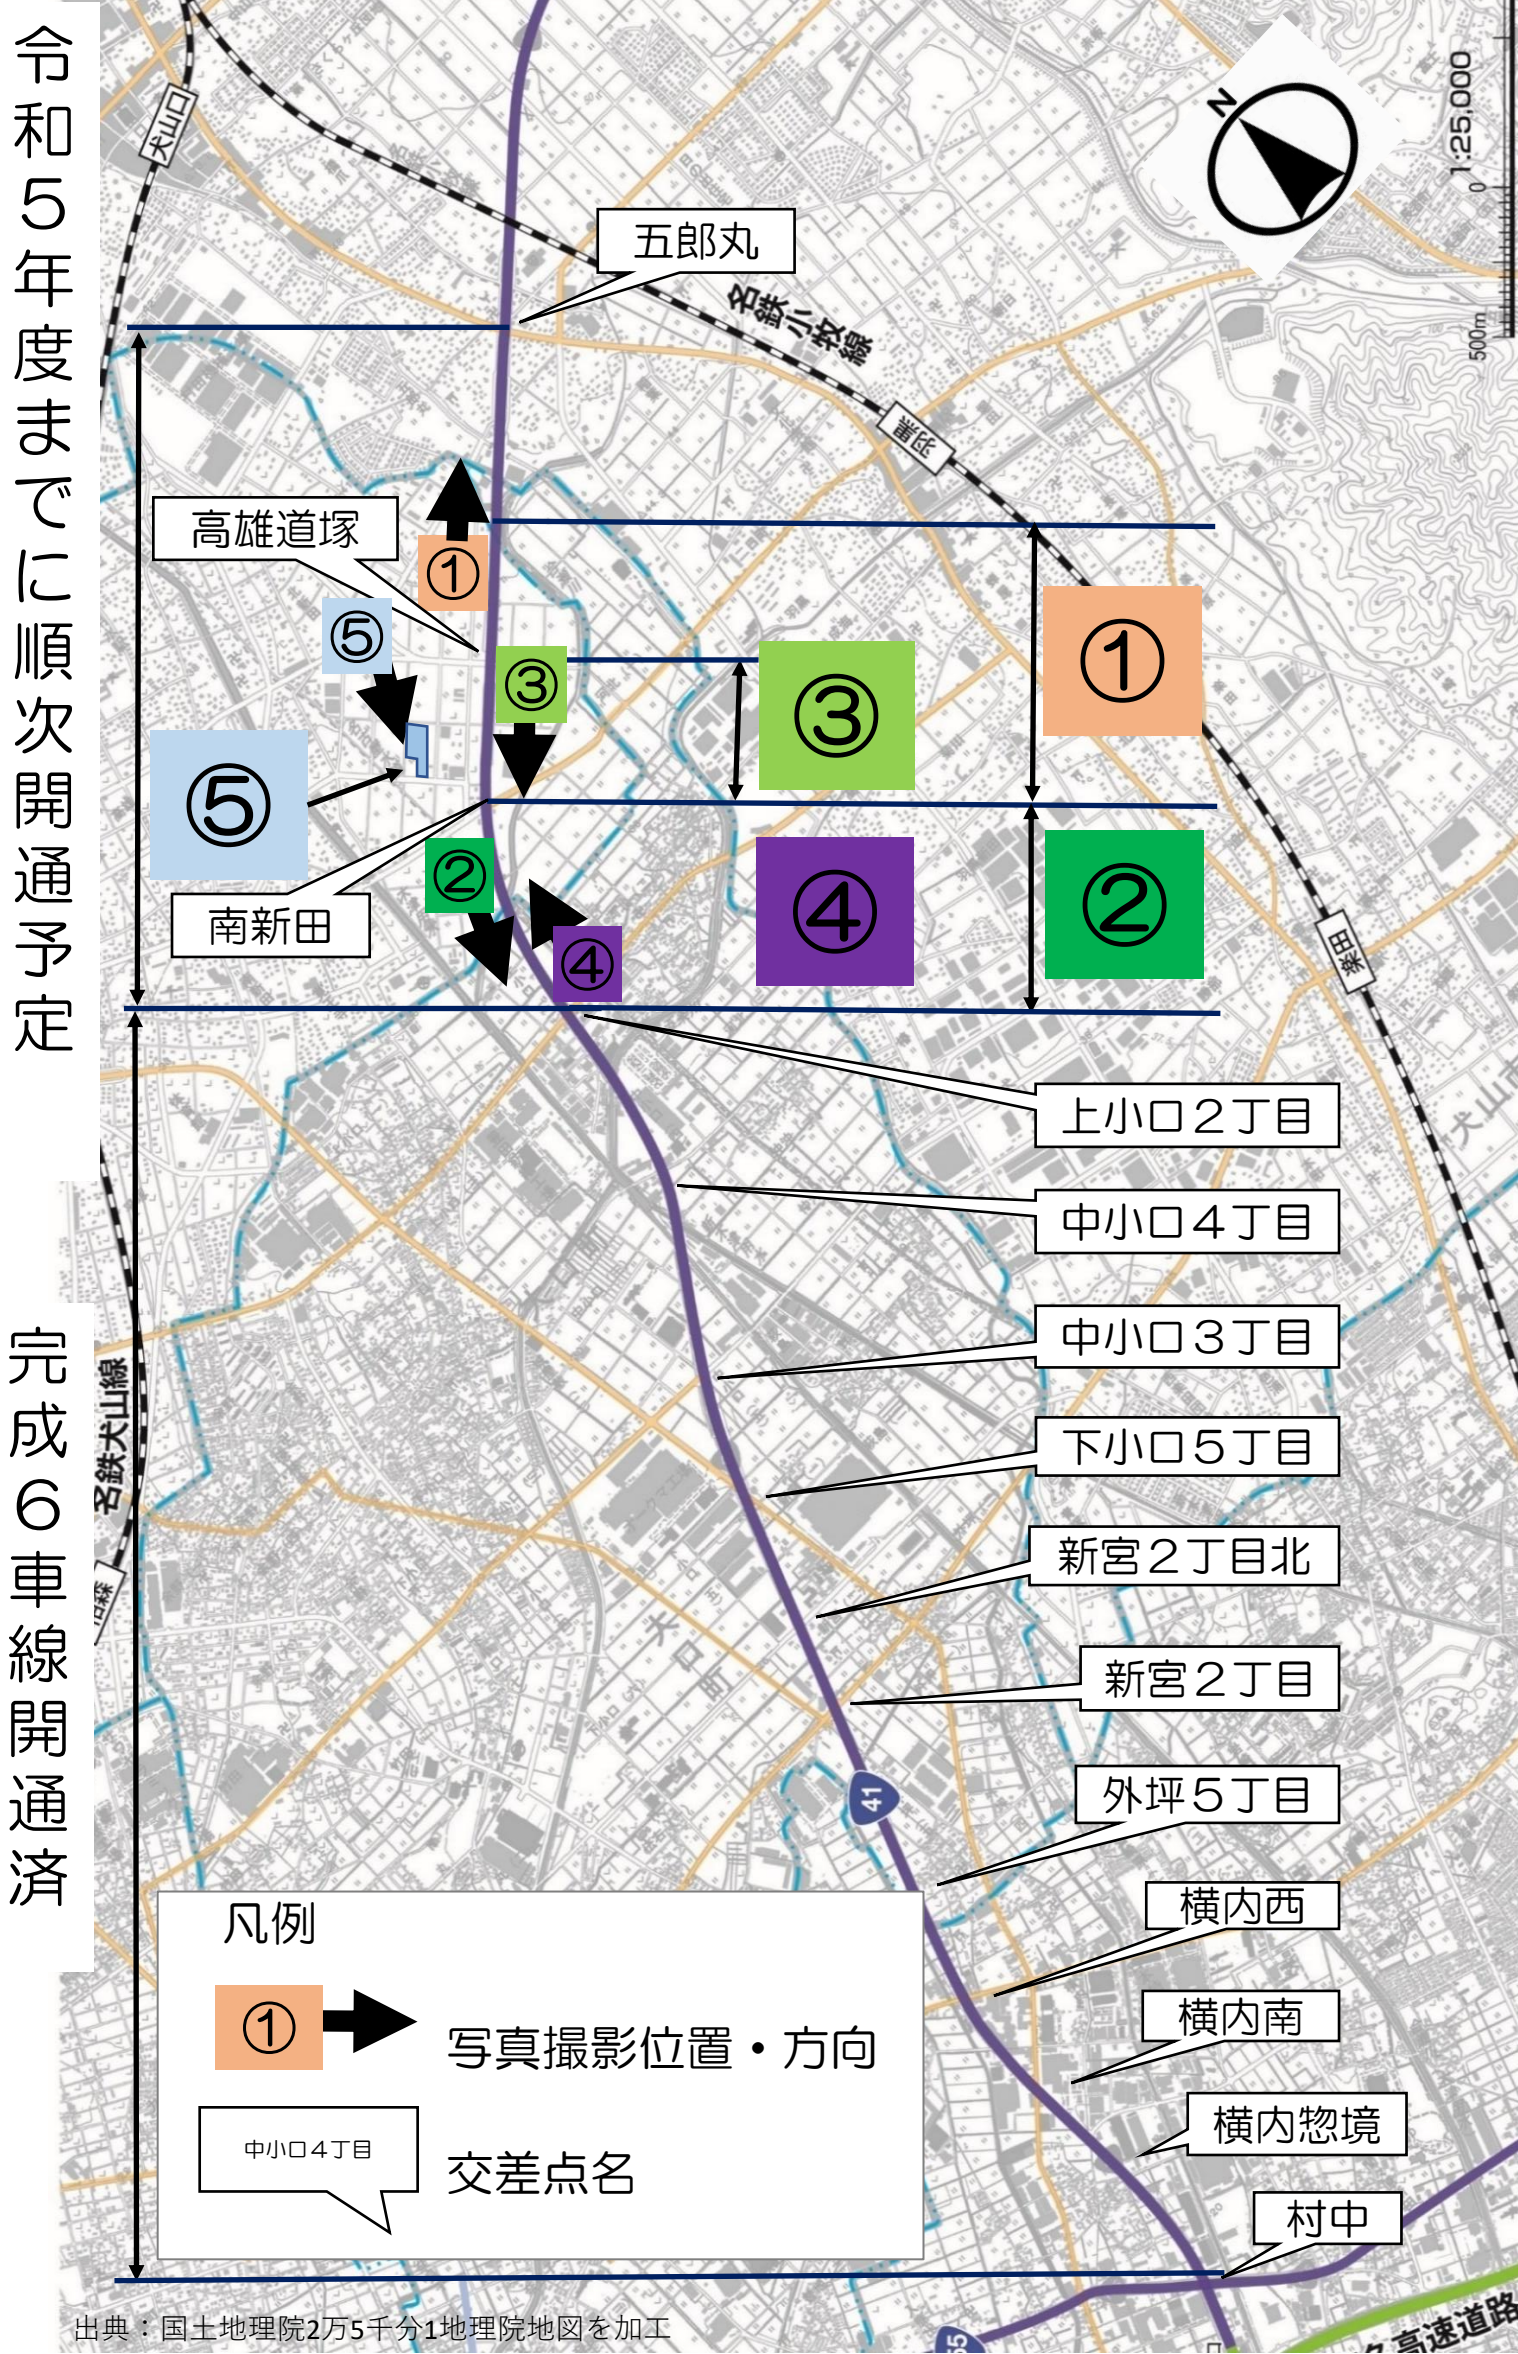


国道41号名濃バイパス 令和4年1月 工事便り

発行 第7号 令和4年 2月
編集・監修：愛知国道事務所
TEL：052-761-1195

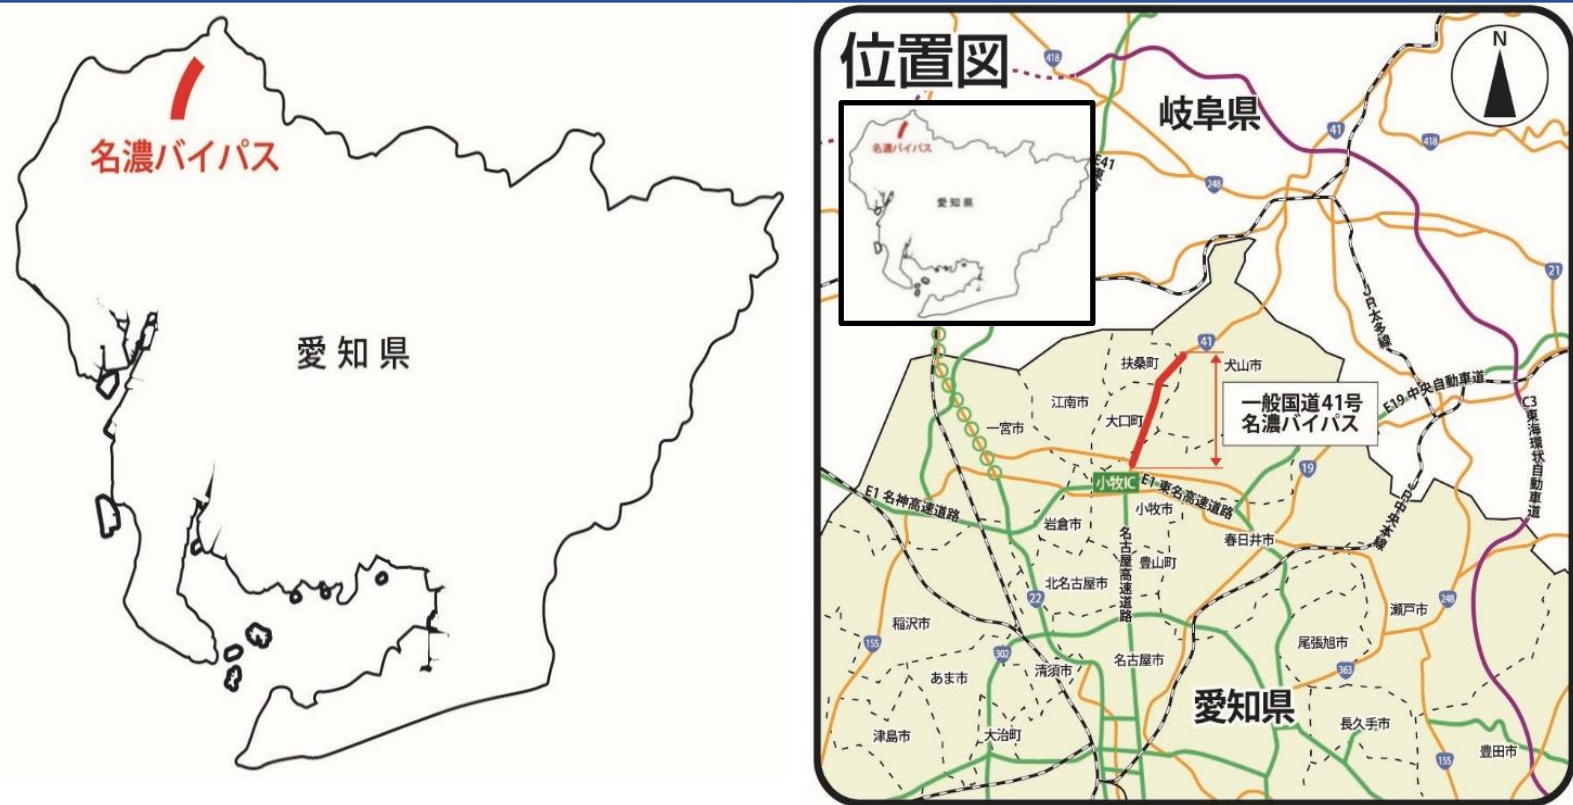

①		②	
工事名	令和2年度 41号名濃バイパス 高雄道塚北地区道路建設工事	工事名	令和2年度 41号名濃バイパス 上小口北地区道路建設工事
工期	令和2年8月21日 ～ 令和4年3月18日	工期	令和2年9月30日 ～ 令和4年2月28日
施工業者	水野建設（株） TEL 0568-40-1107 FAX 0568-40-1114	施工業者	（株）光建 TEL 0587-50-2190 FAX 0587-50-2191
進捗率	94%	進捗率	97%
次月作業予定	舗装工、区画線工	次月作業予定	舗装工、防護柵工
工事概要	国道41号の6車線化に伴う集中工事に 向けた盤下げ・切り回し道路の施工を 行っています。	工事概要	国道41号の6車線化に伴う拡幅工事を 行っています。
今月の工事内容		今月の工事内容	
・高雄道塚交差点の北側で、下り線（犬山 方面）の切り回しが完了しました。 ・上り線（名古屋方面）の切り回し道路を 施工しています。		南新田交差点の南側で、車道を広げるため に舗装を行いました。	
③		④	
工事名	令和3年度 41号名濃バイパス 高雄道塚南地区舗装工事	工事名	令和3年度 41号名濃バイパス 大口扶桑地区舗装工事
工期	令和3年10月1日 ～ 令和4年7月29日	工期	令和3年11月1日 ～ 令和4年3月23日
施工業者	岐建（株） TEL 0587-96-8232 FAX 0587-96-8233	施工業者	中部土木（株） TEL 0587-50-5557 FAX 0587-50-5558
進捗率	14%	進捗率	24%
次月作業予定	道路土工、構造物撤去工、舗装工	次月作業予定	排水構造物工、防護柵工
工事概要	国道41号の6車線化に伴う舗装工事を 行います。	工事概要	国道41号の6車線化に伴う舗装工事を 行います。
今月の工事内容		今月の工事内容	
高雄道塚交差点～南新田交差点間で、車道の高 さを下げるために取り壊しを行いました。 （左下工事イメージ図の赤色部分）		上小口2丁目交差点の北側で、中央分離帯の施工を しています。	
⑤			
工事名	令和3年度 愛知国道管内 道路建設工事		
工期	令和3年9月16日 ～ 令和4年3月25日		
施工業者	常盤工業（株） TEL 052-803-3431 FAX 052-803-4394		
進捗率	95%		
次月作業予定	片付け		
工事概要	国道41号の6車線化に使用する作業 ヤードを整備します。		
今月の工事内容			
仮囲いの設置と鉄板の敷並べが終わり、 作業ヤードが完成しました。			
