

三遠南信自動車道「引佐ジャンクション」(発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



# Inasa Jct News

## 引佐ジャンクション便り

発行第4号  
平成23年9月1日

磐田出張所安全協議会  
責任者：児嶋 泰成  
TEL 544-0985

### 平成21年度 三遠南信四方浄舗装工事 大有建設株式会社 児嶋 053-544-0985

#### 工事進捗状況

8月末現在、本線部・ランプ部の基層工まで終了しました。現在は引六線では歩道整備のため排水構造物の施工を行っています。また9月中旬～下旬にかけて引六線の歩道舗装、車道舗装を行います。それに伴い、引六線の片側交互通行規制を行います。今後も安全第一で工事を進めてまいります。近隣の皆様、御通行中の皆様にはご理解と



### 平成22年度 三遠南信引佐JCTランプ橋床版工事 TSUCHIYA(株) 高木 053-544-0090

当社は、引佐JCTのGランプ、Fランプの床版橋工事を担当しています。  
\*RC床版橋とは・・・鋼板にて構成された鋼板桁・鋼箱桁等の上部に鉄筋とコンクリートを組合せ構築した床版で一般的な在来工法の橋梁です。

#### [進捗状況]

当工事の進捗率は約93%です。主体工種である床版工、壁高欄工が8月末にてすべて完了しました。今後、落下物防止柵等の橋梁付属物工事に着手し、かつ橋梁足場の解体作業を継続して行ない、



【ランプ橋全景】



【FP3よりFA1を望む】



壁高欄工施工状況

ポンプ車にて  
コンクリート打設



安全最優先で工事を進めていきますので、ご理解・ご協力をお願いします。

TSUCHIYA

### 平成22年度 三遠南信引佐地区整備工事 (株)鈴木組 松尾053-544-0212

#### 工事進捗状況

本工事は、8月末現在、珍焼工区における三面水路を主に工事を進めています。9月中旬からは、引佐六郎沢線の横断部の施工に着手いたしますが、これに伴い道路の片側規制を予定しています。つきましては、地元の皆様には御迷惑をお掛けする事の無いよう安全第一で工事を進めてまいりますので、何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。

#### 施工状況

基礎コンクリート打設完了



三面水路掘付完



三面水路掘付完



### 平成22年度 三遠南信東黒田舗装工事 福田道路(株) 石田 053-544-1323

#### 工事概要

本工事は、三遠南信自動車道 引佐ジャンクション(仮称)のアスファルト舗装工事を行っております。地域の皆様に役立つ道づくりを心掛け施工してまいります。


#### 進捗状況



剛性防護柵

本工事は現在、本線の路肩盛土およびGランプの剛性防護柵の施工を行っております。

9月上旬より本体工事の舗装工を着手いたします。これに伴い、ダンプトラックによる資材搬入がありますが、安全第一で通行いたしますので、ご

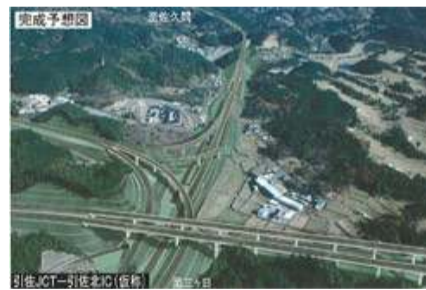

完成予想図

工事中は近隣の皆様へご迷惑がからぬように作業員一同、細心の注意を払い作業いたします。



### 平成22年度 三遠南信引佐JCT照明設備工事 明光電気(株) 土屋 053-544-0660

#### 進捗状況

当工事は、先月末で東黒田高架橋での配管とプルボックスの取付け作業を終えて、今月からF・Gランプにて低位置照明と、軽量ダクトを設置するための準備を進めています。

軽量ダクトは、低位置照明に電源を供給する配線を敷設するためのもので、F・Gランプ橋の端部から分流部・合流部に設置する自立用低位置照明




Gランプ(分流部)



Fランプ(合流部)

#### 低位置照明(自立用)

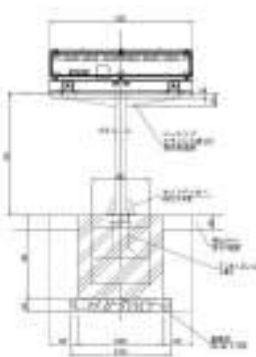

#### 施工状況



Fランプ法面に軽量ダクト位置出し作業

