

三遠南信自動車道「引佐ジャンクション」(発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



# Inasa Jct News

## 引佐ジャンクション便り

発行第6号  
平成23年11月1日

磐田出張所安全協議会  
責任者：松尾 英樹  
TEL 544-0212

### 平成21年度 三遠南信四方浄舗装工事

大有建設株式会社 児嶋 053-544-0985

#### 工事進捗状況

10月末で表層工が完了しました。今後は区画線や安全施設の設置を行います。

また、引佐六郎沢線についても表層は完了しましたが、仮区画線の状態となっておりますので御通行の際はご注意願います。本工事も残すところ後わずかとなっておりますが、最後まで無事故で工事完了に向けて頑張ります。近隣の皆様、御通行中の皆様にはもうしばらくご協力をお願いいたします。



#### 施工状況

引六線 歩道完了



本線表層 施工状況



本線表層工 完了




### 平成22年度 三遠南信引佐JCTランプ橋床版工事

TSUCHIYA(株) 高木 053-544-0090


当社は、引佐JCTのGランプ、Fランプの床版橋工事を施工しました。

#### 工事完成のご挨拶

10月上旬に舗装工事に床版の引渡しを完了しました。今年の3月から床版工事に着手し、10月31日をもちまして無事竣工しました。工事期間中、地元の皆様方のご理解・ご協力を頂けたことを感謝します。今後、三遠南信道路が地域の発展及び地域交流の向上に繋がる事を心から願っています。

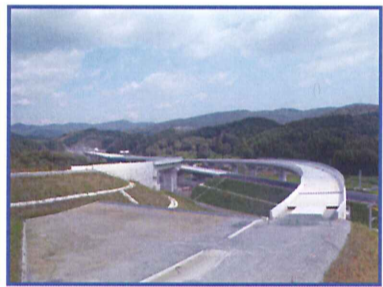

[ランプ橋全景]

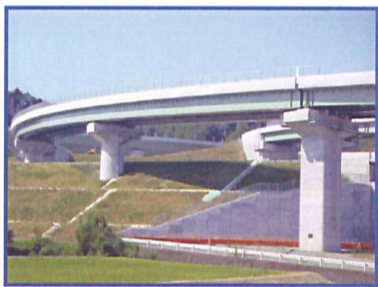

[FP3~FA1を望む]



[FP3~P8を望む]



[工事起点側から望む]



[工事終点側から望む]

TSUCHIYA

### 平成22年度 三遠南信引佐地区整備工事

(株)鈴木組 松尾053-544-0212

#### 工事進捗状況

本工事は、10月末現在、  
【東黒田工区】ブロック積工事・排水構造物工事  
【四方浄工区】進入路撤去工事・法面復旧工事  
【珍撓工区】三面水路工事を主に工事を進めています。  
進入路撤去到に伴う、土砂運搬工事は11月初旬には完了し、今後は田代川付替工事・引佐六郎沢線改良工事に着手する予定です。  
つきましては、地元の皆様には御迷惑をお掛けする事の無いよう安全第一で工事を進めてまいりますので、何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。

#### 施工状況

【珍撓工区】三面水路



【四方浄工区】進入路撤去



【東黒田工区】ブロック積



### 平成22年度 三遠南信東黒田舗装工事

福田道路(株) 石田 053-544-1323

#### 工事概要

本工事は、三遠南信自動車道 引佐ジャンクション(仮称)のアスファルト舗装工事を行っております。地域の皆様に役立つ道づくりを心掛け施工してまいります。

#### 進捗状況



施工状況

本工事は現在、本線のアスファルト舗装および道路付属物の施工を行っております。これに伴い、ダンプトラックによる資材搬入等でご迷惑をお掛けしております。  
11月は主に道路付属物、防護柵の施工を予定しております。安全第一で作業いたしますので、ご協力をお願いします。



10月施工完了箇所

工事中は近隣の皆様へご迷惑がからぬように作業員一同、細心の注意を払い作業いたします。



FUKUDA ROAD CONSTRUCTION

※詳細は現場へお問い合わせ http://www.fukudaroad.jp/higashikuroda/index.html

### 平成22年度 三遠南信引佐JCT照明設備工事

明光電気(株) 土屋 053-544-0660

#### 進捗状況

当工事は、10月にF・Gランプの分流部・合流部において、自立用低位置照明を設置するための基礎工事を行いました。また9月に引き続き軽量ダクトの設置工事を行っています。  
10月にはF・Gランプ橋でも作業を行いました。東黒田高架橋と同様に橋梁点検車を使用して低位置照明を設置しました。11月中には高架橋部分の低位置照明を全て設置する予定です。

#### 施工状況



Gランプにて軽量ダクト支持杭の設置



Fランプ合流部にて低位置照明の基礎工事



Gランプ橋にて低位置照明の設置

