

三遠南信自動車道「引佐」ジャンクション（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



# Inasa Jct News

## 引佐ジャンクション便り

発行第7号  
平成23年12月1日

磐田出張所安全協議会  
責任者：石田 真登  
TEL 544-1323  
FAX 544-1324

### 平成21年度 三遠南信四方浄舗装工事

大有建設株式会社 児嶋 053-544-0985

工事進捗状況

進捗率 92.9%

11月末現在、区画線工事が終了し（右写真）道路付属施設工事を進めています。通行する皆様の安全を確保し、命を救うための構造物を設置していきます。施工にあたって、その作業の重要さを感じながら、施工を進めてまいります。

本工事も残すところ後わずかとなってまいりましたが、最後まで無事故で工事完了に向けて頑張ります。近隣の皆様、御通行中の皆様にはもうしばらくご協力をお願いいたします。



施工状況



施工完了

本線 区画線完了

### 平成22年度 三遠南信引佐地区整備工事

(株)鈴木組 松尾053-544-0212

工事進捗状況


施工状況



本工事は、11月末現在、  
【東黒田工区】立入防止柵工事・排水構造物工事  
【四方浄工区】排水構造物工事・法面工事  
【田代川付替】法覆護岸工事  
を主に工事を進めています。

今後は田代川の護岸工事を行い、引佐六郎沢線の道路拡幅を行っていく予定です。道路拡幅工事では片側交互通行規制を伴う場合がありますため、御通行中の皆様にはご不便をおかけしますが、何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。


【引佐六郎沢線】道路改良 横断面

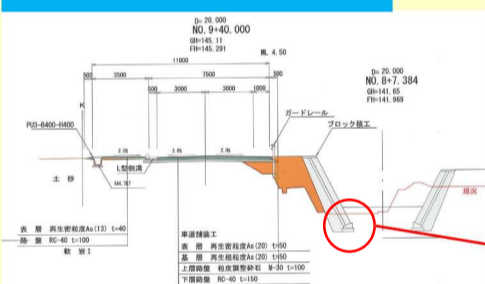

【田代川付替】ブロック積



【四方浄工区】法面調査ボーリング

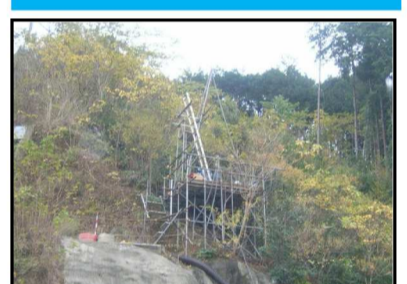

### 平成22年度 三遠南信東黒田舗装工事

福田道路(株) 石田 053-544-1323

工事概要

本工事は、三遠南信自動車道 引佐ジャンクション（仮称）のアスファルト舗装工事を行っております。地域の皆様に役立つ道づくりを心掛け施工してまいります。

進捗状況



引佐JCT

本工事は現在、進捗率 60% となっています。アスファルト舗装の基層まで完了し、道路付属物、防護柵の施工を行っております。12月は主にアスファルト舗装の仕上げとなる表層の施工を予定しております。安全第一で作業いたしますので、ご協力お願いします。



ガードレール施工状況

工事中は近隣の皆様へご迷惑がからぬように作業員一同、細心の注意を払い作業いたします。



**FUKUDA**  
ROAD CONSTRUCTION

※詳細は現場へお問い合わせ <http://www.fukudaroad.jp/higashikuroda/index.html>

### 平成22年度 三遠南信引佐JCT照明設備工事

明光電気(株) 土屋 053-544-0660

進捗状況

当工事は、11月に東黒田高架橋からF、Gランプ橋において低位置照明を全て設置しました。今後ケーブルの接続や調整等を行ってまいります。またF・Gランプでは、軽量ダクトの設置工事を行っています。軽量ダクトの設置が完了した後は、分流合流部で自立型の低位置照明を設置する予定です。

引き続き、地元の皆様にご迷惑をおかけすることがないように注意して作業致します。



施工状況



Gランプにて軽量ダクトの設置



Fランプ橋にて低位置照明の設置完了



Gランプ橋にて低位置照明の設置完了
