

三遠南信自動車道「佐久間道路」(発注者: 国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



佐久間道路 (川合工区) かわら版

発行第46号
(平成25年12月1日)
責任者: 安全協議会
(株)早野組
高根 信夫
TEL 053-967-3266

① 平成24年度 佐久間道路川合2号橋下部工事 (株)中村組 鈴木 053-965-1888

工事概要 川合地区において白沢川に架かる佐久間道路の橋梁の橋台及び橋脚を造る工事を行います。

進捗状況 現在、基礎工事(深礎杭)はP2橋脚を残すのみとなり、他のA1・A2橋台、P1橋脚は躯体構築中です。今後躯体工事に伴う大型車両の搬入頻度が増加する予定です。

施工箇所写真(西から撮影)



施工箇所写真(東から撮影)



② 平成24年度 佐久間道路川合地区道路建設工事 (株)鈴木組 山下 053-965-0085

工事概要 佐久間道路川合地区において、本線の土工事及び法面工事、また国道473号では函渠工の工事を行います。

進捗状況 引続き本線部法面3段目の掘削及び法面工(アンカー工)・国道473号では函渠工を施工しています。引続き国道473号迂回に御協力をお願いします。

本線部土工事・法面工事施工箇所



函渠工施工箇所



③ 平成24年度 佐久間道路川合1号橋下部工事 西遠建設(株) 坪見 053-965-0008


工事概要 本線の土工事・唐沢川に架かる佐久間道路橋梁の橋台及び橋脚を造る工事を行います。

進捗状況 本線及びランプ部の掘削作業も11月末に完了します。12月の作業内容は、橋台・橋脚の施工に使用する仮設栈橋の施工に着工します。

施工箇所東側より撮影



位置図

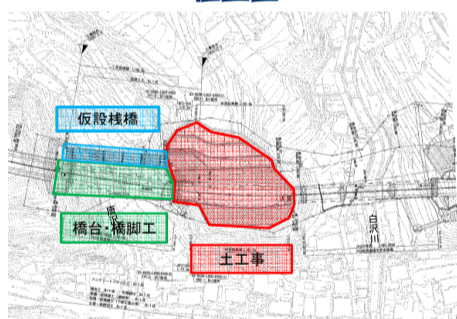

④ 平成24年度 佐久間道路川合地区東道路建設工事 中村建設(株) 大村 053-965-1525

工事概要 川合地区において佐久間IC(仮称)の整備を行います。

進捗状況 佐久間IC(仮称)の盛土を行っています。IC南側耕作地の盛土準備も行います。

施工箇所 佐久間IC(仮称)




施工箇所 佐久間IC南側(追加ヤード)



⑤ 平成24年度 佐久間道路2号橋PC上部工事 昭和コンクリート工業(株) 青木 058-255-3340

工事概要 川合地区白沢川を跨ぐ、長さ85mの橋梁上部工事(プレストレスコンクリート橋)を施工します。

進捗状況 工事に着手するための計画、準備を行っております。

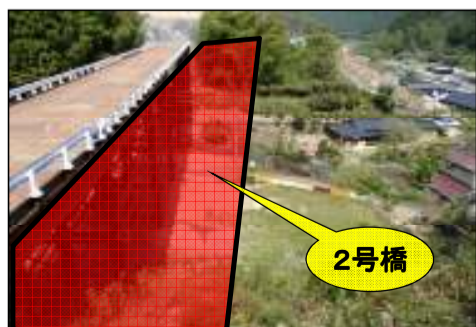

東栄町側より飯田方面を望む



下流側より望む

位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。
【http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html】
