

三遠南信自動車道「佐久間道路」(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



佐久間道路 (川合工区) かわら版

発行第47号
(平成26年1月1日)
責任者:安全協議会
(株)鈴木組
長谷川恒治
TEL053-676-1273

① 平成24年度 川合2号橋下部工事 (株)中村組 鈴木 053-965-1888

工事概要 川合地区において白沢川に架かる佐久間道路の橋梁の橋台及び橋脚を造る工事を行います。

進捗状況 現在、基礎工事(深礎杭)は全て完了し、A1・A2橋台、P1・P2橋脚の躯体部分を構築中です。今後も躯体工事に伴う大型車両(特に生コン車)の搬入が断続的に発生する予定です。

施工箇所写真(西から撮影)

施工箇所写真(東から撮影)



② 平成24年度 佐久間道路川合地区航路建設工事 (株)鈴木組 山下 053-965-0085

工事概要 佐久間道路川合地区において、本線の土工事及び法面工事、また国道473号では函渠工の工事を行います。

進捗状況 R473号の函渠工のコンクリート打設は完了しました。本線部は引き続き掘削・法面工を施工していきます。
※R473号迂回に御協力をお願いします。

本線部土工事・法面工事施工箇所

函渠工施工箇所




③ 平成24年度 佐久間道路川合1号橋下部工事 西遠建設(株) 坪見 053-965-0008

工事概要 本線の土工事・唐沢川に架かる佐久間道路の橋梁の橋台を造る工事を行います。

進捗状況 唐沢川に架かる仮橋工事と、佐久間第1トンネル坑口附近の伐採工事をおこなっています。1月からは、橋台工事に着手します。

施工箇所東側より撮影

位置図

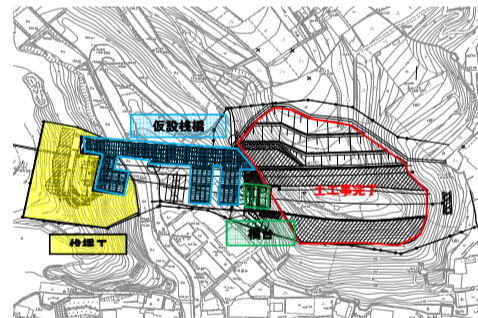

④ 平成24年度 佐久間道路川合地区東道路建設工事 中村建設(株) 大村 053-965-1525

工事概要 川合地区において佐久間IC(仮称)の整備を行います。

進捗状況 佐久間IC(仮称)の地下排水管工事を行っています。IC南側耕作地の盛土準備を行なっています。

施工箇所 佐久間IC(仮称)

施工箇所 佐久間IC南側(追加ヤード)



⑤ 平成24年度 佐久間道路川合2号橋PC上部工事 昭和コンクリート工業(株) 青木

工事概要 川合地区白沢川を跨ぐ、長さ85mの橋梁上部工事(プレストレストコンクリート橋)を施工します。

進捗状況 工事に着手するための計画、準備を行っております。




飯田側より東栄町方面を望む



下流側より望む

位置図

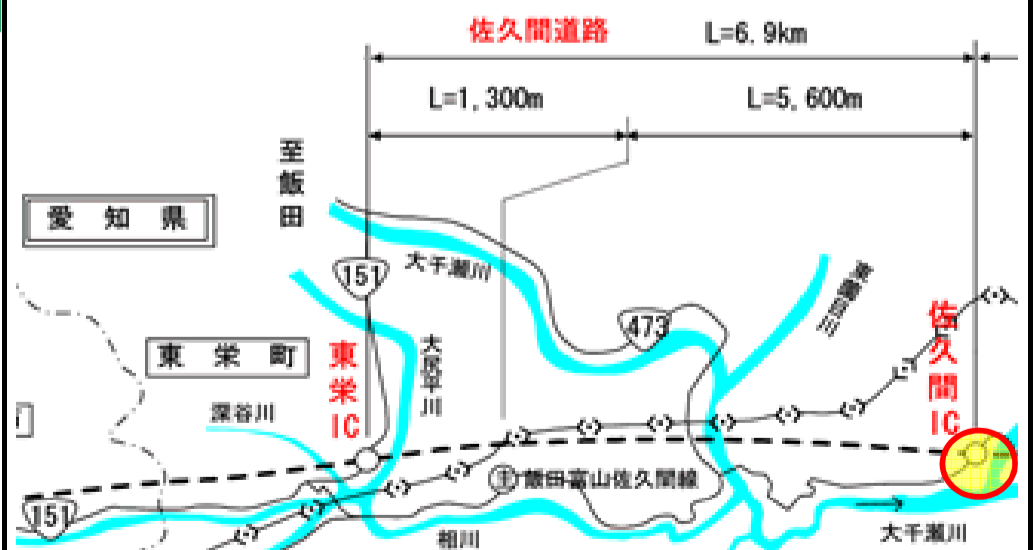

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。
【http://www.cbr.mit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html】
