

三遠南信自動車道「佐久間道路」(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



佐久間道路 (川合工区) かわら版

発行第48号
(平成26年3月1日)
責任者:安全協議会
中村建設(株)
鈴木 大輝
TEL053-965-1525

① 平成24年度 川合2号橋下部工事 (株)中村組 鈴木 053-965-1888

工事概要

川合地区において白沢川に架かる佐久間道路の橋梁の橋台及び橋脚を造る工事を行います。

進捗状況

A2橋台・P1橋脚は完成し、A1橋台・P2橋脚については工事が佳境を迎えております。3月度は作業用に設置した仮設構台を撤去していく為、大型トラックによる場外搬出が断続的に発生します。

施工箇所写真(西から撮影)



A1橋台

施工箇所写真(東から撮影)



A2橋台

② 平成24年度 佐久間道路川合地区道路建設工事 (株)鈴木組 山下 053-965-0085

工事概要

佐久間道路川合地区において、本線の土工事及び法面工事、また国道473号では函渠工の工事を行います。

進捗状況

R473号の函渠工は完了しました。本線部は引き続き掘削工事・法面工事を施工しています。
※R473号迂回に御協力お願いします。

本線部土工事・法面工事施工箇所



函渠工施工箇所



③ 平成24年度 佐久間道路川合1号橋下部工事 西遠建設(株) 坪見 053-965-0008

工事概要

本線の土工事・法面工事・唐沢川に架かる佐久間道路の橋梁の仮橋架けを行います。


進捗状況

トンネル坑口附近の伐採工事も完了し、引き続き仮橋架け・法面・土留め工事を施工していきます。

施工箇所東側より撮影



位置図

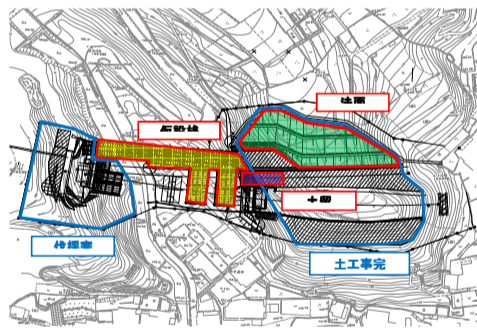

④ 平成24年度 佐久間道路川合地区東道路建設工事 中村建設(株) 大村 053-965-1525

工事概要

川合地区において佐久間IC(仮称)の整備を行います。

進捗状況

佐久間IC(仮称)およびIC南側耕作地の盛土工事を行っています。

施工箇所 佐久間IC(仮称)



施工箇所 佐久間IC南側(追加ヤード)



⑤ 平成24年度 佐久間道路川合2号橋PC上部工事 昭和コンクリート工業(株) 青木

工事概要

川合地区白沢川を跨ぐ、長さ85mの橋梁上部工事(フレストレストコンクリート橋)を施工します。

進捗状況

4月からの着手に向けて計画、準備を行っております。



飯田側より東栄町方面を望む



下流側より望む

位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。
【http://www.cbr.mit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html】
