

三遠南信自動車道“佐久間道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



佐久間道路 (浦川工区) かわら版

発行第45号
 (平成25年11月1日)
 責任者：安全協議会
 (株)大林組
 出口 大輔
 TEL 053-966-6011


① 平成24年度 佐久間道路浦川地区航路建設工事 須山建設(株) 清水 053-545-0551

工事概要 佐久間道路建設に伴う国道473号付替え工事、盛土工事、佐久間道路本線上部の法面の補強を行います。

進捗状況 佐久間道路本線の盛土工事を行っています。



現場全景 大千瀬川対岸より撮影

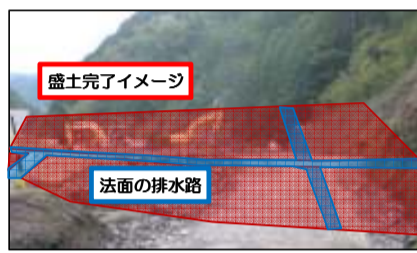

473号より山側の盛土が徐々に上がってきています

② 平成24年度 佐久間道路浦川連絡路道路建設工事 (株)早野組 熊谷 053-967-3266

工事概要 大千瀬川左岸側にて、佐久間道路・浦川連絡路道路の橋台および補強土壁の施工を行います。

進捗状況 伐採が完了し、現在は市道拡幅工事の準備をしています。



市道小田敷線内の様子




対岸より全体の様子

③ 平成24年度 佐久間道路浦川地区第1トンネル新設工事 (株)大林組 出口 053-966-6011

工事概要 佐久間道路浦川地区において、佐久間道路本線のトンネルと避難用トンネルの工事を行います。トンネルは佐久間町から東栄町へ向けて掘り進めます。

進捗状況 11月からトンネル工事のためのコンクリートフラットなどの仮設備の工事を行います。安全第一で工事を進めてまいります。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

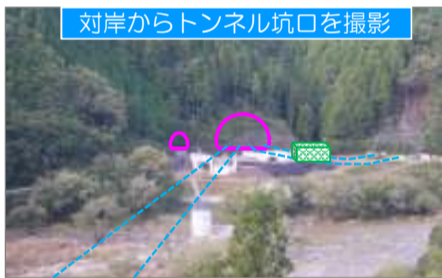

対岸からトンネル坑口を撮影



現場入口から撮影

仮設建物を建てます

④ 平成24年度 佐久間道路浦川地区連絡路建設工事 (株)早野組 高根 053-967-3266

工事概要 大千瀬川左岸側にて、佐久間道路・浦川地区連絡路の橋台および補強土壁の施工と、大千瀬川に架かる小田敷橋の補強を行います。

進捗状況 小田敷橋の補強工事が完了しました。引き続き、車両防護柵の取替え工事と足場の撤去を行います。

【施工中】炭素繊維シート貼付完了時



【完成】仕上げ材完了



⑤ 平成25年度 佐久間道路浦川地区工事用道路建設工事 須山建設(株) 片岡

工事概要 大千瀬川右岸側にて、大千瀬川にかかる橋を作るヤード(仮設構台)を「2基」と、左岸に渡るための仮橋を「1基」作る工事を行います。

進捗状況 工事を始めるための計画・準備を行っています。11月から、河へ降りるための仮設道路盛土工事を行います。

【着手前】大千瀬川右岸下流より



【着手前】大千瀬川左岸下流より



⑥ 平成25年度 佐久間道路大千瀬川橋下部工事 吉川建設(株) 小平

工事概要 佐久間道路のうち、大千瀬川へ架かる大千瀬川橋のP2橋脚をニューマチックケーソン工法で工事を行います。

進捗状況 工事を始めるための計画・準備を行っています。



大千瀬川左岸より右岸を望む

今回施工 P2橋脚

位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。【http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html】
