


三遠南信自動車道“佐久間道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



佐久間道路 (浦川工区) かわら版

発行 第 46号
(平成 25年12月 1日)
責任者: 安全協議会
(株)早野組
高根 信夫
TEL 053-967-3266

① 平成24年度 佐久間道路浦川地区道路建設工事 須山建設(株) 清水 053-545-0551

工事概要

佐久間道路建設に伴う国道473号付替え工事、盛土工事、佐久間道路本線上部の法面の補強を行います。

進捗状況

佐久間道路本線の盛土工事、伐採工事を行っています。



現場全景 大千瀬川対岸より撮影



473号線の2つのボックスカルバートの間に施工している補強土壁は仕上がりが高さまで上がりました。

② 平成24年度 佐久間道路浦川連絡路道路建設工事 (株)早野組 熊谷 053-967-3266

工事概要


大千瀬川左岸側にて、佐久間道路・浦川連絡路道路の橋台および補強土壁の施工を行います。

進捗状況

伐採が完了し、現在は市道拡幅工事の準備をしています。



市道小田敷線内の様子

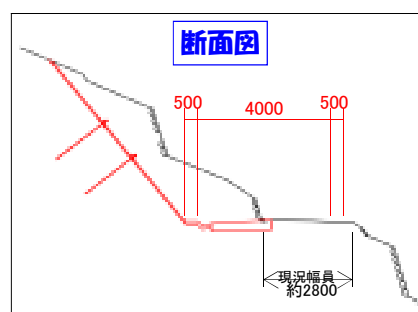

断面図

500 4000 500

現況幅員 約2800

③ 平成24年度 佐久間道路浦川地区第1トンネル新設工事 (株)大林組 出口 053-966-6011

工事概要

佐久間道路浦川地区において、佐久間道路本線のトンネルと避難用トンネルの工事を行います。トンネルは佐久間町から東栄町へ向けて約1.6km掘り進めます。

進捗状況

トンネル工事のたコンクリートプラントなどの仮設備の工事を行っています。引き続き、トンネル掘削の準備を進めてきます。



対岸からトンネル坑口を撮影



現場入口から撮影

仮設備建物を建てています


④ 平成24年度 佐久間道路浦川地区連絡路建設工事 (株)早野組 高根 053-967-3266

工事概要

大千瀬川左岸側にて、佐久間道路・浦川地区連絡路の橋台および補強土壁の施工と、大千瀬川に架かる小田敷橋の補強を行います。

進捗状況

小田敷橋の車両防護柵が新しくなります。

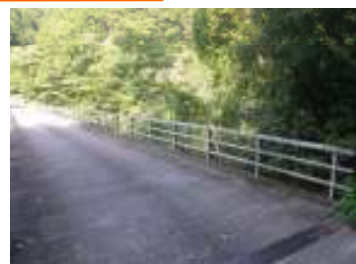

【着手前】車両防護柵を望む



【施工中】車両防護柵を望む

⑤ 平成25年度 佐久間道路浦川地区工事用道路建設工事 須山建設(株) 片岡 053-967-2731

工事概要

大千瀬川右岸側にて、大千瀬川にかかる橋を作るヤード(仮設構台)を「2基」と、左岸に渡るための仮橋を「1基」作る工事を行います。

進捗状況

河へ降りるための仮設道路盛土工事が完了し、左岸に渡るための仮橋の設置に取り掛かっています。

大千瀬川右岸下流より



国道473号線より



⑥ 平成25年度 佐久間道路大千瀬川橋下部工事 吉川建設(株) 小平 053-967-2377

工事概要

佐久間道路のうち、大千瀬川へ架かる大千瀬川橋のP2橋脚をニューマチックケーソン工法で工事を行います。

進捗状況

工事を始めるための計画・準備を行っています。



大千瀬川左岸より右岸を望む

今回施工 P2橋脚

位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。【http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html】
