

三遠南信自動車道“佐久間道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



# 佐久間道路 (浦川工区) かわら版

発行第71号  
 (平成28年2月1日)  
 責任者:安全協議会  
 株大林組  
 出口 大輔  
 TEL053-966-6011


## ① 平成24年度 佐久間道路浦川地区第1トンネル新設工事 (株)大林組 出口 053-966-6011

### 工事概要

浦川地区において、佐久間道路本線のトンネルと避難用トンネルの工事を行います。  
 トンネルは浜松市から東栄町へ向けて約1.6km掘進します。

### 進捗状況

引き続き、本線トンネルの施工を進めています。  
 1/25現在の進捗 本坑 1,314.9m/1,555m 残り 約240m!!  
 避難坑 1,575m ★掘削完了

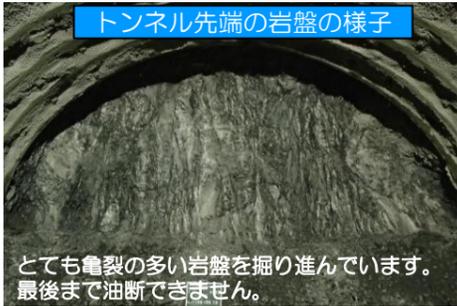

トンネル先端の岩盤の様子

とても亀裂の多い岩盤を掘り進んでいます。最後まで油断できません。



本線トンネルの上から

## ② 平成26年度 佐久間道路大千瀬川橋PC上部工事 鹿島建設(株) 川岸 053-966-6253

### 工事概要

大千瀬川を跨ぐ、長さ270mのコンクリート製の橋梁を構築する工事です。

### 進捗状況

P1橋脚は、ワーゲン(移動作業車)を使って張出施工を、A2側は橋台との連結部分の施工を行っています。  
 1/25時点での進捗 229.5m/270.0m



【下流側から側面を望む】



【A2側径間施工状況】

張出施工後の最初の連結部分の施工を行っています。

## ③ 平成26年度 佐久間道路浦川連絡路北建設工事 須山建設(株) 鈴木 053-967-3951

### 工事概要

大千瀬川左岸側にて、佐久間道路・浦川連絡路の工事で軽量盛土で連絡路の施工を行います。

### 進捗状況

軽量盛土(発泡スチロールブロック)が完成いたしました。今後、2号・3号法面の掘削と法面補強工事を行います。



3号法面

2号法


## ④ 平成26年度 佐久間道路浦川連絡路南建設工事 (株)鈴木組 鈴木信 053-967-2511

### 工事概要

浦川地区において佐久間道路浦川IC(仮称)への連絡路を築造する道路改良工事です。

### 進捗状況

連絡路の補強土壁(テールアルメ)区間です。基礎フーチングの築造では、温度低下に配慮し、養生を行っています。今後、テールアルメの据付けを行います。

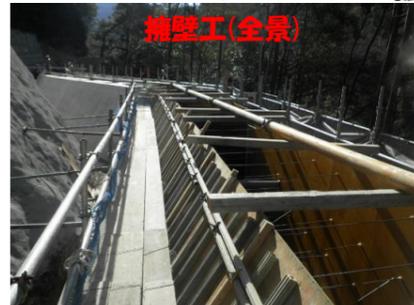

擁壁工(全景)



擁壁工(養生)

## ⑤ 平成26年度 佐久間道路浦川地区道路建設工事 須山建設(株) 鈴木克 053-967-2731

### 工事概要


三遠南信道浦川IC(仮称)への連絡路建設に伴う進入路の軽量盛土及び法面の補強工事を行います。

### 進捗状況

軽量盛土工(発泡スチロールブロック)の施工を行っています。中間に床版コンクリートを打設して、さらにブロックを積み重ねていきます。



錦橋より撮影

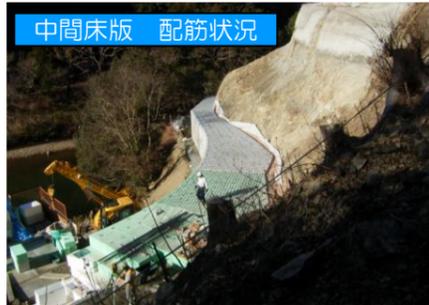

中間床版 配筋状況

三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南進自動車道 道路事業  
 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

[http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo\\_douro/gaiyo\\_sanen\\_index.html](http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html)

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。  
 ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。



<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>
