



佐久間道路 (浦川工区) かわら版 (1/2)

発行第95号
(平成30年2月1日)
責任者：安全協議会
(株)アルス製作所
山崎 厚弘
TEL 053-967-2737

① 平成29年度 佐久間道路佐久間第1トンネル監査路浦川地区工事 中村建設(株) 瀧本 053-967-2870

工事概要 浦川地区にて、佐久間道路佐久間第1トンネル本坑内において監査路及び道路付属施設の設置を行います。

進捗状況 浦川IC(仮称)内の道路設備管は施工が完了しました。引き続き浦川IC(仮称)内の排水構造物等の設置を行っています。

浦川IC(仮称)

トンネル坑口




② 平成29年度 佐久間道路浦川右岸道路建設工事 須山建設(株) 加茂 053-967-3561

工事概要 浦川地区にて、佐久間道路佐久間第1トンネル上部の地山安定化と浦川IC(仮称)の盛土を行う工事です。

進捗状況 法面施工エリアではトンネル上部にてモルタル吹付けの施工を行っています。2月より法枠の施工を行います。盛土施工エリアでは引き続き浦川IC(仮称)オフランプ部の盛土、排水構造物の施工を行います。

法面施工エリア

盛土施工エリア

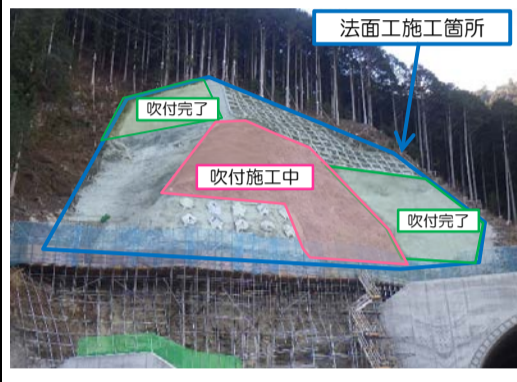


③ 平成29年度 佐久間道路佐久間第1トンネル舗装浦川地区工事 日本道路(株) 狩野 053-463-1850

工事概要 佐久間第1トンネル本坑内(浦川側)において、コンクリート舗装および排水構造物の施工を行います。

進捗状況 現在、コンクリート舗装の路盤工を施工しています。路盤工とはコンクリート舗装の基盤を作る工事です。3月からはコンクリートを打設する予定です。

トンネル本坑内(浦川側)

完成予想

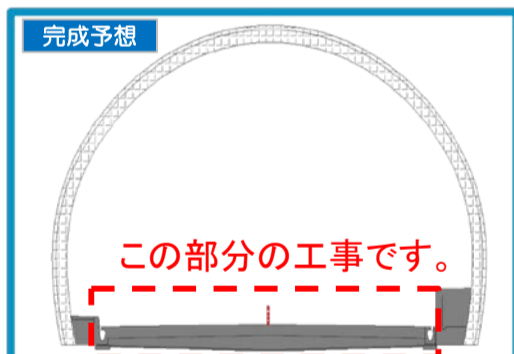

路盤施工中

この部分の工事です。



・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>



佐久間道路 (浦川工区) かわら版 (2/2)

発行第95号
 (平成30年2月1日)
 責任者:安全協議会
 (株)アルス製作所
 山崎 厚弘
 TEL 053-967-2737

④ 平成29年度 佐久間道路浦川左岸道路建設工事 (株)早野組 川端 050-5306-6021

工事概要

浦川地区にて、浦川IC(仮称)のアクセス道路となる市道佐久間小田敷線の落石防止対策及び連絡路橋の橋台工事をを行います。

進捗状況

ガードレール基礎の調整コンクリートを施工中です。引き続き法面上部の落石対策工事をを行います。

ガードレール基礎調整コンクリート



ガードレール基礎調整コンクリート施工

落石対策工事



⑤ 平成29年度 佐久間道路浦川左岸連絡路橋鋼上部工事 (株)アルス製作所 山崎 053-967-2737

工事概要

浦川左岸連絡路橋の上部工事です。浦川IC(仮称)へのアクセス道路となる橋梁を架設します。本橋梁は鉄製で工場で作成した桁を現場に搬入して大型クレーンで架設します。

進捗状況

工場での橋桁の製作・塗装が完了し、2月上旬より国道473号の片側交互通行を実施し、橋桁の搬入を行い、架設工事を予定しています。通行等、ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

橋桁製作(塗装完了)



基礎杭削孔状況



⑥ 平成29年度 佐久間道路吉沢地区整備工事 鈴中工業(株) 溝口 0536-76-1703

工事概要

吉沢地区にて佐久間・三遠道路トンネル工事で発生した掘削土を受入れ、盛土する工事をを行います。

進捗状況

要対策土が他の土砂と接触しないよう処理ポケット内側に遮水シートにて仕切りを施工しています。遮水シートの施工を2月末までの予定で行います。

遮水シート施工状況(上空から)



遮水シート施工状況



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>
