

国道247号西知多道路（長浦～日長） 令和6年 12月 工事便り

1. 編集長からひと言

西知多道路整備事業（長浦～日長）に関しまして、地域の皆様にはご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。
12月度の工事便りの編集長になりました(株)ヒメノ 監理技術者の森野と申します。

私どもが行っている工事①について、市道50001号線の切り回しが完了し、11月26日に通行可能となりました。通行止めにご協力いただき誠にありがとうございました。切り回し市道は右下図の通りカーブしておりますので通行される際はご注意ください。

2. 他工事からのお知らせ

工事④：「西知多産業道路」、「市道北浜金沢線（サービス市道）」通行止めの予定（ホームページ・SNSに掲載）。

ホームページ
SNSはコチラ
⇒



▲SNS



▲名四国道

第8号 令和 6年 12月


西知多道路安全協議会 編集長：(株)ヒメノ

TEL 0562-22-1881

FAX 0562-22-2067

監修：名四国道事務所（工務課：西知多道路）

TEL 052-823-7911（代表）

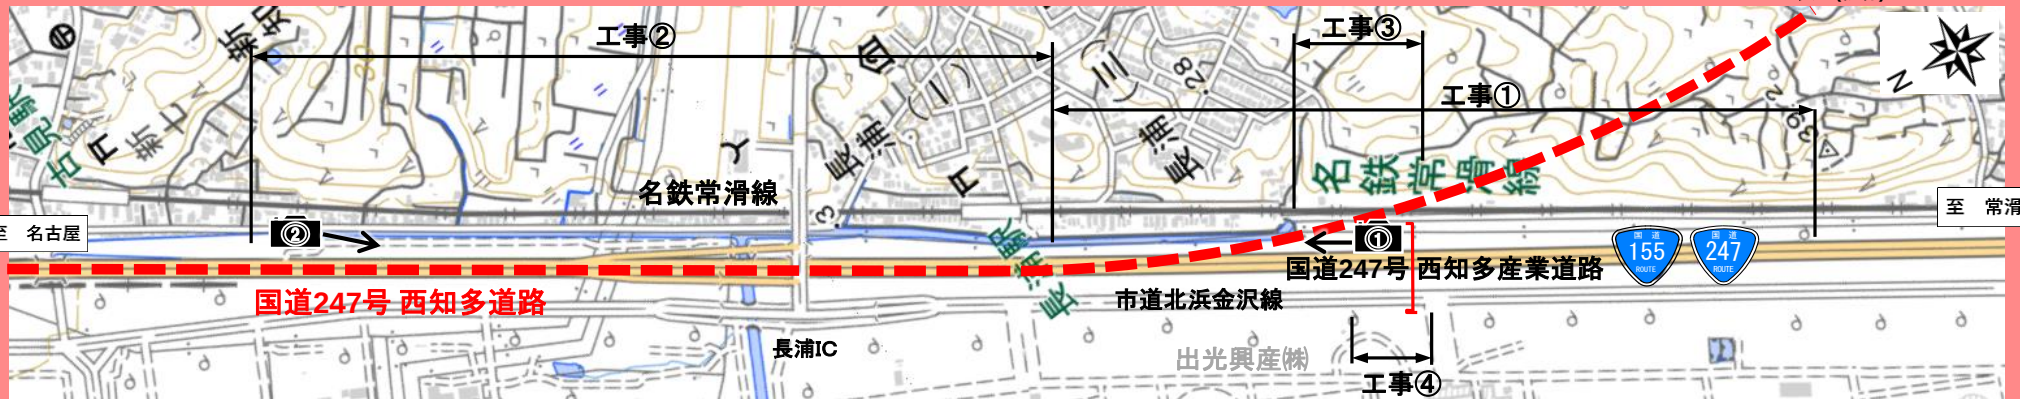

工事①

工事名	令和5年度 247号西知多道路南浜町道路建設工事
工期	令和5年12月22日 ～ 令和7年1月31日 (工期延伸予定)
施工業者	株式会社 ヒメノ 現業代理人：西田 悦史 監理技術者：森野 健二 TEL 0562-22-1881 FAX 0562-22-2067
11月末時点進捗率	85%
12月作業予定	残土処理工
工事概要	知多市南浜町で仮防湖堤の新設と切回し市道をつくっています。



アスファルト舗装状況

工事②

工事名	令和6年度 247号西知多道路長浦IC東地区道路建設工事
工期	令和6年4月12日 ～ 令和7年6月30日
施工業者	名工建設株式会社 現業代理人：花井 亮太 監理技術者：堀井 麗介 TEL 0562-38-5611 FAX 0562-38-5612
11月末時点進捗率	15%
12月作業予定	長浦IC仮出口(南行き)延伸部 排水場造物工ほか
工事概要	知多市南浜町で長浦IC改良のための仮設出入口を建設します。



延伸OFFランプ部 掘削作業中

工事③

工事名	令和6年度 247号西知多道路長浦路線橋下部工事
工期	令和6年5月15日 ～ 令和8年3月27日
施工業者	株式会社 竹中土木 現業代理人：牛田 裕行 監理技術者：王 棟 TEL 0569-47-6602 FAX 0569-47-6603
11月末時点進捗率	0%
12月作業予定	現場整備・伐採
工事概要	知多市南浜町で新設の長浦路線橋の橋台・橋脚をつくります。



現場休憩所設置

工事④

工事名	令和6年度 247号西知多道路関機新歩道橋上部工事
工期	令和6年4月12日 ～ 令和7年4月30日
施工業者	UBEマシナリー株式会社 現業代理人：安達 剛 監理技術者：岡田 拓也 主任技術者：長久 剛隆 TEL 0836-22-6228 FAX 0836-22-6272
11月末時点進捗率	61%
12月作業予定	工場塗装工、(現場)バント設置、支柱据付
工事概要	知多市南浜町で新設の長浦横断歩道橋の上部工をつくっています。



工場製作状況(階段形製作中)

～切り回し市道50001号線～



至 常滑

至 名古屋
