


国道155号 豊田南バイパス・国道153号 豊田北バイパス 令和7年5月 工事便り

May

5月

こちらのQRコードから過去の工事便りもご覧になれます↓

(名四国道事務所HP)

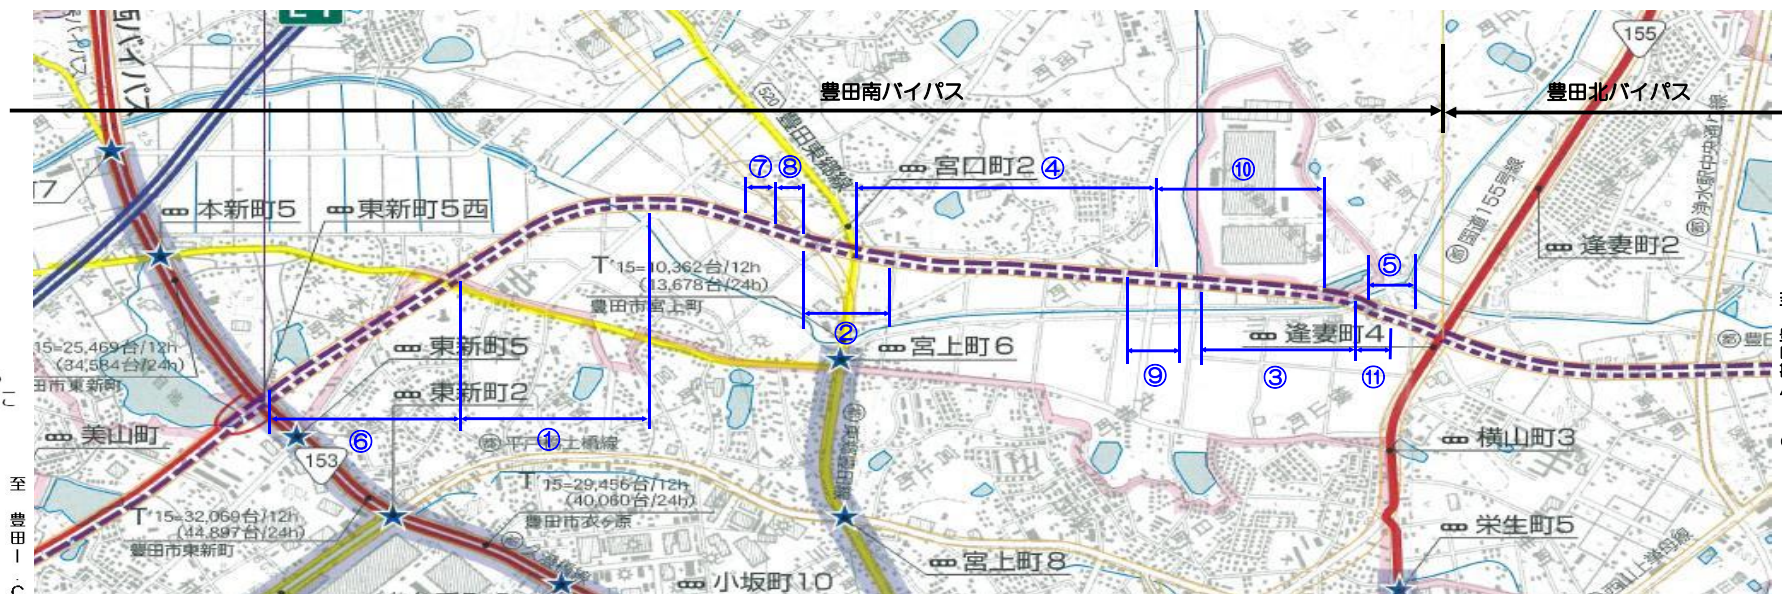

発行 第60号 令和7年5月1日

豊田支部工事等安全協議会
編集長：ヤハギ道路株式会社
豊田西山改良作業所
TEL 0565-41-6105
FAX 0565-41-6105

監修：名四国道事務所 豊田出張所
TEL 0565-32-7581
FAX 0565-32-7586

①	②	③	④	⑤	⑥ 新規工事です
工事名 令和6年度 155号豊田南BP宮口西地区床版工事 工期 令和6年8月30日 ～ 令和7年8月29日 施工業者 中部土木株式会社 現場代理人：有金 良昭 監理技術者：水谷 功 TEL 0565-42-3115 FAX 0565-42-3116 4月末時点進捗率 46% 5月作業予定 (宮口) 型枠支保工、鉄筋 (宮口) 足場解体 工事概要 東新町～宮口町において、宮口橋(仮称)、宮口橋(仮称)の床版工事を行います。	工事名 令和6年度 155号豊田南BP宮口高架橋床版工事 工期 令和6年7月29日 ～ 令和7年8月29日 施工業者 昭和土木株式会社 現場代理人：児玉 和也 監理技術者：螺澤 公明 TEL 050-5830-2416 FAX 050-5830-2416 4月末時点進捗率 70% 5月作業予定 橋梁付属物工(壁高欄)、擁壁工(鉄筋・型枠組立) 工事概要 宮口町～天王町において、擁壁の築造及び、宮口高架橋(仮称)の床版工事を行います。	工事名 令和6年度 155号豊田南BP横山橋床版工事 工期 令和6年7月24日 ～ 令和7年8月29日 施工業者 丸洋建設株式会社 現場代理人：中島 明実美 監理技術者：小野内 智之 TEL 0563-54-7412 FAX 0565-42-4620 4月末時点進捗率 72% 5月作業予定 地盤改良工 工事概要 横山地区において、地盤改良、函渠の築造及び、横山橋(仮称)の床版工事を行います。	工事名 令和6年度 155号豊田南BP天王地区道路建設工事 工期 令和6年11月26日 ～ 令和7年12月26日 施工業者 丸洋建設株式会社 現場代理人：三矢 裕次郎 監理技術者：久米 広和 TEL 0563-54-7412 FAX 0565-42-4620 4月末時点進捗率 7% 5月作業予定 構造物撤去工、地盤改良工 工事概要 豊田市天王町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、補強土壁工事を行います。	工事名 令和6年度 155号豊田南BP西山地区道路建設工事 工期 令和6年12月27日 ～ 令和7年12月26日 施工業者 ヤハギ道路株式会社 現場代理人：駿河 德行 特別監理技術者：垣見 健一 TEL 0565-41-6105 FAX 0565-41-6105 4月末時点進捗率 21% 5月作業予定 道路土工、排水構造物工、地盤改良工 工事概要 豊田市逢妻町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、舗装、擁壁工事を行います。	工事名 令和6年度 155号豊田南BP本新地区道路建設工事 工期 令和7年4月1日 ～ 令和8年2月27日 施工業者 中部土木株式会社 現場代理人：正治 英剛 監理技術者：正治 英剛 TEL — FAX — 4月末時点進捗率 0% 5月作業予定 準備工 工事概要 豊田市東新町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、舗装、擁壁工事を行います。
 宮口橋(仮称)	 地覆・壁高欄工	 擁壁工	 豊田IC側から豊田勘/IC側を望む	 豊田勘/IC側から豊田IC側を望む	 豊田IC側から豊田勘/IC側を望む

⑦ 新規工事です	⑧ 新規工事です	⑨ 新規工事です	⑩ 新規工事です	⑪ 新規工事です
工事名 令和6年度 155号豊田南BP宮口西地区道路建設工事 工期 令和7年4月1日 ～ 令和8年5月29日 施工業者 中部土木株式会社 現場代理人：外山 幹昌 監理技術者：外山 幹昌 TEL — FAX — 4月末時点進捗率 0% 5月作業予定 準備工 工事概要 豊田市宮口町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、擁壁工事を行います。	工事名 令和6年度 155号豊田南BP宮口東地区道路建設工事 工期 令和7年4月1日 ～ 令和8年5月29日 施工業者 鈴中工業株式会社 現場代理人：林 雅憲 監理技術者：成瀬 卓宏 TEL — FAX — 4月末時点進捗率 0% 5月作業予定 準備工 工事概要 豊田市宮口町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、擁壁工事を行います。	工事名 令和6年度 155号豊田南BP宮口上地区道路建設工事 工期 令和7年4月10日 ～ 令和8年3月10日 施工業者 太啓建設株式会社 現場代理人：清水 寛都 監理技術者：鬼頭 進一 TEL — FAX — 4月末時点進捗率 0% 5月作業予定 準備工 工事概要 豊田市天王町～丸根町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、排水構造物工事、及び市道豊田西部線改良工事を行います。	工事名 令和6年度 155号豊田南BP天王横山地区道路建設工事 工期 令和7年4月2日 ～ 令和8年2月27日 施工業者 小原建設株式会社 現場代理人：藤本 宗久 監理技術者：藤本 宗久 TEL — FAX — 4月末時点進捗率 0% 5月作業予定 準備工 工事概要 豊田市天王町～貞宝町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、擁壁工事を行います。	工事名 令和6年度 155号豊田南BP横山地区道路建設工事 工期 令和7年4月9日 ～ 令和8年2月27日 施工業者 黒柳建設株式会社 現場代理人：杉浦 充浩 監理技術者：杉浦 充浩 TEL — FAX — 4月末時点進捗率 0% 5月作業予定 準備工 工事概要 豊田市横山町～逢妻町で豊田南バイパスの盛土、地盤改良、擁壁工事を行います。
 写真 coming soon....	 写真 coming soon....	 写真 coming soon....	 写真 coming soon....	 写真 coming soon....

編集長からひと言

平素は、豊田南・北バイパス工事に関しまして、地域の皆様にはご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。
5月度の工事便りの編集長になりました『令和6年度155号豊田南BP西山地区道路建設工事』を施工しております、ヤハギ道路(株)現場代理人の駿河と申します。私どもの工事では、155号豊田南BPの逢妻IC(西山地区)において市道貞宝線の切り回しを行います。工事期間中は地元の方々には何かとご負担をおかけしますが、引き続き豊田南・北バイパス工事にご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。
