

国道247号西知多道路（長浦～日長） 令和7年 7月 工事便り

編集長からひと言

西知多道路整備事業（長浦～日長）に関しまして、地域の皆様にはご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。
7月度の工事便りの編集長になりました名工建設（株） 監理技術者の堀井と申します。
私どもが行っている工事①について、長浦IC改良のための「切り回し道路（仮出口）」を建設中。今後の施工は、右下イメージ図の予定です。
また、そのほかの工事③において、夜間作業のお知らせがあります。

工事③において、名鉄常滑線との近接工事により**夜間作業が本格的に開始**します。作業予定と作業イメージは裏面をご覧ください。

引き続き安全第一、振動・騒音には十分注意して施工いたします。
皆様にはご不便ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い致します。

令和7年7月8日

ホームページ
SNSはこちら
↓ ↓




▲SNS






▲名四国道

令和 7年 7月
西知多道路安全協議会 編集長：名工建設（株）
TEL 0562-38-5611
監修：名四国道事務所（工務課：西知多道路）
TEL 052-823-7911（代表）
知多市・都市整備部 土木課
TEL 0562-36-2671

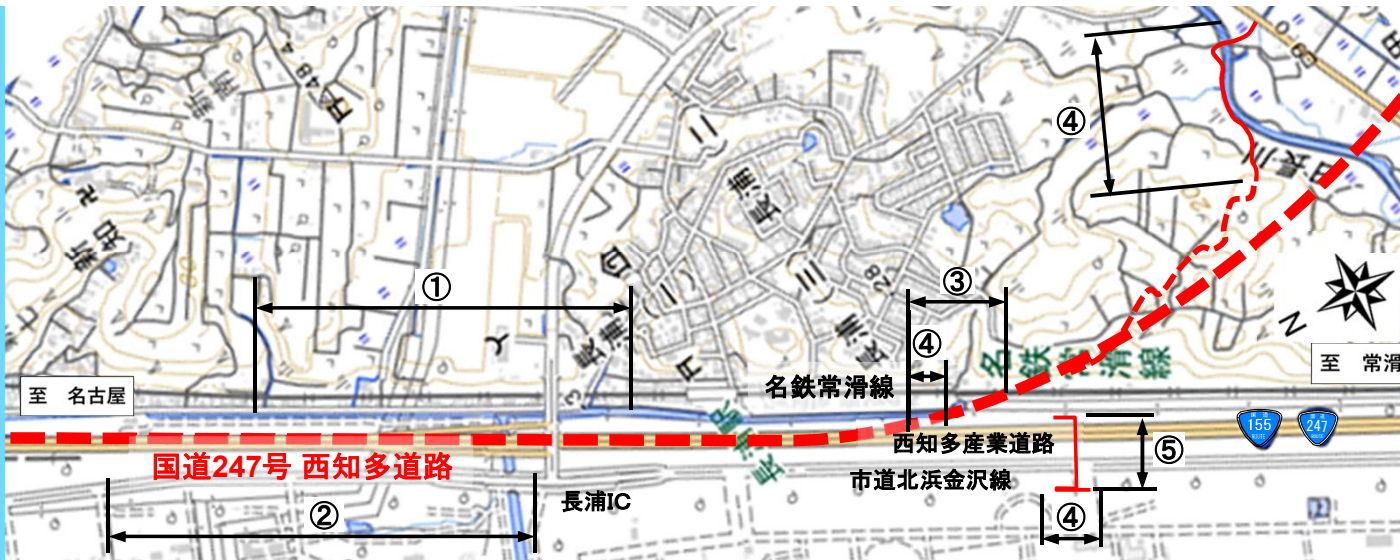

工事① 今後の施工イメージ

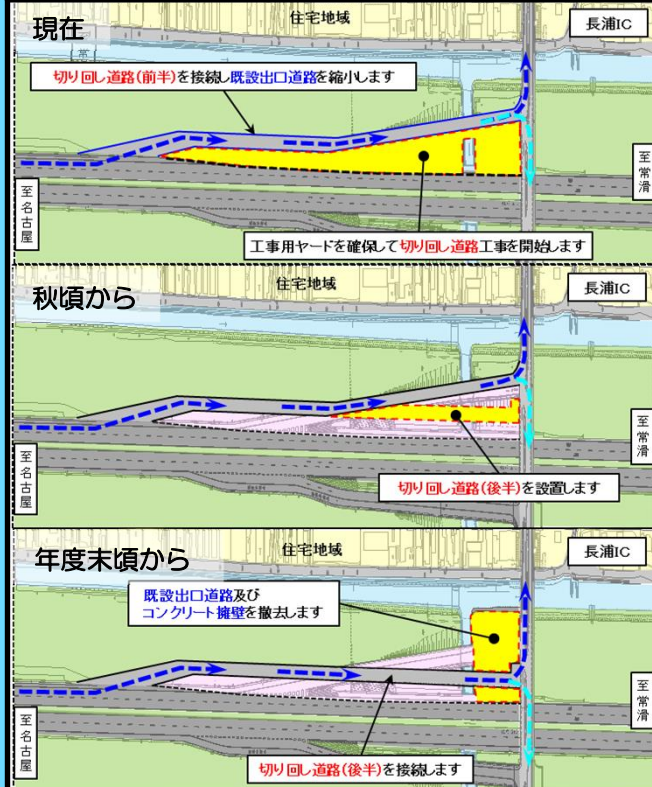

工事①	工事②	工事③	工事④	工事⑤
令和6年度 247号西知多道路長浦IC東地区道路建設工事	令和6年度 247号西知多道路長浦IC西地区道路建設工事	令和6年度 247号西知多道路長浦踏切橋下部工事	令和6年度 247号西知多道路日長地区道路建設工事	令和6年度 247号西知多道路横断歩道上部工事
工 期 令和6年4月12日 ～ 令和7年11月21日	工 期 令和7年5月7日 ～ 令和8年2月27日	工 期 令和6年5月15日 ～ 令和8年3月27日 (令和9年3月末まで工期延長予定)	工 期 令和7年5月7日 ～ 令和8年2月27日	工 期 令和6年4月12日 ～ 令和7年8月12日
施 工 者 名工建設株式会社 現場代理人：花井 亮太 監理技術者：堀井 陽介 TEL 0562-38-5611 FAX 0562-38-5612	施 工 者 株式会社 近藤組 現場代理人：藤田 重敏 監理技術者：磯貝 裕志 TEL 0562-38-7182 FAX 0562-38-7183	施 工 者 株式会社 竹中土木 現場代理人：山田 敏雄 監理技術者：王 様 TEL 0569-47-6602 FAX 0569-47-6603	施 工 者 株式会社 ヒメノ 現場代理人：磯谷 隼大 監理技術者：森野 隆二 TEL 0562-22-1881 FAX 0562-22-2067	施 工 者 UBEマシナリー株式会社 現場代理人：坂本 弘 監理技術者：岡田 拓也 主任技術者：長久 龍蔵 TEL 052-693-9875 FAX 052-693-9876
6月末時点 進捗率 40%	6月末時点 進捗率 0%	6月末時点 進捗率 4%	6月末時点 進捗率 2%	6月末時点 進捗率 98%
7月作業予定 工事用道路整備、鋼矢板圧入 他	7月作業予定 伐採工 他	7月作業予定 鋼矢板圧入	7月作業予定 準備工・道路土工	7月作業予定 薄層舗装工ほか
工 事 概 要 知多市南浜町で長浦IC改良のための仮設出口道路を建設します。	工 事 概 要 知多市北浜町(上り線137号)で長浦IC改良のための切り返し道路を建設します。	工 事 概 要 知多市南浜町で新設の長浦踏切橋の橋脚を建設します。	工 事 概 要 知多市日長で工事用道路、南浜町で構造物撤去と新歩道橋周りを建設します。	工 事 概 要 知多市南浜町で新設の長浦横断歩道橋の上部工を建設します。
 埋設物調査ボーリング 施工中	 着手前	 鋼矢板施工状況	 準備中	 歩道橋全景写真 東(名鉄線路)側より


工事③ 令和6年度 247号西知多道路長浦跨線橋下部工事

知多市南浜町で新設の長浦跨線橋の橋脚を建設します。※夜間作業あり

令和7年7月8日

【位置】

作業ヤードは赤囲いの範囲を予定

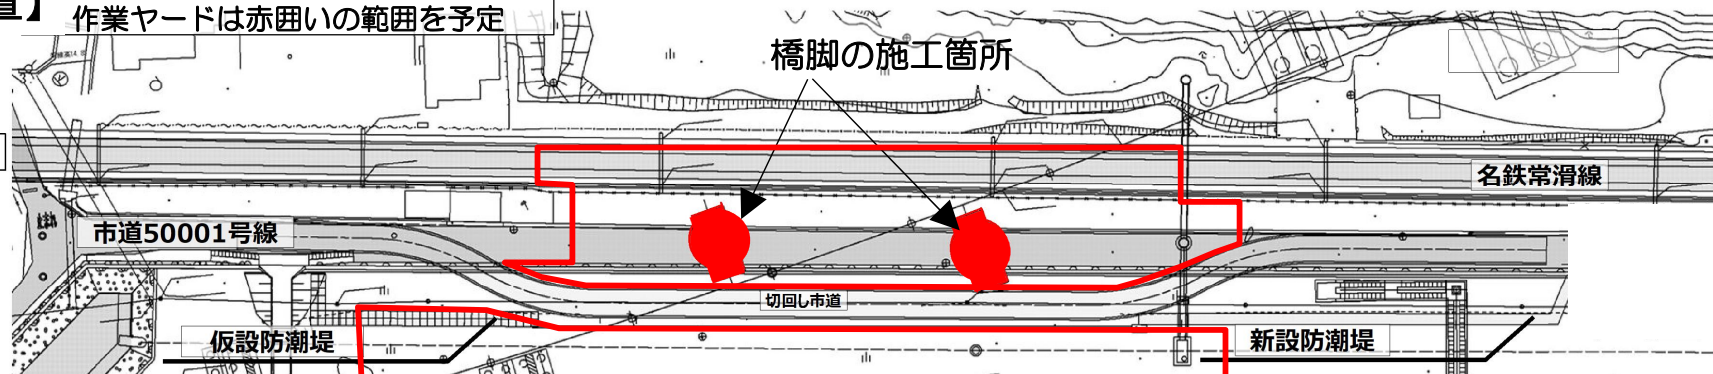

本工事の全体予定（昼施工8時～17時、夜施工23時～翌5時、土日祝日は除く）※現時点の予定であり、今後の天候や現場状況により変わることがあります）


R7.6.16～R7.11.28
基本夜施工
（一部昼施工）

R7.11月～R7.12月
昼夜施工


R7.11月～R8.10月
昼夜施工

R8.10月～R9.2月
基本昼施工
（一部夜施工あり）


R9.2月～R9.3月
昼施工

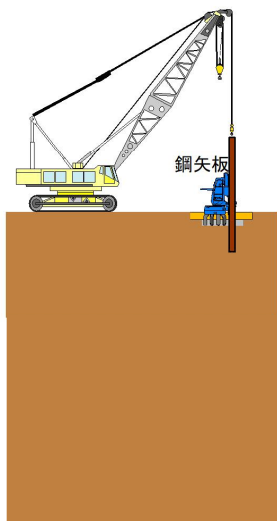


STEP①
鋼矢板圧入

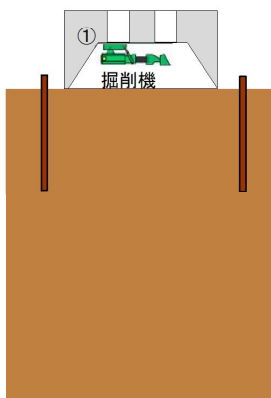


STEP②
ニューマチック
ケーソン基礎施工①

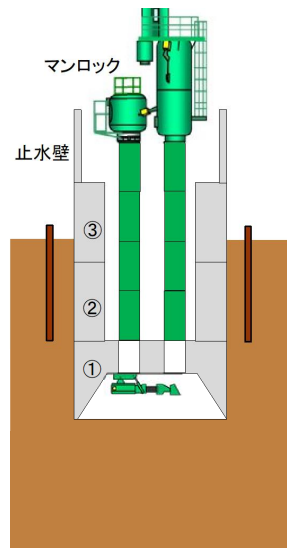

STEP③
ニューマチック
ケーソン基礎施工②

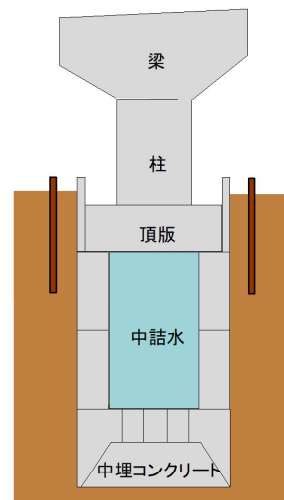


STEP④
躯体施工

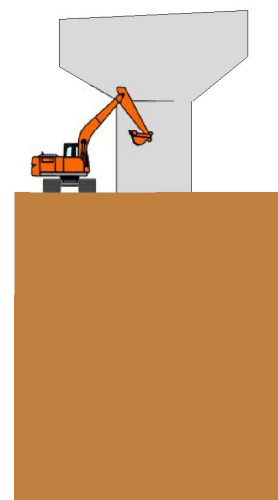

STEP⑤
埋戻し(完成)

【工事状況 令和7年6月】

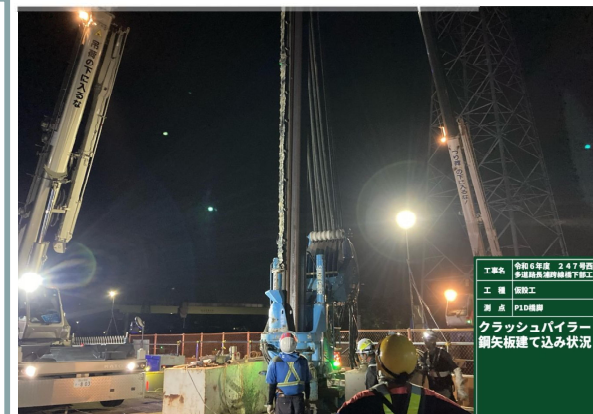

・名鉄近接施工のため、夜23時～翌5時頃での施工となります。

・騒音振動が少ない低騒音型の機械の使用と防音シートを使用し、騒音振動の低減を図ります。

【連絡先】

施工会社：株式会社 竹中土木
担当者：王 棟
電話番号：080-9810-2879
