

蒲郡バイパス 工事便り


幸田芦谷IC～神ノ郷トンネル東側区間

一般国道23号蒲郡バイパスは名豊道路の一部として計画され、東は豊橋バイパス、西は岡崎バイパスと接続する延長15.0kmのバイパスです。蒲郡バイパスのうち蒲郡ICから幸田芦谷ICまでの5.9kmについては平成9年度に事業化され、現在、暫定2車線の早期開通をめざし工事を行っています。
これから開通まで月1回を目標に、沿線地域の皆さまに工事状況を「蒲郡バイパス工事便り」に載せお伝えします。

創刊号 別紙1
平成24年6月7日

蒲郡バイパス支部工事安全協議会
編集長：(株)フジタ 鈴木 信行
TEL 0533-66-0950

監修：名四国道蒲郡建設監督官詰所

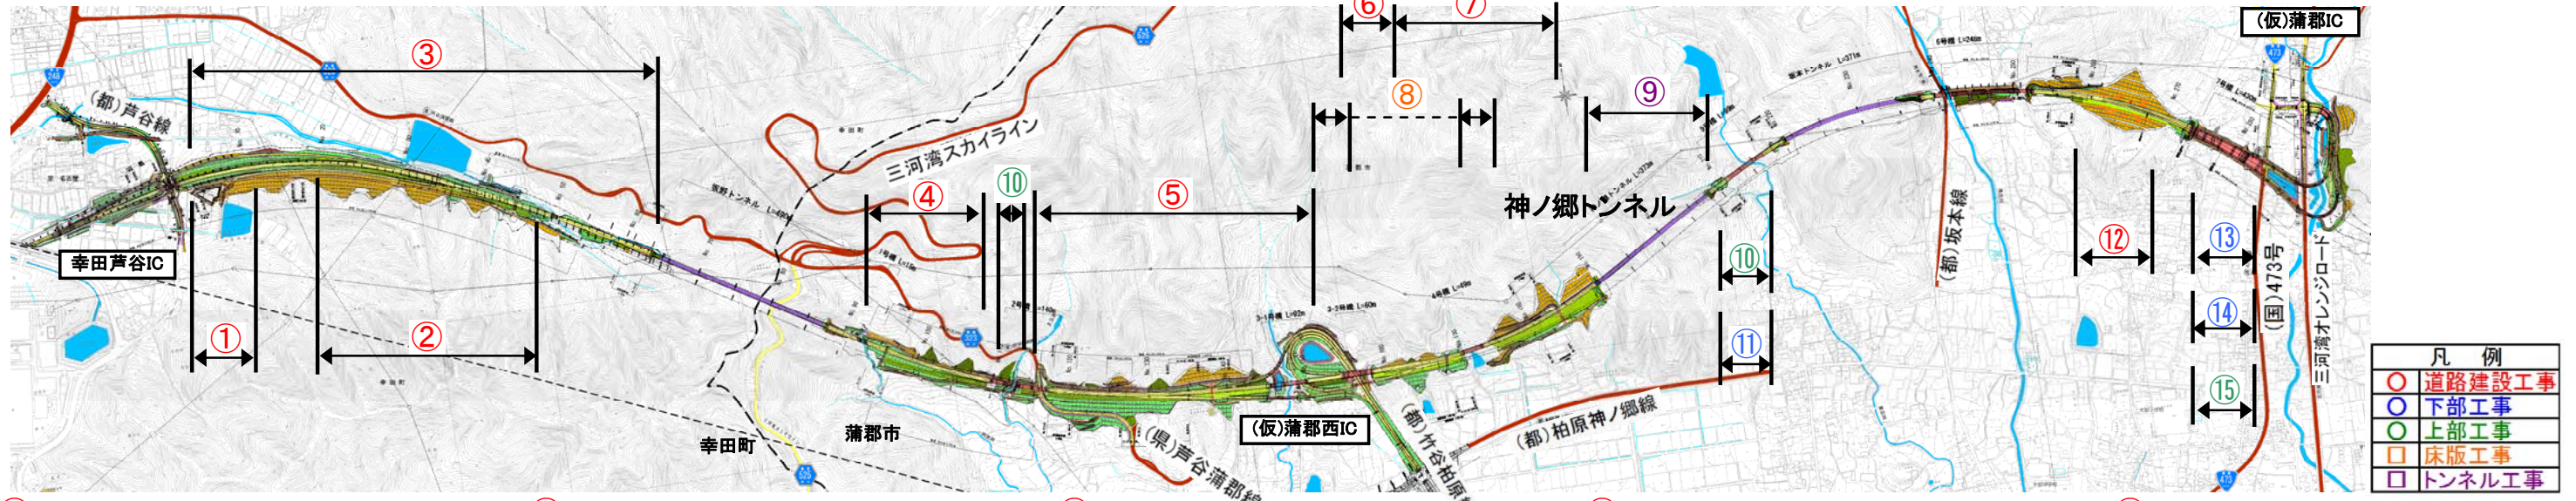

①

工事名	平成23年度 23号蒲郡BP幸田芦谷IC道路建設工事
工期	平成24年3月30日～平成24年10月31日
施工業者	株近藤組
5月作業内容	伐採工
進捗率	1%
6月作業内容	伐採工、掘削工、残土処理工

幸田芦谷ICを望む

②

工事名	平成23年度 23号蒲郡BP芦谷西道路建設工事
工期	平成24年3月7日～平成24年10月30日
施工業者	株近藤組
5月作業内容	伐採工、掘削工
進捗率	0%
6月作業内容	伐採工、掘削工

名古屋側より豊橋側を望む：着手前

③

工事名	平成23年度 23号蒲郡BP芦谷東道路建設工事
工期	平成23年8月11日～平成24年8月31日
施工業者	朝日工業株
5月作業内容	掘削工、残土処理工、補強土壁工
進捗率	57%
6月作業内容	掘削工、残土処理工、補強土壁工

幸田芦谷ICを望む

④

工事名	平成23年度 23号蒲郡BP柏原西道路建設工事
工期	平成24年3月13日～平成24年10月31日
施工業者	中部土木株
5月作業内容	擁壁工、路床盛土工
進捗率	0%
6月作業内容	擁壁工、路床盛土工

豊橋側より名古屋側を望む：着手前

⑤

工事名	平成23年度 23号蒲郡BP柏原東道路建設工事
工期	平成24年3月28日～平成24年10月31日
施工業者	長坂建設興業株
5月作業内容	重力式擁壁工、補強土壁工
進捗率	0%
6月作業内容	重力式擁壁工、補強土壁工

豊橋側より名古屋側を望む：着手前

⑥

工事名	平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡西IC道路建設工事
工期	平成23年11月18日～平成24年11月30日
施工業者	TSUCHIYA株
5月作業内容	盛土工、補強土壁工
進捗率	21%
6月作業内容	盛土工、補強土壁工

名古屋側より調整池部を望む

⑦

工事名	平成23年度 23号蒲郡BP上名取西地区道路建設工事
工期	平成23年9月17日～平成24年12月20日
施工業者	鈴木工業株
5月作業内容	道路土工、擁壁工
進捗率	41%
6月作業内容	道路土工、擁壁工

函渠工を望む

⑧

工事名	平成23年度 23号蒲郡BP上名取橋床版工事
工期	平成23年9月16日～平成24年11月22日
施工業者	神野建設株
5月作業内容	壁高欄、大型ブロック積工
進捗率	52%
6月作業内容	壁高欄、大型ブロック積工

(仮)蒲郡西ICランプ橋を望む

⑨

工事名	平成21年度 23号蒲郡BP神ノ郷トンネル工事
工期	平成22年3月11日～平成24年10月3日
施工業者	(株)フジタ
5月作業内容	覆工コンクリート、掘削工、残土処理工
進捗率	88%
6月作業内容	覆工コンクリート、掘削工、残土処理工


名古屋側の坑口部

⑩

工事名	平成23年度 23号蒲郡BP神ノ郷高架橋PC上部工事
工期	平成24年2月25日～平成25年2月28日
施工業者	株安部日鋼工業
5月作業内容	工場製作中
進捗率	1%
6月作業内容	工場製作中


柏原2号橋(側道上线)：着手前(工場製作中)

神ノ郷トンネル東側～蒲郡IC区間

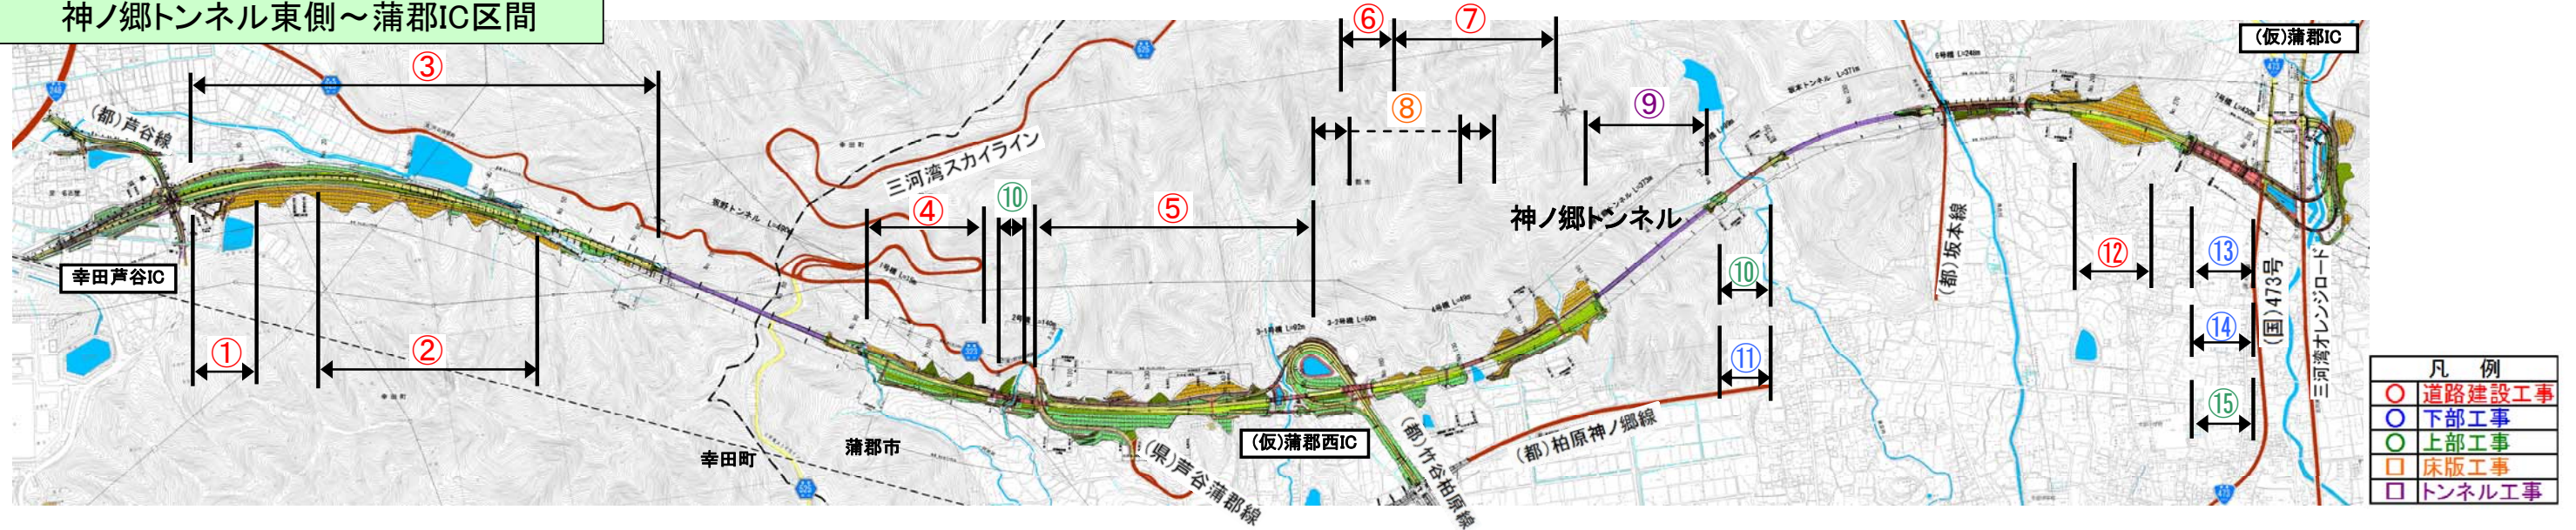

⑪


工事名	平成23年度 23号蒲郡BP神ノ郷高架橋下部工事		
工期	平成23年9月23日～平成25年2月22日		
施工業者	㈱ピーエス三菱		
5月作業内容	橋脚工、橋台工、農業用水工	進捗率	23%
6月作業内容	橋脚工、橋台工、農業用水工		



豊橋側より名古屋側を望む

⑫

工事名	平成23年度 23号蒲郡BP清田道路建設工事		
工期	平成23年10月21日～平成24年12月20日		
施工業者	吉川建設㈱		
5月作業内容	伐採工、掘削工、残土処理工	進捗率	23%
6月作業内容	伐採工、掘削工、残土処理工		



名古屋側より豊橋側を望む

⑬

工事名	平成22年度 23号蒲郡BP蒲郡IC下部工事		
工期	平成23年1月23日～平成24年6月27日		
施工業者	㈱森組		
5月作業内容	大型ブロック積工、片づけ	進捗率	94%
6月作業内容	大型ブロック積工、片づけ		



A1橋台：豊橋側より名古屋側を望む

⑭


工事名	平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡IC橋下部工事		
工期	平成24年2月3日～平成24年10月31日		
施工業者	㈱新井組		
5月作業内容	鋼矢板打込み	進捗率	1%
6月作業内容	鋼矢板打込み		



豊橋側より名古屋側を望む：着手前

⑮

工事名	平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡IC鋼上部工事		
工期	平成24年3月1日～平成25年3月18日		
施工業者	㈱横河ブリッジ		
5月作業内容	工場製作中	進捗率	11%
6月作業内容	工場製作中		



豊橋側より名古屋側を望む：着手前(工場製作中)

編集長からひと言



国道23号蒲郡バイパス、神ノ郷トンネル工事施工に当たりまして地元の皆様方には常日頃より、ご協力頂き大変感謝致しております。

神ノ郷トンネル工事は、平成23年1月より道路切土掘削工事を着手し、8月よりトンネルの掘削を開始致しました。2月11日には延長373mのトンネル掘削も完了、蒲郡市長をはじめ地元関係者の方にも出席頂き貫通式を執り行いました。3月からはトンネル覆工コンクリートの巻き立て作業を開始、10月3日の工事の竣工を目指し工事を進めております。

トンネル掘削開始時の発破作業におきまして騒音を発し地元皆様方に多大な、ご迷惑をお掛け致しましたこと心よりお詫び申し上げます。

神ノ郷トンネル工事も残すところ4ヶ月余りです、地元皆様方との融和を図りながら鋭意努力して参りますので、ご理解とご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。お気づきの点がございましたら、何なりとお申し付けください。

神ノ郷トンネル作業所 所長 鈴木 信行
