

沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。


蒲郡バイパス 工事便り

幸田芦谷IC～神ノ郷トンネル東側区間

発行 第4号
平成24年9月1日

蒲郡バイパス支部工事安全協議会
編集長: 神野建設(株) 石黒 誠
TEL 0533-67-1622、FAX 0533-67-1644


監修: 名四国道蒲郡建設監督官詰所
TEL 0533-67-0286、FAX 0533-67-0287

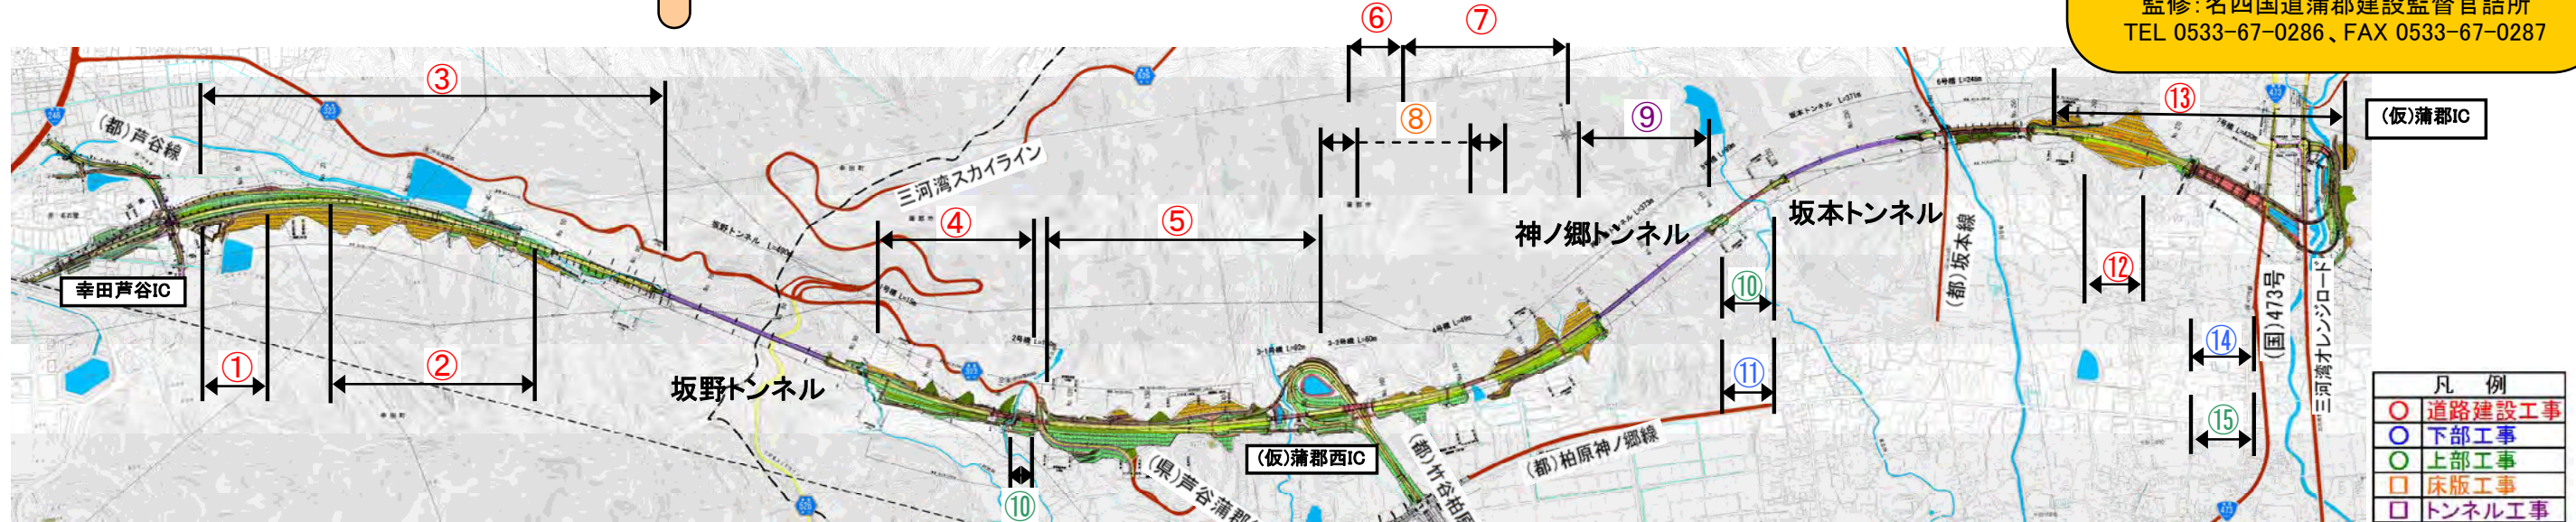





①	②	③	④	⑤
工事名 平成23年度 23号蒲郡BP幸田芦谷IC道路建設工事	工事名 平成23年度 23号蒲郡BP芦谷西道路建設工事	工事名 平成23年度 23号蒲郡BP芦谷東道路建設工事	工事名 平成23年度 23号蒲郡BP柏原西道路建設工事	工事名 平成23年度 23号蒲郡BP柏原東道路建設工事
工期 平成24年3月30日～平成24年10月31日	工期 平成24年3月7日～平成24年10月30日	工期 平成23年8月11日～平成24年8月31日	工期 平成24年3月13日～平成24年10月31日	工期 平成24年3月28日～平成24年10月31日 平成25年2月28日
施工業者 ㈱近藤組 TEL 0564-64-2462、FAX 0564-64-2463	施工業者 ㈱近藤組 TEL 0564-64-2462、FAX 0564-64-2463	施工業者 朝日工業(株) TEL 0564-62-1556、FAX 0564-62-8438	施工業者 中部土木(株) TEL 0533-95-4100、FAX 0533-95-4101	施工業者 長坂建設興業(株) TEL 0533-65-9385、FAX 0533-65-9386
7月末時点進捗率 22%	7月末時点進捗率 35%	7月末時点進捗率 92%	7月末時点進捗率 22%	7月末時点進捗率 10%
9月作業内容 掘削工、残土処理工	9月作業内容 掘削工、残土処理工、重力式擁壁工、補強土壁工	9月作業内容 工事完成	9月作業内容 補強土壁工、路体盛土、排水工	9月作業内容 補強土壁工、排水構造物工
幸田芦谷ICを望む	名古屋側より豊橋側を望む	幸田芦谷ICを望む	豊橋側より名古屋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む

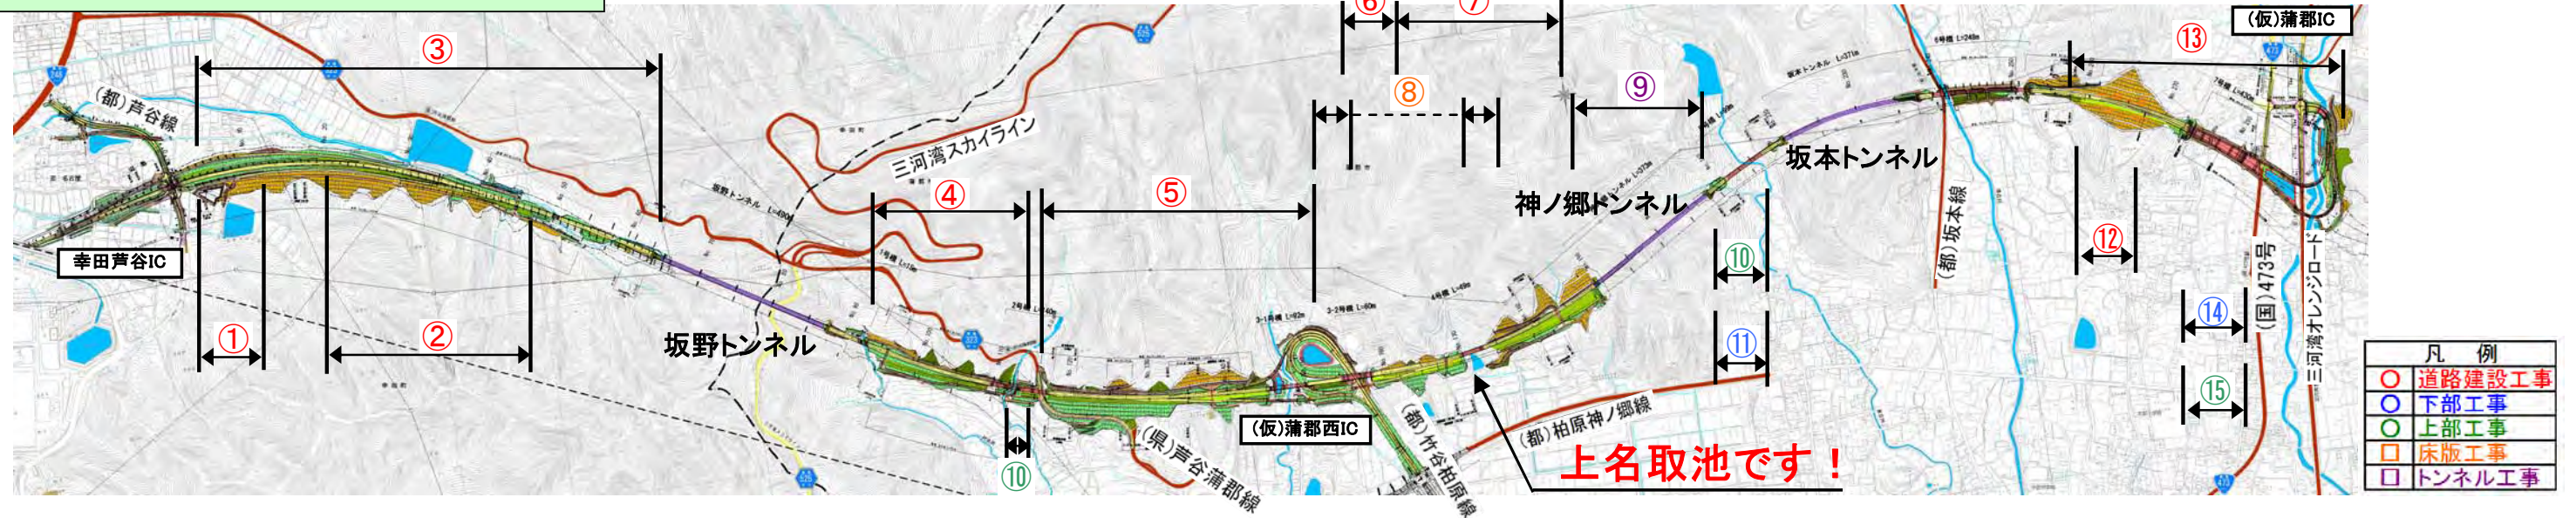⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
工事名 平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡西IC道路建設工事	工事名 平成23年度 23号蒲郡BP上名取西地区道路建設工事	工事名 平成23年度 23号蒲郡BP上名取橋床版工事	工事名 平成21年度 23号蒲郡BP神ノ郷トンネル工事	工事名 平成23年度 23号蒲郡BP神ノ郷高架橋PC上部工事
工期 平成23年11月18日～平成24年11月30日	工期 平成23年9月17日～平成24年12月20日	工期 平成23年9月16日～平成24年11月22日	工期 平成22年3月11日～平成24年10月3日	工期 平成24年2月25日～平成25年2月28日
施工業者 TSUCHIYA(株) TEL 0533-69-5113、FAX 0533-69-5113	施工業者 鈴中工業(株) TEL 0533-69-3663、FAX 0533-65-9520	施工業者 神野建設(株) TEL 0533-67-1622、FAX 0533-67-1644	施工業者 ㈱フジタ TEL 0533-66-0950、FAX 0533-67-1320	施工業者 ㈱安部日鋼工業 TEL 0533-69-1464、FAX 0533-69-1465
7月末時点進捗率 49%	7月末時点進捗率 66%	7月末時点進捗率 85%	7月末時点進捗率 99%	7月末時点進捗率 11%
9月作業内容 盛土工、排水工	9月作業内容 道路土工、擁壁工、法面工	9月作業内容 石ブロック積工	9月作業内容 付帯工、排水工 他	9月作業内容 橋面工
(仮)蒲郡西ICを望む	豊橋側より名古屋側を望む	(仮)蒲郡西ICランプ橋を望む	神ノ郷トンネル豊橋側を望む	柏原側道橋を望む

神ノ郷トンネル東側～蒲郡IC区間



⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
工事名 平成23年度 23号蒲郡BP神ノ郷高架橋下部工事	工事名 平成23年度 23号蒲郡BP清田道路建設工事	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP清田東建設工事	工事名 平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡IC橋下部工事	工事名 平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡IC鋼上部工事
工期 平成23年9月23日～平成25年2月22日	工期 平成23年10月21日～平成24年12月20日	工期 平成24年7月27日～平成25年3月25日	工期 平成24年2月3日～平成24年12月28日	工期 平成24年3月1日～平成25年3月18日
施工業者 ㈱ピーエス三菱 TEL 0533-66-3570、FAX 0533-66-3580	施工業者 吉川建設㈱ TEL 0533-69-8060、FAX 0533-69-8052	施工業者 (株)ヒメノ	施工業者 ㈱新井組 TEL 0533-95-4621、FAX 0533-95-4622	施工業者 ㈱横河ブリッジ TEL 06-6479-8588、TEL 06-6441-7527
7月末時点進捗率 54%	7月末時点進捗率 57%	7月末時点進捗率 0%	7月末時点進捗率 38%	7月末時点進捗率 48%
9月作業内容 橋脚工、橋台工、構造物撤去工	9月作業内容 掘削工、残土処理工	9月作業内容 準備工	9月作業内容 場所打杭工、床掘工(土留・仮締切工)	9月作業内容 工場製作中
		準備中		
坂本トンネルより名古屋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む		名古屋側より豊橋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む:着手前(工場製作中)

新規工事です!

編集長からひと言



平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に対しまして、格別のご理解ご協力を賜り心よりお礼申し上げます。

私の担当は、床版工事と言って、鉄の橋の上に車が通る事が出来るようにコンクリートの道路を作る工事です。上名取池に架かる本線橋と、(仮)蒲郡西ICの名古屋方面からのOFFランプ橋の2橋の施工を行いました。現在は、(仮)蒲郡西IC付近にて法面の保護を行う大型ブロックの施工を行っています。ブロック1個の重量が2,600kgもあるので、大型のクレーンにより安全・丁寧に据付作業をしています。先日、地元の方に「ようやくクレーンが動き出したなあ。」と声を掛けられました。話をしていると、「以前から頻りに現場を見ている。」とのこと、この『蒲郡バイパス』を地元の方が期待していると感じ、工事に関係する者として身の引き締まる思いをしました。

各地区共に工事は佳境に入って、工事関係車両の搬入出も多くなってきます。安全には十分注意して参りますので、引き続きご理解ご協力のほど、宜しくお願い致します。

平成23年度 23号蒲郡BP上名取橋床版工事 現場代理人 石黒 誠

大型ブロック施工状況

