


沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。

# 蒲郡バイパス 工事便り

幸田芦谷IC～神ノ郷トンネル西側区間

発行 第7号  
平成24年12月1日


蒲郡バイパス支部工事安全協議会  
編集長: 中部土木(株) 横山 耕一  
TEL 0533-95-4100、FAX 0533-95-4101  
監修: 名四国道蒲郡建設監督官詰所  
TEL 0533-67-0286、FAX 0533-67-0287

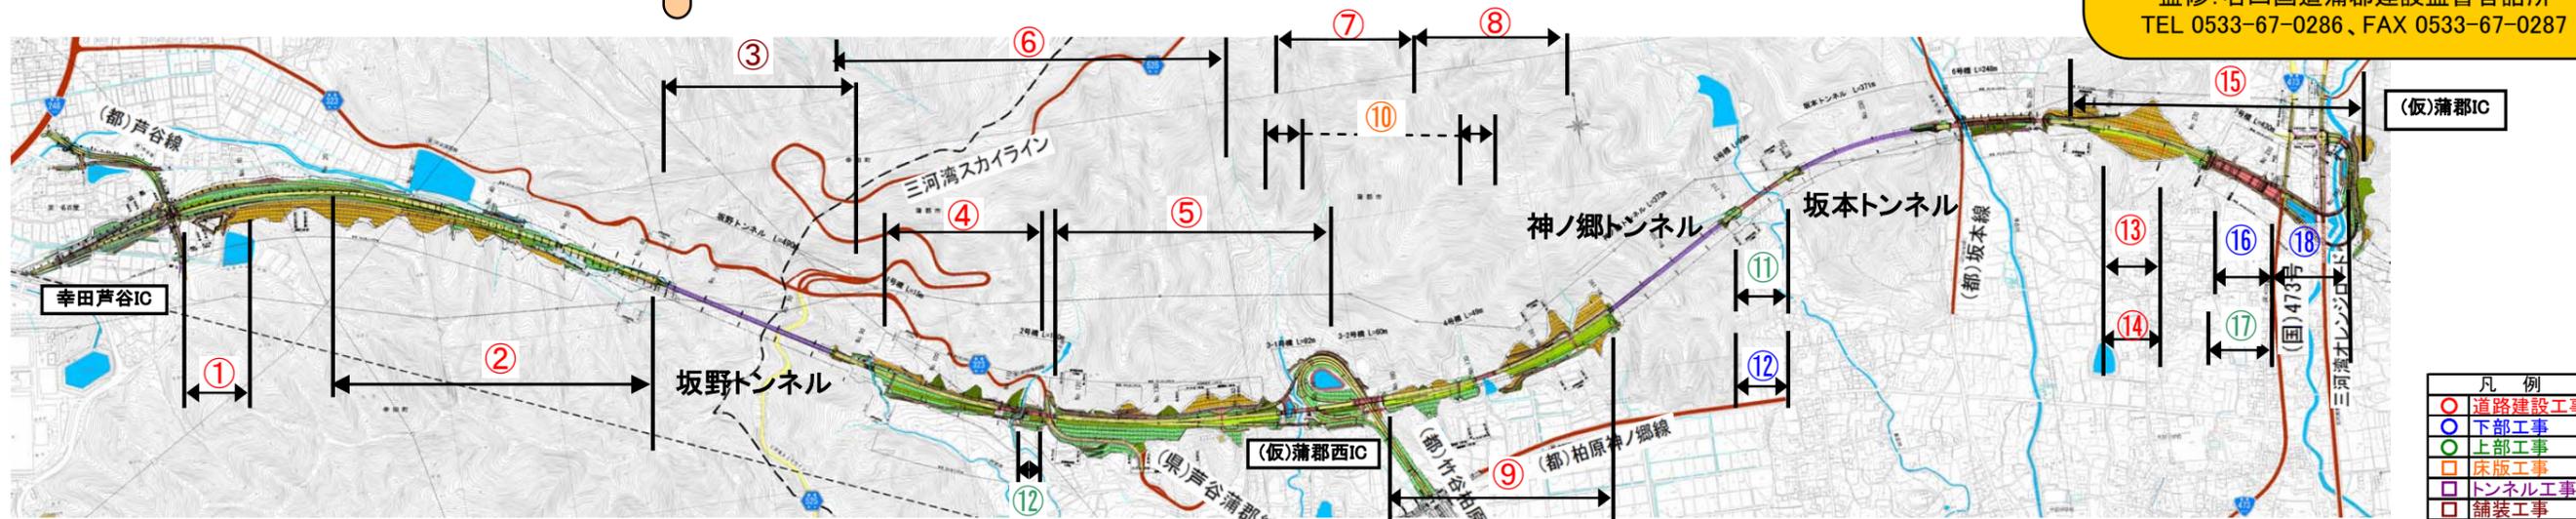

<p>①</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP幸田芦谷IC道路建設工事</p> <p>工期 平成24年3月30日～平成25年1月31日</p> <p>施工業者 ㈱近藤組 TEL 0564-64-2462、FAX 0564-64-2463</p> <p>10月末時点進捗率 <b>58%</b></p> <p>11月作業内容 伐採工、掘削工、残土運搬工、排水工</p> <p>幸田芦谷ICより豊橋側を望む</p>	<p>②</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP芦谷西道路建設工事</p> <p>工期 平成24年3月7日～平成25年1月31日</p> <p>施工業者 ㈱近藤組 TEL 0564-64-2462、FAX 0564-64-2463</p> <p>10月末時点進捗率 <b>83%</b></p> <p>11月作業内容 掘削工、残土運搬工、路体盛土工、排水処理工</p> <p>芦谷地区の切土を望む</p>	<p>③</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP坂野トンネル舗装工事</p> <p>工期 平成24年9月25日～平成25年3月22日</p> <p>施工業者 世紀東急工業(株) TEL 0564-64-2697、FAX 0564-64-2698</p> <p>10月末時点進捗率 <b>0%</b></p> <p>11月作業内容 準備工</p> <p>坂野トンネル名古屋側を望む:着手前</p>	<p>④</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP柏原西道路建設工事</p> <p>工期 平成24年3月13日～平成25年1月31日</p> <p>施工業者 中部土木(株) TEL 0533-95-4100、FAX 0533-95-4101</p> <p>10月末時点進捗率 <b>80%</b></p> <p>11月作業内容 路床盛土工、排水処理工、橋面舗装工、電気室</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑤</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP柏原東道路建設工事</p> <p>工期 平成24年3月28日～平成25年2月28日</p> <p>施工業者 長坂建設興業(株) TEL 0533-65-9385、FAX 0533-65-9386</p> <p>10月末時点進捗率 <b>28%</b></p> <p>11月作業内容 調整池工、擁壁工、踏掛版工</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>
--	--	---	--	--

<p>⑥</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP柏原東道路建設工事</p> <p>工期 平成24年9月22日～平成25年3月15日</p> <p>施工業者 鈴中工業(株) TEL 0533-69-3663、FAX 0533-65-9520</p> <p>10月末時点進捗率 <b>0%</b></p> <p>11月作業内容 伐採工、盛土工</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む:着手前</p>	<p>⑦</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡西IC道路建設工事</p> <p>工期 平成23年11月18日～平成25年3月25日</p> <p>施工業者 TSUCHIYA(株) TEL 0533-69-5113、FAX 0533-69-5113</p> <p>11月末時点進捗率 <b>70%</b></p> <p>11月作業内容 盛土工、排水工、擁壁工</p> <p>(仮)蒲郡西ICを望む</p>	<p>⑧</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP上名取西地区道路建設工事</p> <p>工期 平成23年9月17日～平成24年12月20日</p> <p>施工業者 鈴中工業(株) TEL 0533-69-3663、FAX 0533-65-9520</p> <p>10月末時点進捗率 <b>100%</b></p> <p>11月作業内容 片付け工</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑨</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP上名取西道路建設工事</p> <p>工期 平成24年9月7日～平成25年3月15日</p> <p>施工業者 黒柳建設(株) TEL 0533-68-9611、FAX 0533-68-9612</p> <p>10月末時点進捗率 <b>3%</b></p> <p>11月作業内容 準備工</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む:着手前</p>	<p>⑩</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP上名取橋床版工事</p> <p>工期 平成23年9月16日～平成24年11月22日</p> <p>施工業者 神野建設(株) TEL 0533-67-1622、FAX 0533-67-1644</p> <p>10月末時点進捗率 <b>98%</b></p> <p>11月作業内容 踏掛板工、情報管路工</p> <p>(仮)蒲郡西ICランプ橋を望む</p>
---	--	--	---	--

神ノ郷トンネル西側～蒲郡IC区間

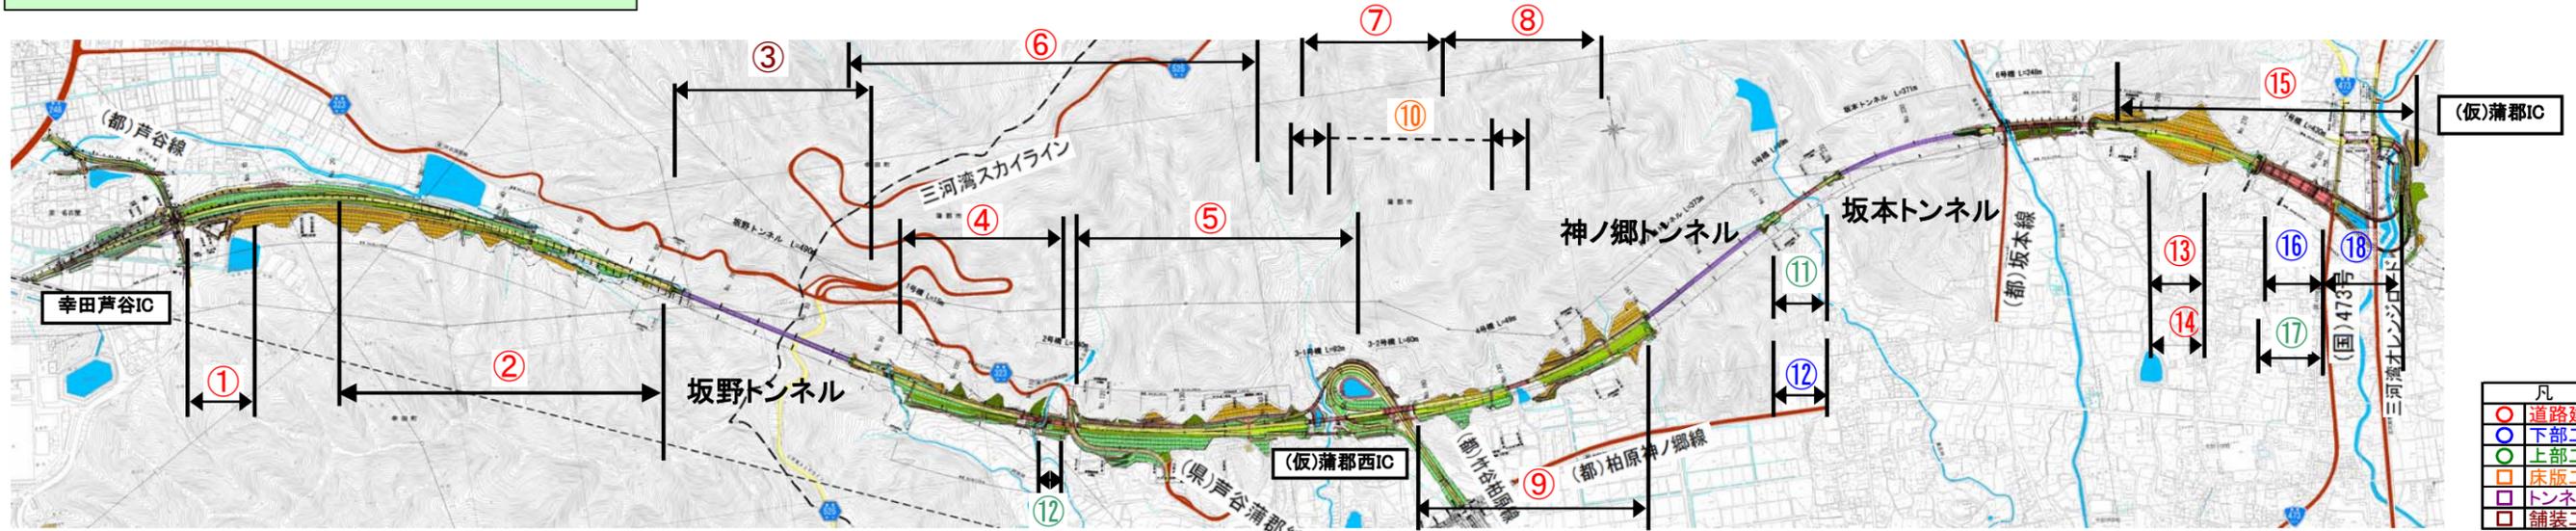

⑪

工事名	平成23年度 23号蒲郡BP神ノ郷高架橋PC上部工事
工期	平成24年2月25日～平成25年2月28日
施工業者	㈱安部日鋼工業 TEL 0533-69-1464、FAX 0533-69-1465
10月末時点進捗率	23%
11月作業内容	工場製作中(神ノ郷高架橋上部工)
豊橋側より名古屋側を望む:着手前(工場製作中)	

⑫

工事名	平成23年度 23号蒲郡BP神ノ郷高架橋下部工事
工期	平成23年9月23日～平成25年2月22日
施工業者	㈱ピーエス三菱 TEL 0533-66-3570、FAX 0533-66-3580
10月末時点進捗率	75%
11月作業内容	橋台工、擁壁工
坂本トンネルより名古屋側を望む	

⑬

工事名	平成24年度 23号蒲郡BP清田道路建設工事
工期	平成24年11月9日～平成25年12月3日
施工業者	TSUCHIYA㈱ TEL 0533-68-7776、FAX 0533-68-7776
10月末時点進捗率	0%
11月作業内容	準備工
名古屋側より豊橋側を望む	

⑭

工事名	平成23年度 23号蒲郡BP清田道路建設工事
工期	平成23年10月21日～平成24年12月20日
施工業者	吉川建設㈱ TEL 0533-69-8060、FAX 0533-69-8052
10月末時点進捗率	83%
11月作業内容	掘削工、残土運搬工、工事用道路工
名古屋側より豊橋側を望む	

⑮

工事名	平成24年度 23号蒲郡BP清田東道路建設工事
工期	平成24年7月27日～平成25年3月25日
施工業者	(株)ヒメノ TEL0533-68-5502、FAX0533-68-5508
10月末時点進捗率	9%
11月作業内容	伐採工、排水処理工
(仮)蒲郡ICランプ部を望む	

新規工事です！

⑯

工事名	平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡IC橋下部工事
工期	平成24年2月3日～平成24年12月28日
施工業者	㈱新井組 TEL 0533-95-4621、FAX 0533-95-4622
10月末時点進捗率	77%
11月作業内容	橋脚躯体工
名古屋側より豊橋側を望む	

⑰

工事名	平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡IC鋼上部工事
工期	平成24年3月1日～平成25年3月18日
施工業者	㈱横河ブリッジ TEL 06-6479-8588、TEL 06-6441-7527
10月末時点進捗率	68%
11月作業内容	工場製作中
豊橋側より名古屋側を望む:着手前(工場製作中)	

⑱

工事名	平成24年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ下部工事
工期	平成24年9月14日～平成25年3月22日
施工業者	朝日工業㈱ TEL 0533-95-4305、FAX 0533-95-4306
10月末時点進捗率	5%
11月作業内容	仮設矢板工
豊橋側より名古屋側を望む	

編集長からひと言



平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に対しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り心よりお礼申し上げます。  
夏休みの現場見学会には多数のご参加頂き、好評で終わることが出来有り難うございました。この場をお借りして御礼申し上げます。  
工事に携わってからミカンの育つ様子を日々観察させて頂いております。随分昔にミカン狩りをした記憶も微かであり、こんなに近くで毎日見れることや地域の皆様方との御縁も蒲郡BPの担当でなければ経験出来ないことであり大切にしていきたいと思っております。  
季節も随分肌寒くなり、冬に向かいミカンもそろそろ収穫の時期を迎えます。地元の皆様方には御協力の中ご迷惑をお掛けすることもあると思いますが、よろしくお願い致します。  
ミカンと同じ色のオレンジ色のプレートを掲げた車両で、お気付きの点があればお気軽にお申し付けください。  
今後とも、スタッフ一同宜しくお願い致します。



現場付近のミカン畑と中部土木(株)スタッフ

平成23年度 23号蒲郡BP柏原西道路建設工事  
現場代理人 横山 耕一
