


沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。

蒲郡バイパス 工事便り

発行 第15号
平成25年8月1日

蒲郡バイパス支部工事安全協議会
編集長: (株)TSUCHIYA 長縄 勝則
TEL0533-68-7776、FAX0533-68-7776

監修: 名四国道事務所豊川分室
(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974

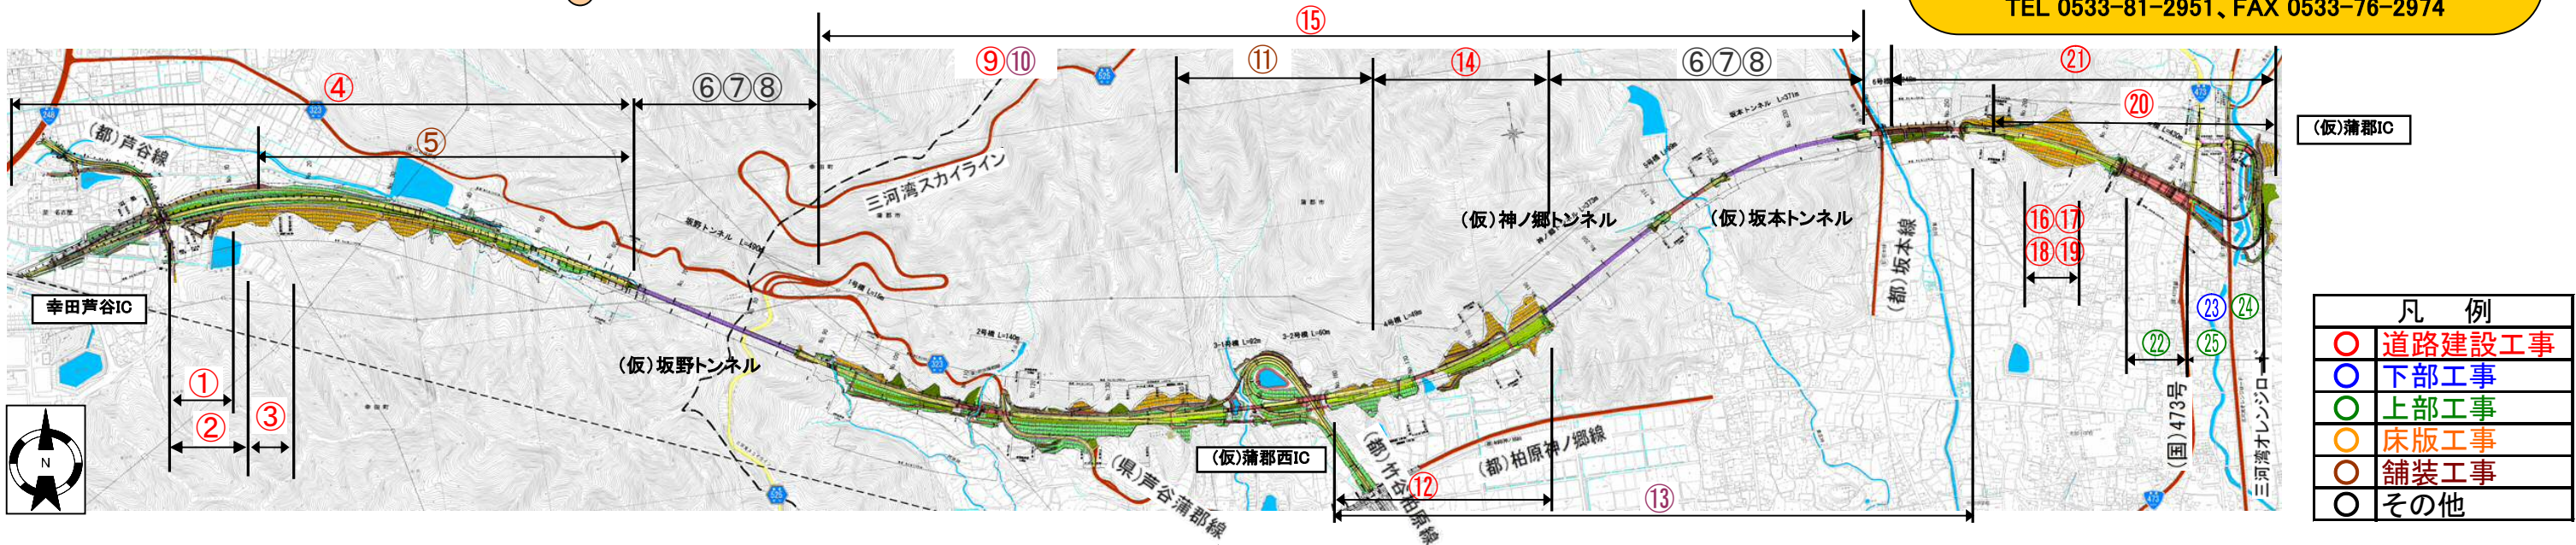

①	工 事 名 平成23年度 23号蒲郡BP幸田芦谷IC道路建設工事 工 期 平成24年3月30日～平成25年8月19日 施 工 業 者 ㈱近藤組 TEL 0564-64-2462、FAX 0564-64-2463 6月末時点 進捗率 92% 7月作業内容 大型ブロック、小型擁壁、防護柵 	②	工 事 名 平成24年度 23号蒲郡BP芦谷道路建設工事 工 期 平成25年2月9日～平成26年1月31日 3月20日 施 工 業 者 若葉建設㈱ TEL 0533-68-7488、FAX 0533-68-7499 6月末時点 進捗率 15% 7月作業内容 重力式擁壁、防火ブロック、切土補強土工 	③	工 事 名 平成24年度 23号蒲郡BP芦谷西道路建設工事 工 期 平成25年3月19日～平成25年11月29日 施 工 業 者 ㈱ヒメノ TEL 0564-62-6918、FAX 0533-62-6919 6月末時点 進捗率 9% 7月作業内容 掘削・残土運搬、重力式擁壁 	④	工 事 名 平成25年度 23号蒲郡BP芦谷地区道路建設工事 工 期 平成25年5月24日～平成26年3月27日 施 工 業 者 朝日工業㈱ TEL 0564-64-0526、FAX 0564-64-0527 6月末時点 進捗率 0% 7月作業内容 重力式擁壁、補強土壁 	⑤	工 事 名 平成25年度 23号蒲郡BP芦谷東舗装工事 工 期 平成25年5月1日～平成26年3月27日 施 工 業 者 鹿島道路㈱ TEL 0564-64-4551、FAX 0564-64-4552 6月末時点 進捗率 0% 7月作業内容 標識基礎 	⑥	工 事 名 平成24年度 23号蒲郡BPTンネル受変電設備工事 工 期 平成25年3月9日～平成26年3月20日 施 工 業 者 ㈱柿本商会 TEL 076-268-2111、FAX 076-268-2944 6月末時点 進捗率 0% 7月作業内容 準備中 
---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--

⑦	工 事 名 平成25年度 23号蒲郡BPTンネル照明設備工事 工 期 平成25年5月25日～平成26年3月20日 施 工 業 者 白川電気土木㈱ TEL 052-882-1285、FAX052-872-1074 6月末時点 進捗率 0% 7月作業内容 準備中 	⑧	工 事 名 平成25年度 23号蒲郡BPTンネル防災設備工事 工 期 平成25年6月6日～平成26年3月20日 施 工 業 者 インデンエンジニアリング㈱ TEL 0573-25-6600、FAX 0573-25-6601 6月末時点 進捗率 0% 7月作業内容 準備中 	⑨	工 事 名 平成24年度 23号蒲郡BP柏原道路建設工事 工 期 平成24年9月22日～平成25年7月31日 施 工 業 者 鈴中工業㈱ TEL 0533-69-3663、FAX 0533-65-9520 6月末時点 進捗率 98% 7月作業内容 重力式擁壁、路体盛土 	⑩	工 事 名 平成25年度 23号蒲郡BP柏原地区舗装工事 工 期 平成25年4月24日～平成26年3月27日 施 工 業 者 日本道路㈱ TEL 0533-65-7503、FAX 0533-65-7504 6月末時点 進捗率 2% 7月作業内容 排水構造物、情報ボックス 	⑪	工 事 名 平成25年度 23号蒲郡BP西IC舗装工事 工 期 平成25年5月1日～平成26年3月27日 施 工 業 者 ㈱ガイアート・K TEL 0533-56-9740、FAX 0533-56-9741 6月末時点 進捗率 0% 7月作業内容 下層路盤、縁石 	⑫	工 事 名 平成24年度 23号蒲郡BP上名古屋西道路建設工事 工 期 平成24年9月7日～平成25年7月31日 施 工 業 者 黒柳建設㈱ TEL 0533-68-9611、FAX 0533-68-9612 6月末時点 進捗率 92% 7月作業内容 種子散布 
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--

⑬

工 事 名	平成25年度 23号蒲郡BP上名取地区舗装工事
工 期	平成25年7月3日～平成26年3月27日
施 工 業 者	中部土木㈱ TEL 052-721-5511、FAX 052-721-3606
6月末時点 進捗率	0%
7月作業内容	準備中
	
名古屋側より豊橋側を望む	

新規工事です！

⑭

工 事 名	平成24年度 23号蒲郡BP上名取東道路建設工事
工 期	平成25年1月29日～平成26年1月31日
施 工 業 者	矢作建設工業㈱ TEL 0533-56-9567、FAX 0533-56-9568
6月末時点 進捗率	13%
7月作業内容	掘削・補強土壁
	
豊橋側より名古屋側を望む	

⑮

工 事 名	平成25年度 23号蒲郡BP神ノ郷地区道路建設工事
工 期	平成25年6月22日～平成26年3月27日
施 工 業 者	関興業㈱ TEL 0533-65-8837、FAX 0533-65-8847
6月末時点 進捗率	0%
7月作業内容	準備中
	
豊橋側より名古屋側を望む	

新規工事です！

⑯

工 事 名	平成24年度 23号蒲郡BP清田道路建設工事
工 期	平成24年11月9日～平成25年12月3日
施 工 業 者	TSUCHIYA㈱ TEL 0533-68-7776、FAX 0533-68-7776
6月末時点 進捗率	98%
7月作業内容	道路付属施設
	
名古屋側より豊橋側を望む	

⑰

工 事 名	平成24年度 23号蒲郡BP清田西地区道路建設工事
工 期	平成25年3月12日～平成25年9月30日
施 工 業 者	㈱ヒメノ TEL 0533-68-5502、FAX 0533-68-5508
6月末時点 進捗率	21%
7月作業内容	掘削・残土運搬
	
工事箇所より北側を望む	

⑱

工 事 名	平成25年度 23号蒲郡BP清田西地区道路建設工事
工 期	平成25年6月14日～平成26年1月20日
施 工 業 者	大和小田急建設㈱ TEL 0533-56-9023、FAX 0533-56-9025
6月末時点 進捗率	0%
7月作業内容	準備中
	
工事箇所から南側を望む	

⑲

工 事 名	平成25年度 23号蒲郡BP清田東地区道路建設工事
工 期	平成25年6月15日～平成26年1月20日
施 工 業 者	若築建設㈱ TEL 0533-67-9227、FAX 0533-67-9228
6月末時点 進捗率	0%
7月作業内容	準備中
	
豊橋側より名古屋側を望む	

⑳

工 事 名	平成24年度 23号蒲郡BP清田東道路建設工事
工 期	平成24年7月27日～平成25年7月16日 9月30日
施 工 業 者	㈱ヒメノ TEL 0533-68-5502、FAX 0533-68-5508
6月末時点 進捗率	92%
7月作業内容	橋台工
	
豊橋側より名古屋側を望む	

㉑

工 事 名	平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC道路建設工事
工 期	平成25年5月23日～平成26年3月27日
施 工 業 者	長坂建設興業㈱ TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591
6月末時点 進捗率	0%
7月作業内容	準備中
	
豊橋側より名古屋側を望む	

㉒

工 事 名	平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡IC鋼上部工事
工 期	平成24年3月1日～平成25年8月19日
施 工 業 者	㈱横河ブリッジ TEL 0533-75-6004、FAX 0533-75-6009
6月末時点 進捗率	97%
7月作業内容	床版工
	
名古屋側より豊橋側を望む	

㉓

工 事 名	平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC下部工事
工 期	平成25年6月7日～平成26年3月27日
施 工 業 者	山旺建設㈱ TEL 0563-56-3191、FAX 0563-54-0903
6月末時点 進捗率	0%
7月作業内容	準備中
	
名古屋側より豊橋側を望む	

㉔

工 事 名	平成24年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋鋼上部工事
工 期	平成25年1月10日～平成25年11月22日
施 工 業 者	瀧上工業㈱ TEL 0533-56-9613、FAX 0533-56-9623
6月末時点 進捗率	79%
7月作業内容	桁架設
	
豊橋側より名古屋側を望む	

㉕

工 事 名	平成24年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋PC上部工事
工 期	平成25年3月12日～平成25年12月20日
施 工 業 者	川田建設㈱ TEL 052-222-3310、FAX 052-222-3315
6月末時点 進捗率	0%
7月作業内容	準備中
	
豊橋側より(仮)蒲郡ICランプ部を望む	

編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に対しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

私どもの工事は、坂本清田地区におきまして、(仮称)蒲郡ICの西側でバイパス本線をつくるために山を掘削する工事です。昨年の12月中旬から伐採に着手し、1月から掘削を開始し半分程度高さまで掘削しました。山の形も昨年から、大きく変わりオレンジロード側からのバイパス道路の形が少し見えてきました。4月からは、火薬を使用しない破碎掘削を行い近隣の方々には、ご理解とご協力を頂き順調に工事を進めることが出来ました。当工事は、ほぼ完了しましたが、(仮称)蒲郡ICから幸田芦谷IC間の工事は、最盛期を迎えており、今後も安全最優先で進めます。

掘削中は、工事車輛の通行が多くなり、地域の皆様方には、大変ご迷惑をお掛けしたこともあったかと思いますが、今後も、引き続きご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。

平成24年度蒲郡BP清田道路建設工事 TSUCHIYA㈱ 現場代理人 長縄 勝則

