


沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。

# 蒲郡バイパス 工事便り

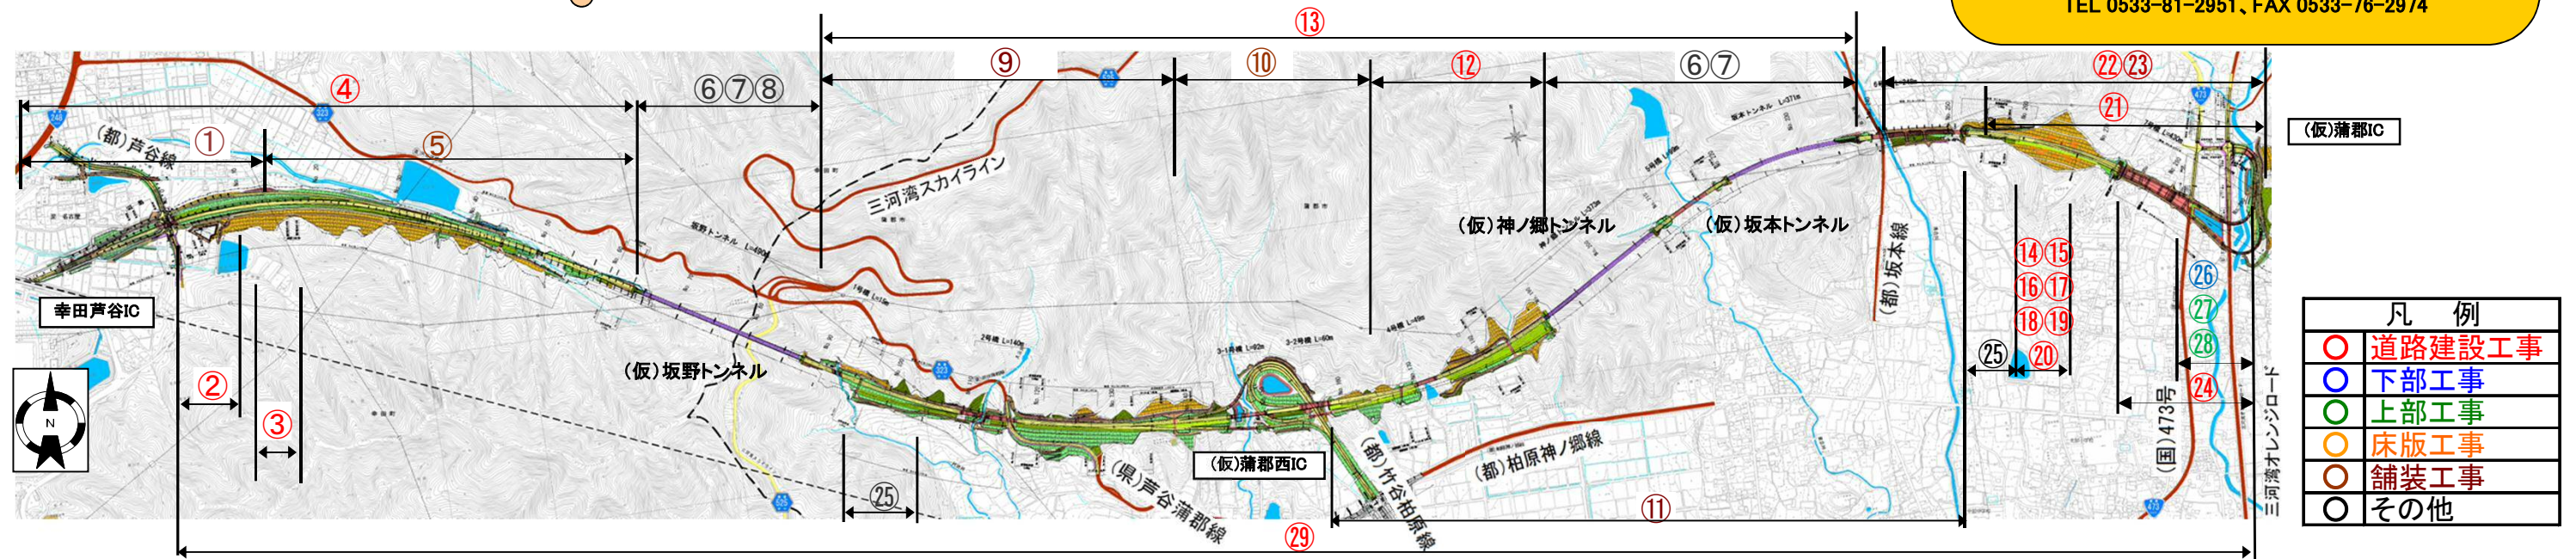

①	②	③	④	⑤	⑥
工事名 平成25年度 23号蒲郡BP芦谷西舗装工事 工期 平成25年8月16日～平成26年3月27日 施工業者 大林道路 株式会社 TEL 0564-83-5920、FAX 0564-83-5935 9月末時点進捗率 0% 10月作業内容 準備中	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP芦谷道路建設工事 工期 平成25年2月9日～平成26年3月20日 施工業者 若築建設 株式会社 TEL 0533-68-7488、FAX 0533-68-7499 9月末時点進捗率 46% 10月作業内容 掘削・残土運搬、鉄筋挿入、アンカー	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP芦谷西道路建設工事 工期 平成25年3月19日～平成25年11月29日 施工業者 株式会社ヒメノ TEL 0564-62-6918、FAX 0533-62-6919 9月末時点進捗率 53% 10月作業内容 掘削・残土運搬、防火ブロック	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP芦谷地区道路建設工事 工期 平成25年5月24日～平成26年3月27日 施工業者 朝日工業 株式会社 TEL 0564-64-0526、FAX 0564-64-0527 9月末時点進捗率 36% 10月作業内容 路床盛土、鉄筋挿入、補強土壁	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP芦谷東舗装工事 工期 平成25年5月1日～平成26年3月27日 施工業者 鹿島道路 株式会社 TEL 0564-64-4551、FAX 0564-64-4552 9月末時点進捗率 8% 10月作業内容 排水構造物、下層路盤	工事名 平成24年度 23号蒲郡BPトンネル受変電設備工事 工期 平成25年3月9日～平成26年3月20日 施工業者 株式会社榑本商会 TEL 076-268-2111、FAX 076-268-2944 9月末時点進捗率 1% 10月作業内容 機器制作
名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	(仮)坂野トンネル電気室を望む

⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
工事名 平成25年度 23号蒲郡BPトンネル照明設備工事 工期 平成25年5月25日～平成26年3月20日 施工業者 白川電気土木 株式会社 TEL 0533-56-9696、FAX 0533-56-9696 9月末時点進捗率 5% 10月作業内容 機器制作	工事名 平成25年度 23号蒲郡BPトンネル防災設備工事 工期 平成25年6月6日～平成26年3月20日 施工業者 イシデンエンジニアリング 株式会社 TEL 0573-25-6600、FAX 0573-25-6601 9月末時点進捗率 5% 10月作業内容 機器制作	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP柏原地区舗装工事 工期 平成25年4月24日～平成26年3月27日 施工業者 日本道路 株式会社 TEL 0533-65-7503、FAX 0533-65-7504 9月末時点進捗率 11% 10月作業内容 排水構造物、情報ボックス、下層路盤	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡西IC舗装工事 工期 平成25年5月1日～平成26年3月27日 施工業者 株式会社ガイアート・K TEL 0533-56-9740、FAX 0533-56-9741 9月末時点進捗率 16% 10月作業内容 路肩盛土、排水構造物、上層路盤	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP上名取地区舗装工事 工期 平成25年7月3日～平成26年3月27日 施工業者 中部土木 株式会社 TEL 0533-65-8499、FAX 0533-65-8944 9月末時点進捗率 3% 10月作業内容 排水構造物、上層路盤	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP上名取東道路建設工事 工期 平成25年1月29日～平成26年1月31日 施工業者 矢作建設工業 株式会社 TEL 0533-56-9567、FAX 0533-56-9568 9月末時点進捗率 55% 10月作業内容 掘削、補強土壁、排水構造物
(仮)坂野トンネルより豊橋側を望む	名古屋側より(仮)坂野トンネルを望む	名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む

⑬	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP神ノ郷地区道路建設工事 工期 平成25年6月22日～平成26年3月27日 施工業者 関興業株式会社 TEL 0533-65-8837、FAX 0533-65-8847 9月末時点進捗率 9% 10月作業内容 橋台躯体、補強土壁、縁石工	⑭	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP清田西地区道路建設工事 工期 平成25年3月12日～平成25年9月30日 施工業者 株式会社ニメノ TEL 0533-68-5502、FAX 0533-68-5508 9月末時点進捗率 100% 10月作業内容 完成	⑮	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田西地区道路建設工事 工期 平成25年6月14日～平成26年1月20日 施工業者 大和小田急建設株式会社 TEL 0533-56-9023、FAX 0533-56-9025 9月末時点進捗率 10% 10月作業内容 掘削、残土運搬	⑯	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田東地区道路建設工事 工期 平成25年6月15日～平成26年1月20日 施工業者 若築建設株式会社 TEL 0533-67-9227、FAX 0533-67-9228 9月末時点進捗率 11% 10月作業内容 掘削、残土運搬	⑰	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田東道路建設工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 日鋪建設株式会社 TEL 052-205-7337、FAX 052-205-7338 9月末時点進捗率 0% 10月作業内容 準備中	⑱	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田西道路建設工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 株式会社近藤組 TEL 0533-56-9602、FAX 0533-56-9603 9月末時点進捗率 0% 10月作業内容 残土運搬
---	---	---	--	---	--	---	---	---	--	---	--

完成しました！

⑲	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田南地区道路建設工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 小原建設株式会社 TEL 0564-64-1607、FAX 0564-64-1608 9月末時点進捗率 0% 10月作業内容 残土運搬	⑳	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田北地区道路建設工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 中日建設株式会社 TEL 052-321-6501、FAX 052-321-6946 9月末時点進捗率 0% 10月作業内容 残土運搬	㉑	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP清田東道路建設工事 工期 平成24年7月27日～平成25年9月30日 施工業者 株式会社ニメノ TEL 0533-68-5502、FAX 0533-68-5508 9月末時点進捗率 100% 10月作業内容 完成	㉒	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC道路建設工事 工期 平成25年5月23日～平成26年3月27日 施工業者 長坂建設株式会社 TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591 9月末時点進捗率 33% 10月作業内容 調整地、補強土壁	㉓	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC舗装工事 工期 平成25年8月14日～平成26年3月27日 施工業者 株式会社佐藤渡辺 TEL 052-913-3266、FAX 052-913-3267 9月末時点進捗率 0% 10月作業内容 準備中	㉔	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP遮音壁設置工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 株式会社近藤組 TEL 0533-56-9602、FAX 0533-56-9603 9月末時点進捗率 0% 10月作業内容 準備中
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

完成しました！

㉕	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP道路情報表示設備工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月20日 施工業者 名古屋電機工業株式会社 TEL 052-443-0327、FAX 052-443-1218 9月末時点進捗率 2% 10月作業内容 準備中	㉖	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC下部工事 工期 平成25年6月7日～平成26年3月27日 施工業者 山旺建設株式会社 TEL 0533-56-9092、FAX 0533-56-9093 9月末時点進捗率 15% 10月作業内容 橋脚掘削	㉗	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋脚上部工事 工期 平成25年1月10日～平成25年11月22日 施工業者 瀬上工業株式会社 TEL 0533-56-9613、FAX 0533-56-9623 9月末時点進捗率 99% 10月作業内容 現場塗装、情報ボックス	㉘	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋PC上部工事 工期 平成25年3月12日～平成26年1月20日 施工業者 川田建設株式会社 TEL 0533-56-9237、FAX 0533-56-9238 9月末時点進捗率 7% 10月作業内容 床版	㉙	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC整備工事 工期 平成25年10月9日～平成26年3月27日 施工業者 木村建設株式会社 TEL 0566-41-1818、FAX 0566-41-4369 9月末時点進捗率 0% 10月作業内容 準備中
---	--	---	--	---	--	---	--	---	---



現場スタッフ



現場代理人

### 編集長から一言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に対しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

私どもの工事は、国道23号線岡崎バイパスの終点である幸田芦谷ICから蒲郡方面に向けての区間において山を切り開き道路を造成する工事を行っております。

今年の4月下旬工事に着手し、7月頃より法面を補強するアンカー工の施工を進めています。また、掘削した土砂はラグーナ蒲郡の用地へ運搬しており、現在までに10tダンプトラック6500台分を搬出しました。来月までに当社施工部分の掘削作業は完了する見込みとなっておりますが、引き続き安全運転に努めてまいります。

今後も引き続き、道路建設工事・舗装工事等の工事が本格的になり工事車両の出入りが多い状態が続きますが、安全最優先にて作業を行なっておりますので、引き続き、皆様のご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。

平成24年度 23号蒲郡BP芦谷道路建設工事 若築建設(株) 現場代理人 渡部 耕平
