


発行 第20号  
平成26年1月1日

蒲郡バイパス支所工事安全協議会  
編集長: 日本道路(株) 前田 紫帆  
TEL 0533-65-7503、FAX 0533-65-7504

監修: 名四国道事務所豊川分室  
(豊川建設監督官詰所)  
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974

沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。

# 蒲郡バイパス 工事便り

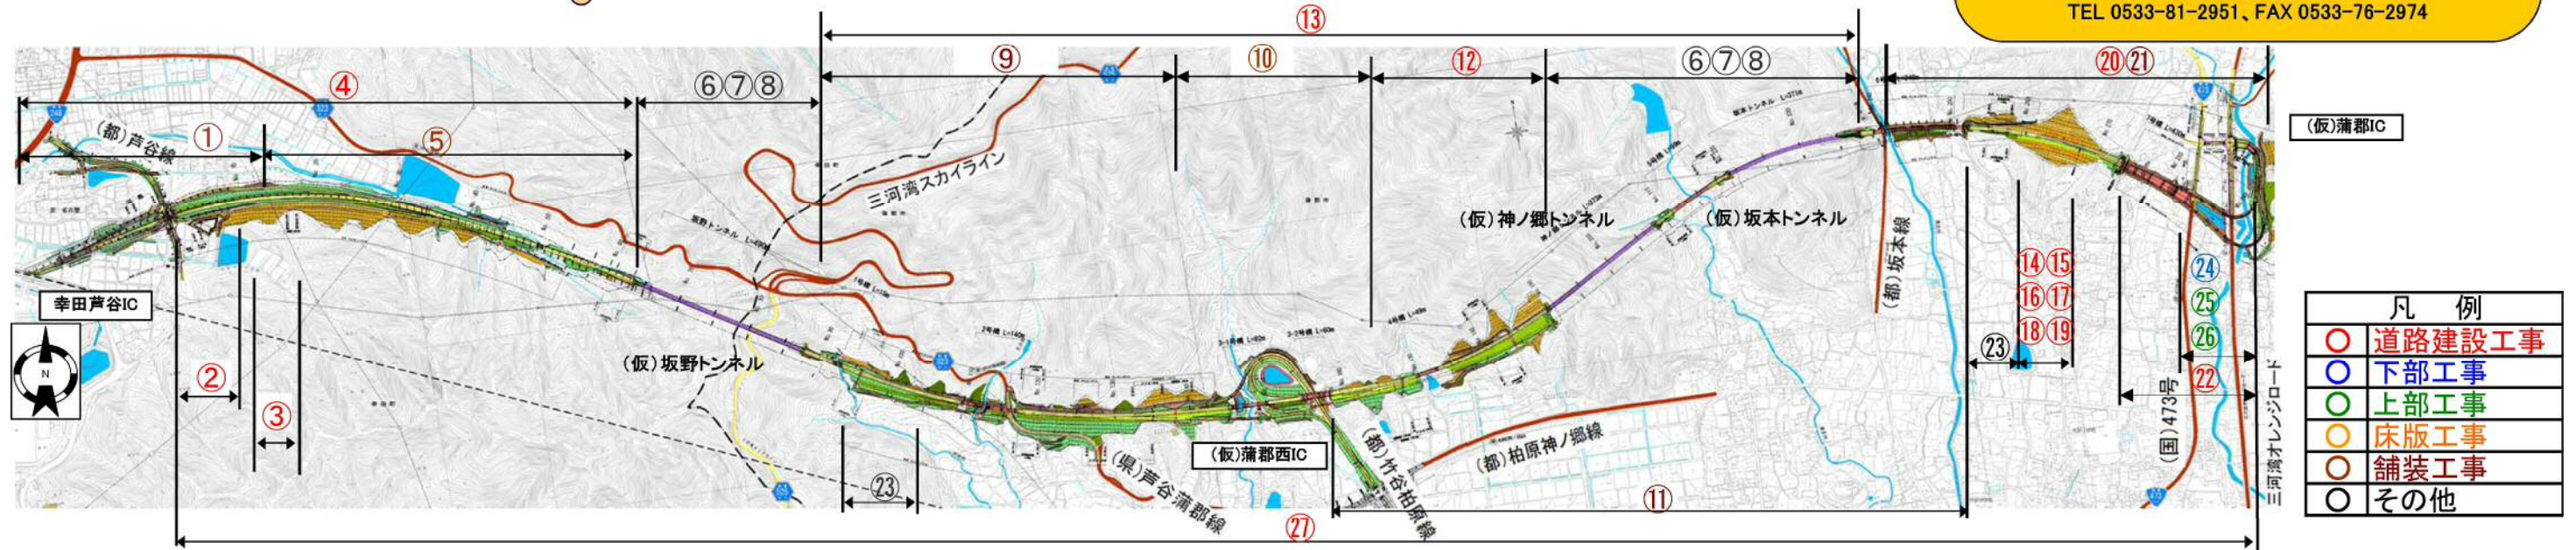




①	②	③	④	⑤	⑥
工事名 平成25年度 23号蒲郡BP芦谷西舗装工事 工期 平成25年8月16日～平成26年3月27日 施工業者 大林道路(株) TEL 0564-83-5920、FAX 0564-83-5935 11月末時点 進捗率 6% 12月作業内容 道路土工・路床安定処理	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP芦谷道路建設工事 工期 平成25年2月9日～平成26年3月20日 施工業者 若葉建設(株) TEL 0533-68-7488、FAX 0533-68-7499 11月末時点 進捗率 85% 12月作業内容 掘削・残土運搬	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP芦谷西道路建設工事 工期 平成25年3月19日～平成26年2月28日 施工業者 (株)ヒメノ TEL 0564-62-6918、FAX 0533-62-6919 11月末時点 進捗率 69% 12月作業内容 掘削・残土運搬、鉄筋挿入、擁壁	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP芦谷地区道路建設工事 工期 平成25年5月24日～平成26年3月27日 施工業者 朝日工業(株) TEL 0564-64-0526、FAX 0564-64-0527 11月末時点 進捗率 86% 12月作業内容 路床盛土、法枠、補強土壁	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP芦谷東舗装工事 工期 平成25年5月1日～平成26年3月27日 施工業者 鹿島道路(株) TEL 0564-64-4551、FAX 0564-64-4552 11月末時点 進捗率 27% 12月作業内容 側道部路盤・表層、本線ランプ部下層路盤、防護柵	工事名 平成24年度 23号蒲郡BPTンネル受変電設備工事 工期 平成25年3月9日～平成26年3月20日 施工業者 (株)柿本商会 TEL 076-268-2111、FAX 076-268-2944 11月末時点 進捗率 3% 12月作業内容 盤搬入・発電機据付、ケーブル配管
名古屋側より豊橋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	(仮)坂野トンネル電気室を望む

⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
工事名 平成25年度 23号蒲郡BPTンネル照明設備工事 工期 平成25年5月25日～平成26年3月20日 施工業者 白川電気土木(株) TEL 0533-56-9696、FAX 0533-56-9696 11月末時点 進捗率 36% 12月作業内容 機器作成、照明器具取付	工事名 平成25年度 23号蒲郡BPTンネル防災設備工事 工期 平成25年6月6日～平成26年3月20日 施工業者 イシデンエンジニアリング(株) TEL 052-509-1410、FAX 052-509-1412 11月末時点 進捗率 13% 12月作業内容 機器製作、ケーブル配管、R1号光ケーブル	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP柏原地区舗装工事 工期 平成25年4月24日～平成26年3月27日 施工業者 日本道路(株) TEL 0533-65-7503、FAX 0533-65-7504 11月末時点 進捗率 29% 12月作業内容 上層路盤、排水構造物、防護柵、照明	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡西IC舗装工事 工期 平成25年5月1日～平成26年3月27日 施工業者 (株)ガイアート・T・K TEL 0533-56-9740、FAX 0533-56-9741 11月末時点 進捗率 49% 12月作業内容 ランプ部基層、排水構造物、モルタル吹付、防護柵、照明	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP上名取地区舗装工事 工期 平成25年7月3日～平成26年3月27日 施工業者 中部土木(株) TEL 0533-65-8499、FAX 0533-65-8944 11月末時点 進捗率 27% 12月作業内容 本線部基層、コンクリート舗装、標識基礎、防護柵	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP上名取東道路建設工事 工期 平成25年1月29日～平成26年1月31日 施工業者 矢作建設工業(株) TEL 0533-56-9567、FAX 0533-56-9568 11月末時点 進捗率 81% 12月作業内容 掘削、大型ブロック、排水構造物
(仮)坂野トンネルより豊橋側を望む	名古屋側より(仮)坂野トンネルを望む	名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む



⑬	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP神ノ郷地区道路建設工事 工期 平成25年6月22日～平成26年3月27日 施工業者 関興業株式会社 TEL 0533-65-8837、FAX 0533-65-8847 11月末時点 進捗率 55% 12月作業内容 A1橋台、擁壁、残土運搬	⑭	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田西地区道路建設工事 工期 平成25年6月14日～平成26年1月20日 施工業者 大和小田建設株式会社 TEL 0533-56-9023、FAX 0533-56-9025 11月末時点 進捗率 69% 12月作業内容 掘削、残土運搬	⑮	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田東地区道路建設工事 工期 平成25年6月15日～平成26年1月20日 施工業者 若築建設株式会社 TEL 0533-67-9227、FAX 0533-67-9228 11月末時点 進捗率 75% 12月作業内容 掘削、残土運搬	⑯	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田東道路建設工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 日鋪建設株式会社 TEL 052-205-7337、FAX 052-205-7338 11月末時点 進捗率 2% 12月作業内容 路体盛土、踏掛版	⑰	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田西道路建設工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 磯近藤組株式会社 TEL 0533-56-9602、FAX 0533-56-9603 11月末時点 進捗率 28% 12月作業内容 掘削、残土運搬	⑱	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田南地区道路建設工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 小原建設株式会社 TEL 0564-64-1607、FAX 0564-64-1608 11月末時点 進捗率 36% 12月作業内容 残土運搬
											

⑲	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田北地区道路建設工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 中日建設株式会社 TEL 052-321-6501、FAX 052-321-6946 11月末時点 進捗率 38% 12月作業内容 残土運搬	⑳	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC道路建設工事 工期 平成25年5月23日～平成26年3月27日 施工業者 長坂建設株式会社 TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591 11月末時点 進捗率 61% 12月作業内容 床版、プレキャスト壁高欄、擁壁	㉑	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC舗装工事 工期 平成25年8月14日～平成26年3月27日 施工業者 磯佐藤波辺株式会社 TEL 0533-66-6112、FAX 0533-66-6115 11月末時点 進捗率 3% 12月作業内容 緑石、県道舗装	㉒	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP遮音壁設置工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 磯近藤組株式会社 TEL 0533-56-9602、FAX 0533-56-9603 11月末時点 進捗率 0% 12月作業内容 工場製作	㉓	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP道路情報表示設備工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月20日 施工業者 名古屋電機工業株式会社 TEL 052-443-0327、FAX 052-443-1218 11月末時点 進捗率 18% 12月作業内容 情報板基礎	㉔	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC下部工事 工期 平成25年6月7日～平成26年3月27日 施工業者 山旺建設株式会社 TEL 0533-56-9092、FAX 0533-56-9093 11月末時点 進捗率 49% 12月作業内容 杭頭処理、底版鉄筋、型枠
											

㉕	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋鋼上部工事 工期 平成25年1月10日～平成25年11月22日 施工業者 瀧上工業株式会社 TEL 0533-56-9613、FAX 0533-56-9623 11月末時点 進捗率 100% 12月作業内容	㉖	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋PC上部工事 工期 平成25年3月12日～平成26年1月20日 施工業者 川田建設株式会社 TEL 0533-56-9236、FAX 0533-56-9237 11月末時点 進捗率 89% 12月作業内容 足場解体、情報ボックス	㉗	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC整備工事 工期 平成25年10月9日～平成26年3月27日 施工業者 木村建設株式会社 TEL 0533-65-9582、FAX 0533-65-9583 11月末時点 進捗率 14% 12月作業内容 準備中
					

完成しました！



現場スタッフ



現場代理人

今後、工事最盛期となり工事車両の出入りが多い状態が続きますが、安全最優先にて作業を行ってまいりますので、皆様のご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。

### 編集長から一言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に対しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

12月の編集長になりました日本道路(株)現場代理人 前田です。宜しくお願い致します。私どもの工事は、坂野トンネル～(仮)蒲郡西インターに向けての舗装工事を行っています。今年の6月上旬に工事着手し、12月上旬までに約7000㎡のアスファルト舗装を行いました。

8月に豊田工業高等専門学校的女子学生がインターンシップ(就業体験)で当現場に来られ、女性の立場から感じる建設現場等の意見交換をすることができました。また9月には豊田工業高等専門学校の1年生、11月には日本ボーイスカウト三河葵地区 幸田3団の皆さんが現場見学をされました。情報化施工のグレーダーの説明・乗車体験をしたり、排水性舗装の実験を見ていただき、たくさんのかたに道路づくりや道路の仕組みについて学んでいただきました。

平成25年度 23号蒲郡BP柏原地区舗装工事 日本道路(株) 現場代理人 前田 紫帆

### ボーイスカウト見学会

