


発行 第22号  
平成26年3月1日

蒲郡バイパス支部工事安全協議会  
編集長：(株)ガイアート・K 伊藤 寿馬  
TEL 0533-56-9740、FAX 0533-56-9741

監修：名四国道事務所豊川分室  
(豊川建設監督官詰所)  
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974

沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。

# 蒲郡バイパス 工事便り

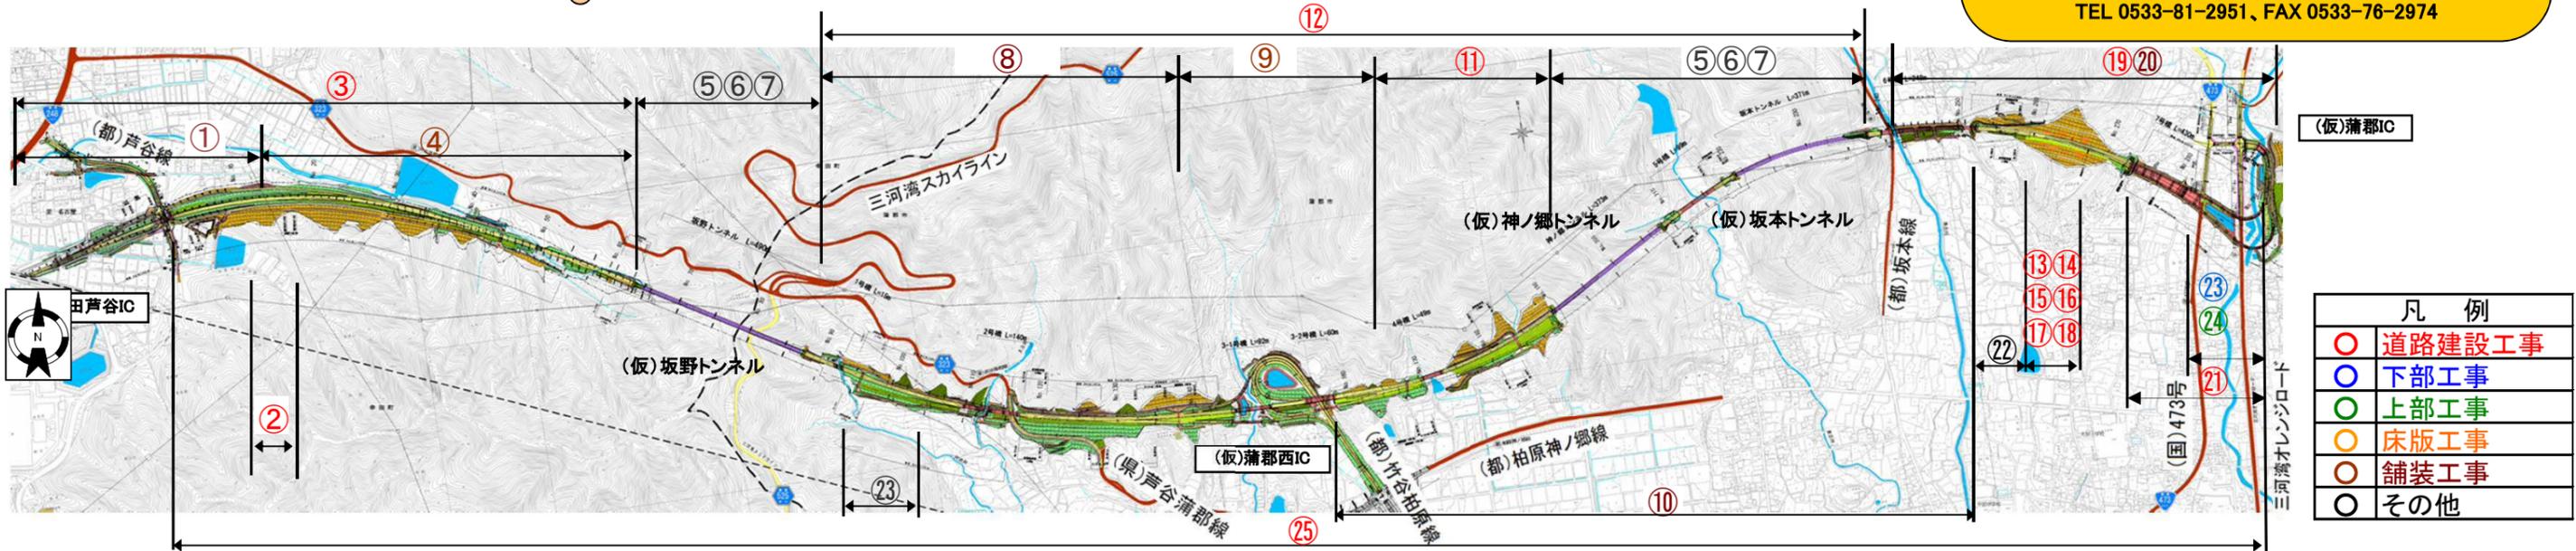

<p>①</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成25年度 23号蒲郡BP芦谷西舗装工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成25年8月16日～平成26年3月27日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>大林道路 ㈱ TEL 0564-83-5920、FAX 0564-83-5935</td></tr> <tr><td>1月末時点進捗率</td><td>31%</td></tr> <tr><td>2月作業内容</td><td>舗装、路床改良、排水構造物、照明配管</td></tr> <tr><td>写真</td><td></td></tr> <tr><td>写真説明</td><td>豊橋側より名古屋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成25年度 23号蒲郡BP芦谷西舗装工事	工期	平成25年8月16日～平成26年3月27日	施工業者	大林道路 ㈱ TEL 0564-83-5920、FAX 0564-83-5935	1月末時点進捗率	31%	2月作業内容	舗装、路床改良、排水構造物、照明配管	写真		写真説明	豊橋側より名古屋側を望む	<p>②</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成24年度 23号蒲郡BP芦谷西道路建設工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成25年3月19日～平成26年2月28日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>㈱ヒメノ TEL 0564-62-6918、FAX 0533-62-6919</td></tr> <tr><td>1月末時点進捗率</td><td>98%</td></tr> <tr><td>2月作業内容</td><td>法面</td></tr> <tr><td>写真</td><td></td></tr> <tr><td>写真説明</td><td>豊橋側より名古屋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成24年度 23号蒲郡BP芦谷西道路建設工事	工期	平成25年3月19日～平成26年2月28日	施工業者	㈱ヒメノ TEL 0564-62-6918、FAX 0533-62-6919	1月末時点進捗率	98%	2月作業内容	法面	写真		写真説明	豊橋側より名古屋側を望む	<p>③</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成25年度 23号蒲郡BP芦谷地区道路建設工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成25年5月24日～平成26年3月27日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>朝日工業 ㈱ TEL 0564-64-0526、FAX 0564-64-0527</td></tr> <tr><td>1月末時点進捗率</td><td>98%</td></tr> <tr><td>2月作業内容</td><td>導水管敷設</td></tr> <tr><td>写真</td><td></td></tr> <tr><td>写真説明</td><td>名古屋側より豊橋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成25年度 23号蒲郡BP芦谷地区道路建設工事	工期	平成25年5月24日～平成26年3月27日	施工業者	朝日工業 ㈱ TEL 0564-64-0526、FAX 0564-64-0527	1月末時点進捗率	98%	2月作業内容	導水管敷設	写真		写真説明	名古屋側より豊橋側を望む	<p>④</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成25年度 23号蒲郡BP芦谷東舗装工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成25年5月1日～平成26年3月27日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>鹿島道路 ㈱ TEL 0564-64-4551、FAX 0564-64-4552</td></tr> <tr><td>1月末時点進捗率</td><td>78%</td></tr> <tr><td>2月作業内容</td><td>舗装、排水構造物、防護柵、照明・標識建柱</td></tr> <tr><td>写真</td><td></td></tr> <tr><td>写真説明</td><td>豊橋側より名古屋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成25年度 23号蒲郡BP芦谷東舗装工事	工期	平成25年5月1日～平成26年3月27日	施工業者	鹿島道路 ㈱ TEL 0564-64-4551、FAX 0564-64-4552	1月末時点進捗率	78%	2月作業内容	舗装、排水構造物、防護柵、照明・標識建柱	写真		写真説明	豊橋側より名古屋側を望む	<p>⑤</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成24年度 23号蒲郡BPTンネル受変電設備工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成25年3月9日～平成26年3月20日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>㈱柿本商会 TEL 0533-67-8233、FAX 0533-67-8233</td></tr> <tr><td>1月末時点進捗率</td><td>88%</td></tr> <tr><td>2月作業内容</td><td>機器据付、配管・配線・結線</td></tr> <tr><td>写真</td><td></td></tr> <tr><td>写真説明</td><td>(仮)坂野トンネルポンプ室を望む</td></tr> </table>	工事名	平成24年度 23号蒲郡BPTンネル受変電設備工事	工期	平成25年3月9日～平成26年3月20日	施工業者	㈱柿本商会 TEL 0533-67-8233、FAX 0533-67-8233	1月末時点進捗率	88%	2月作業内容	機器据付、配管・配線・結線	写真		写真説明	(仮)坂野トンネルポンプ室を望む	<p>⑥</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成25年度 23号蒲郡BPTンネル照明設備工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成25年5月25日～平成26年3月20日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>白川電気土木 ㈱ TEL 0533-56-9696、FAX 0533-56-9696</td></tr> <tr><td>1月末時点進捗率</td><td>89%</td></tr> <tr><td>2月作業内容</td><td>トンネル照明配線、坑外灯取付</td></tr> <tr><td>写真</td><td></td></tr> <tr><td>写真説明</td><td>(仮)坂野トンネルより豊橋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成25年度 23号蒲郡BPTンネル照明設備工事	工期	平成25年5月25日～平成26年3月20日	施工業者	白川電気土木 ㈱ TEL 0533-56-9696、FAX 0533-56-9696	1月末時点進捗率	89%	2月作業内容	トンネル照明配線、坑外灯取付	写真		写真説明	(仮)坂野トンネルより豊橋側を望む
工事名	平成25年度 23号蒲郡BP芦谷西舗装工事																																																																																								
工期	平成25年8月16日～平成26年3月27日																																																																																								
施工業者	大林道路 ㈱ TEL 0564-83-5920、FAX 0564-83-5935																																																																																								
1月末時点進捗率	31%																																																																																								
2月作業内容	舗装、路床改良、排水構造物、照明配管																																																																																								
写真																																																																																									
写真説明	豊橋側より名古屋側を望む																																																																																								
工事名	平成24年度 23号蒲郡BP芦谷西道路建設工事																																																																																								
工期	平成25年3月19日～平成26年2月28日																																																																																								
施工業者	㈱ヒメノ TEL 0564-62-6918、FAX 0533-62-6919																																																																																								
1月末時点進捗率	98%																																																																																								
2月作業内容	法面																																																																																								
写真																																																																																									
写真説明	豊橋側より名古屋側を望む																																																																																								
工事名	平成25年度 23号蒲郡BP芦谷地区道路建設工事																																																																																								
工期	平成25年5月24日～平成26年3月27日																																																																																								
施工業者	朝日工業 ㈱ TEL 0564-64-0526、FAX 0564-64-0527																																																																																								
1月末時点進捗率	98%																																																																																								
2月作業内容	導水管敷設																																																																																								
写真																																																																																									
写真説明	名古屋側より豊橋側を望む																																																																																								
工事名	平成25年度 23号蒲郡BP芦谷東舗装工事																																																																																								
工期	平成25年5月1日～平成26年3月27日																																																																																								
施工業者	鹿島道路 ㈱ TEL 0564-64-4551、FAX 0564-64-4552																																																																																								
1月末時点進捗率	78%																																																																																								
2月作業内容	舗装、排水構造物、防護柵、照明・標識建柱																																																																																								
写真																																																																																									
写真説明	豊橋側より名古屋側を望む																																																																																								
工事名	平成24年度 23号蒲郡BPTンネル受変電設備工事																																																																																								
工期	平成25年3月9日～平成26年3月20日																																																																																								
施工業者	㈱柿本商会 TEL 0533-67-8233、FAX 0533-67-8233																																																																																								
1月末時点進捗率	88%																																																																																								
2月作業内容	機器据付、配管・配線・結線																																																																																								
写真																																																																																									
写真説明	(仮)坂野トンネルポンプ室を望む																																																																																								
工事名	平成25年度 23号蒲郡BPTンネル照明設備工事																																																																																								
工期	平成25年5月25日～平成26年3月20日																																																																																								
施工業者	白川電気土木 ㈱ TEL 0533-56-9696、FAX 0533-56-9696																																																																																								
1月末時点進捗率	89%																																																																																								
2月作業内容	トンネル照明配線、坑外灯取付																																																																																								
写真																																																																																									
写真説明	(仮)坂野トンネルより豊橋側を望む																																																																																								

<p>⑦</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成25年度 23号蒲郡BPTンネル防災設備工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成25年6月6日～平成26年3月20日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>イシデンエンジニアリング ㈱ TEL 052-509-1410、FAX 052-509-1412</td></tr> <tr><td>1月末時点進捗率</td><td>83%</td></tr> <tr><td>2月作業内容</td><td>情報管路、光ケーブル布設、トンネル内機器設置</td></tr> <tr><td>写真</td><td></td></tr> <tr><td>写真説明</td><td>名古屋側より豊橋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成25年度 23号蒲郡BPTンネル防災設備工事	工期	平成25年6月6日～平成26年3月20日	施工業者	イシデンエンジニアリング ㈱ TEL 052-509-1410、FAX 052-509-1412	1月末時点進捗率	83%	2月作業内容	情報管路、光ケーブル布設、トンネル内機器設置	写真		写真説明	名古屋側より豊橋側を望む	<p>⑧</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成25年度 23号蒲郡BP柏原地区舗装工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成25年4月24日～平成26年3月27日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>日本道路 ㈱ TEL 0533-65-7503、FAX 0533-65-7504</td></tr> <tr><td>1月末時点進捗率</td><td>68%</td></tr> <tr><td>2月作業内容</td><td>舗装、防護柵</td></tr> <tr><td>写真</td><td></td></tr> <tr><td>写真説明</td><td>名古屋側より豊橋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成25年度 23号蒲郡BP柏原地区舗装工事	工期	平成25年4月24日～平成26年3月27日	施工業者	日本道路 ㈱ TEL 0533-65-7503、FAX 0533-65-7504	1月末時点進捗率	68%	2月作業内容	舗装、防護柵	写真		写真説明	名古屋側より豊橋側を望む	<p>⑨</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡西IC舗装工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成25年5月1日～平成26年3月27日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>㈱ガイアート・K TEL 0533-56-9740、FAX 0533-56-9741</td></tr> <tr><td>1月末時点進捗率</td><td>66%</td></tr> <tr><td>2月作業内容</td><td>舗装、防火ブロック、防護柵、調整池</td></tr> <tr><td>写真</td><td></td></tr> <tr><td>写真説明</td><td>名古屋側より豊橋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡西IC舗装工事	工期	平成25年5月1日～平成26年3月27日	施工業者	㈱ガイアート・K TEL 0533-56-9740、FAX 0533-56-9741	1月末時点進捗率	66%	2月作業内容	舗装、防火ブロック、防護柵、調整池	写真		写真説明	名古屋側より豊橋側を望む	<p>⑩</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成25年度 23号蒲郡BP上名取地区舗装工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成25年7月3日～平成26年3月27日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>中部土木 ㈱ TEL 0533-65-8499、FAX 0533-65-8944</td></tr> <tr><td>1月末時点進捗率</td><td>62%</td></tr> <tr><td>2月作業内容</td><td>舗装、防護柵、区画線、道路付属物</td></tr> <tr><td>写真</td><td></td></tr> <tr><td>写真説明</td><td>豊橋側より名古屋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成25年度 23号蒲郡BP上名取地区舗装工事	工期	平成25年7月3日～平成26年3月27日	施工業者	中部土木 ㈱ TEL 0533-65-8499、FAX 0533-65-8944	1月末時点進捗率	62%	2月作業内容	舗装、防護柵、区画線、道路付属物	写真		写真説明	豊橋側より名古屋側を望む	<p>⑪</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成24年度 23号蒲郡BP上名取東道路建設工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成25年1月29日～平成26年1月31日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>矢作建設工業 ㈱ TEL 0533-56-9567、FAX 0533-56-9568</td></tr> <tr><td>1月末時点進捗率</td><td>100%</td></tr> <tr><td>2月作業内容</td><td>完成</td></tr> <tr><td>写真</td><td></td></tr> <tr><td>写真説明</td><td>豊橋側より名古屋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成24年度 23号蒲郡BP上名取東道路建設工事	工期	平成25年1月29日～平成26年1月31日	施工業者	矢作建設工業 ㈱ TEL 0533-56-9567、FAX 0533-56-9568	1月末時点進捗率	100%	2月作業内容	完成	写真		写真説明	豊橋側より名古屋側を望む	<p>⑫</p> <table border="1"> <tr><td>工事名</td><td>平成25年度 23号蒲郡BP神ノ郷地区道路建設工事</td></tr> <tr><td>工期</td><td>平成25年6月22日～平成26年3月27日</td></tr> <tr><td>施工業者</td><td>関興業 ㈱ TEL 0533-65-8837、FAX 0533-65-8847</td></tr> <tr><td>1月末時点進捗率</td><td>79%</td></tr> <tr><td>1月作業内容</td><td>大型ブロック、側道舗装、立入防止柵</td></tr> <tr><td>写真</td><td></td></tr> <tr><td>写真説明</td><td>豊橋側より名古屋側を望む</td></tr> </table>	工事名	平成25年度 23号蒲郡BP神ノ郷地区道路建設工事	工期	平成25年6月22日～平成26年3月27日	施工業者	関興業 ㈱ TEL 0533-65-8837、FAX 0533-65-8847	1月末時点進捗率	79%	1月作業内容	大型ブロック、側道舗装、立入防止柵	写真		写真説明	豊橋側より名古屋側を望む
工事名	平成25年度 23号蒲郡BPTンネル防災設備工事																																																																																								
工期	平成25年6月6日～平成26年3月20日																																																																																								
施工業者	イシデンエンジニアリング ㈱ TEL 052-509-1410、FAX 052-509-1412																																																																																								
1月末時点進捗率	83%																																																																																								
2月作業内容	情報管路、光ケーブル布設、トンネル内機器設置																																																																																								
写真																																																																																									
写真説明	名古屋側より豊橋側を望む																																																																																								
工事名	平成25年度 23号蒲郡BP柏原地区舗装工事																																																																																								
工期	平成25年4月24日～平成26年3月27日																																																																																								
施工業者	日本道路 ㈱ TEL 0533-65-7503、FAX 0533-65-7504																																																																																								
1月末時点進捗率	68%																																																																																								
2月作業内容	舗装、防護柵																																																																																								
写真																																																																																									
写真説明	名古屋側より豊橋側を望む																																																																																								
工事名	平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡西IC舗装工事																																																																																								
工期	平成25年5月1日～平成26年3月27日																																																																																								
施工業者	㈱ガイアート・K TEL 0533-56-9740、FAX 0533-56-9741																																																																																								
1月末時点進捗率	66%																																																																																								
2月作業内容	舗装、防火ブロック、防護柵、調整池																																																																																								
写真																																																																																									
写真説明	名古屋側より豊橋側を望む																																																																																								
工事名	平成25年度 23号蒲郡BP上名取地区舗装工事																																																																																								
工期	平成25年7月3日～平成26年3月27日																																																																																								
施工業者	中部土木 ㈱ TEL 0533-65-8499、FAX 0533-65-8944																																																																																								
1月末時点進捗率	62%																																																																																								
2月作業内容	舗装、防護柵、区画線、道路付属物																																																																																								
写真																																																																																									
写真説明	豊橋側より名古屋側を望む																																																																																								
工事名	平成24年度 23号蒲郡BP上名取東道路建設工事																																																																																								
工期	平成25年1月29日～平成26年1月31日																																																																																								
施工業者	矢作建設工業 ㈱ TEL 0533-56-9567、FAX 0533-56-9568																																																																																								
1月末時点進捗率	100%																																																																																								
2月作業内容	完成																																																																																								
写真																																																																																									
写真説明	豊橋側より名古屋側を望む																																																																																								
工事名	平成25年度 23号蒲郡BP神ノ郷地区道路建設工事																																																																																								
工期	平成25年6月22日～平成26年3月27日																																																																																								
施工業者	関興業 ㈱ TEL 0533-65-8837、FAX 0533-65-8847																																																																																								
1月末時点進捗率	79%																																																																																								
1月作業内容	大型ブロック、側道舗装、立入防止柵																																																																																								
写真																																																																																									
写真説明	豊橋側より名古屋側を望む																																																																																								

完成しました！

⑬	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田西地区道路建設工事 工期 平成25年6月14日～平成26年1月20日 施工業者 <b>大和小田急建設</b> TEL 0533-56-9023, FAX 0533-56-9025 1月末時点 進捗率 100% 1月作業内容 完成  名古屋から豊橋側を望む	⑭	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田東地区道路建設工事 工期 平成25年6月15日～平成26年1月20日 施工業者 <b>若築建設</b> TEL 0533-67-9227, FAX 0533-67-9228 1月末時点 進捗率 100 1月作業内容 完成  名古屋から豊橋側を望む	⑮	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田東道路建設工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 <b>日鋪建設</b> TEL 0533-75-6893, FAX 0533-75-6894 1月末時点 進捗率 34% 1月作業内容 掘削、残土運搬、法面、排水構造物  名古屋から豊橋側を望む	⑯	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田西道路建設工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 <b>備近藤組</b> TEL 0533-56-9602, FAX 0533-56-9603 1月末時点 進捗率 80% 1月作業内容 掘削、残土運搬、法面  名古屋から豊橋側を望む	⑰	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田南地区道路建設工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 <b>小原建設</b> TEL 0564-64-1607, FAX 0564-64-1608 1月末時点 進捗率 81% 1月作業内容 残土運搬、法面  名古屋から豊橋側を望む	⑱	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田北地区道路建設工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 <b>中日建設</b> TEL 0533-56-9081, FAX 0533-56-9082 1月末時点 進捗率 80% 1月作業内容 残土運搬、法面  豊橋側から名古屋側を望む
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---

完成しました！


完成しました！

⑲	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC道路建設工事 工期 平成25年5月23日～平成26年3月27日 施工業者 <b>長坂建設興業</b> TEL 0533-65-8590, FAX 0533-65-8591 1月末時点 進捗率 98% 1月作業内容 路床盛土、調整地、排水構造物  本線北側より蒲郡ICを望む	⑳	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC舗装工事 工期 平成25年8月14日～平成26年3月27日 施工業者 <b>備佐藤波辺</b> TEL 0533-66-6112, FAX 0533-66-6115 1月末時点 進捗率 30% 1月作業内容 舗装、排水構造物、照明  豊橋側より名古屋側を望む	㉑	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP遮音壁設置工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 <b>備近藤組</b> TEL 0533-56-9602, FAX 0533-56-9603 1月末時点 進捗率 14% 1月作業内容 遮音壁  名古屋側より豊橋側を望む	㉒	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP道路情報表示設備工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月20日 施工業者 <b>名古屋電機工業</b> TEL 052-443-0327, FAX 052-443-1218 1月末時点 進捗率 39% 1月作業内容 機器設置、引込柱設置  名古屋側より豊橋側を望む	㉓	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC下部工事 工期 平成25年6月7日～平成26年3月27日 施工業者 <b>山旺建設</b> TEL 0533-56-9092, FAX 0533-56-9093 1月末時点 進捗率 82% 1月作業内容 橋脚コンクリート、埋戻し  名古屋側より豊橋側を望む	㉔	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋PC上部工事 工期 平成25年3月12日～平成26年1月20日 施工業者 <b>川田建設</b> TEL 0533-56-9236, FAX 0533-56-9237 1月末時点 進捗率 100% 1月作業内容 完成  豊橋側より名古屋側を望む
---	---	---	--	---	--	---	---	---	---	---	---

完成しました！


⑳	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC整備工事 工期 平成25年10月9日～平成26年3月27日 施工業者 <b>木村建設</b> TEL 0533-65-9582, FAX 0533-65-9583 1月末時点 進捗率 35% 1月作業内容 掘削、残土搬出、防護柵  豊橋側より名古屋側を望む
---	--

排水性舗装の効果

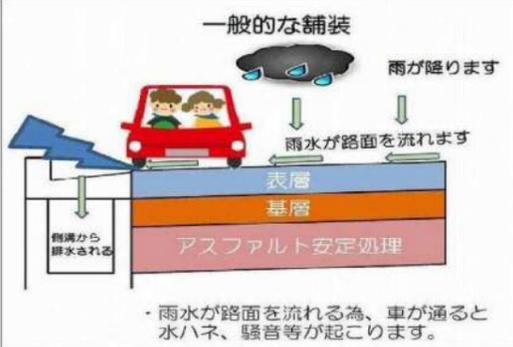

水はねの抑制

車両走行音の低減

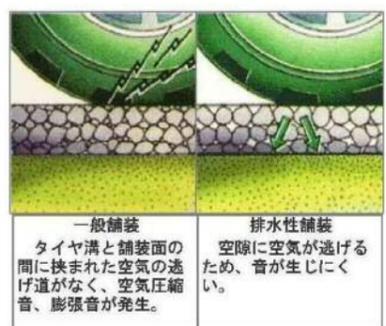

一般舗装では、雨水は道路の表面をながれて排水溝へ排水されます。排水性舗装は、雨水を道路の表面に帯水させることなく、舗装体内部から排水施設に排水させるので、以下の効果を発揮します。

- ・雨天時のすべり抵抗性の向上(ハイドロプレーニング現象の緩和)
- ・走行車両による水はね、水しぶきの減少
- ・雨天夜間時におけるヘッドライトによる路面反射の緩和
- ・雨天時における路面標示の視認性の向上
- ・車両走行による道路交通騒音の低減
- ・沿道への水はね抑制

編集長から一言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に対しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

3月号の編集長になりました(株)ガイアートT・K現場代理人 伊藤です。宜しくお願い致します。私どもは、蒲郡西ICの舗装工事を行っています。昨年の7月より工事に着手し、これまでに本線へ合流する道路と、本線から降りる道路を舗装してきました。今後は舗装の仕上げ面となる排水性舗装の施工を行い、区画線・標識を設置し、皆様が通行できるようにしていきます。2月15日には多重事故合同訓練も実施し、3月23日の開通に向けて着々と準備が進められています。



現場スタッフ



現場代理人

現在、工事も最盛期であり工事車両の出入りが多い状態が続きますが、安全最優先にて作業を行なってまいりますので、皆様のご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。
