

岡崎バイパス工事便り 平成27年 6月号




一般国道23号岡崎バイパスは名豊道路の一部として計画され、東は蒲郡バイパス、西は知立バイパスと接続する延長14.6kmのバイパスです。岡崎バイパスのうち、安城西尾ICから藤井ICまでは4車線で供用されており、藤井ICから幸田芦谷ICまでは暫定的に2車線で供用されています。

現在、藤井ICから西尾東ICまでの区間について、平成27年度中の4車線化を目指して工事を行っています。現在施工中の工事の概要と進捗等についてお伝えしていきます。

西尾建設監督官詰所 (0563-55-7081)

平成27年度4車線化対象区間(L=4.0km)

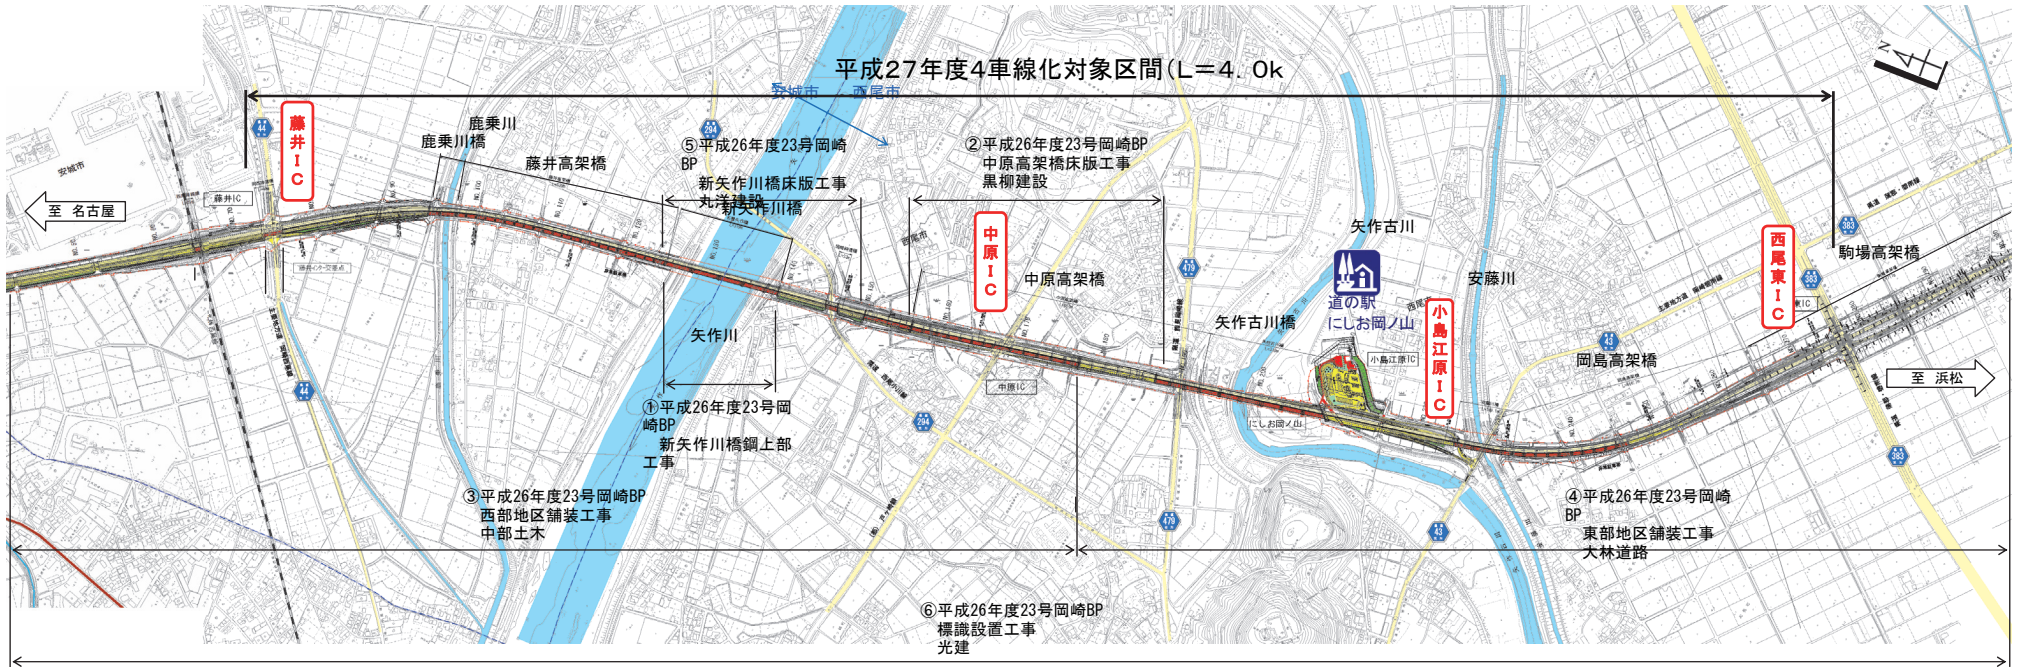


① 平成26年度 23号岡崎BP新矢作川橋鋼上部工事

(株) IHIインフラシステム

工事概要

工事名 平成26年度 23号岡崎BP新矢作川橋鋼上部工事
 工事場所 西尾市志貴野町～安城市藤井町
 工期 平成26年6月19日～平成27年6月30日
 工事内容 工場製作工 1式
 工場製品輸送工 1式
 道路土工 1式
 仮設工 1式
 鋼橋架設工 1式
 橋梁付属物工 1式



工事進捗

5月末進捗率: 99.9%

4月に橋桁の架設作業は完了し、5月に河川内の桁架設で利用した作業ヤードと工事用車両進入路の撤去作業は完了しました。場内の片付作業も、5月末までにほぼ完了致しました。
 6月には完成検査を予定しており、6月末までに工事完了致します。工事期間中は交通規制等もあり、近隣住民の皆様にはご不便をおかけしましたが、ご理解とご協力により全作業を無事に終えることができました。ありがとうございます。
 岡崎バイパスの工事は、年度末の供用開始に向けてまだまだ続きますが、皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い致します。

右岸下流側より 鋼橋架設作業完了



左岸下流側より 鋼橋架設作業完了



② 平成26年度 23号岡崎BP中原高架橋床版工事

黒柳建設(株)

工事概要


工事名 平成26年度 23号岡崎BP中原高架橋床版工事
 工事場所 西尾市中原町
 工期 平成27年2月4日～平成27年10月30日
 工事内容 床版工 1式
 橋梁付属物工 1式
 鋼橋足場等設置工 1式
 構造物撤去工 1式



工事進捗

5月末進捗率: 27.7%

現在、名古屋側の床版コンクリートの打設が完了しました。6月からは、中原インター交差点上で鉄筋組立を行い、豊橋側では、床版コンクリートの打設を行います。
 工事の進捗に伴い、大型車両の通行が多くなり、ご不便をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。
 なお、工事に関して、ご不明な点などがございましたら、お気軽にお声をお掛け下さい。

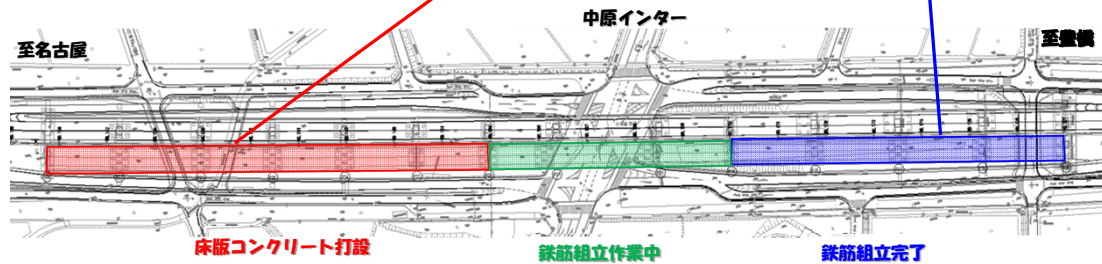


③ 平成26年度 23号岡崎BP西部地区舗装工事

中部土木(株)

工事概要

工事名 平成26年度 23号岡崎BP西部地区舗装工事
 工事場所 西尾市中原町～安城市藤井町
 工期 平成27年3月14日～平成28年3月25日
 工事内容 道路土工 1式
 舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 縁石工 1式
 防護柵工 1式
 区画線工 1式

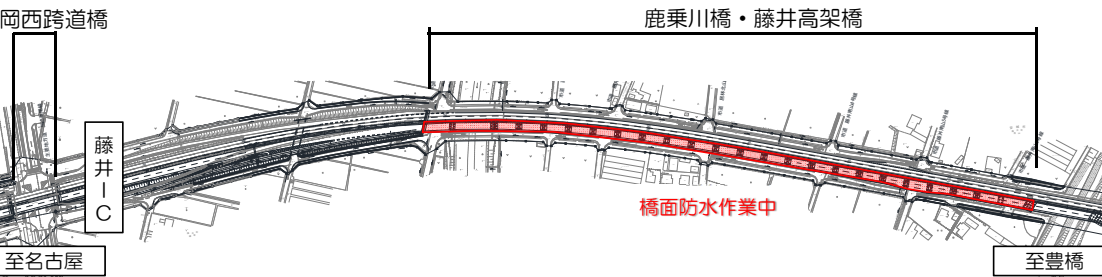

工事進捗

5月末進捗率: 13.6%

5月中旬より、藤井高架橋にて工事を着手しました。橋面端部防水作業を行っており、6月上旬から、シート防水作業に取りかかります。
 6月中旬からは、藤井高架橋～藤井ICまで、舗装作業を行う予定をしており、ダンプトラックの出入りが多くなります。地元の皆様には、大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。



④ 平成26年度 23号岡崎BP東部地区舗装工事

大林道路(株)

工事概要

工事名 平成26年度 23号岡崎BP東部地区舗装工事
 工事場所 西尾市駒場町～中原町
 工期 平成27年3月18日～平成28年3月25日
 工事内容 道路土工 1式
 舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 縁石工 1式
 防護柵工 1式
 構造物撤去工 1式



中原IC オフランプ



西尾東IC オンランプ

工事進捗

5月末進捗率: 02.0%


5月より西尾東ICより工事を着手しました。現在は、排水構造物を施工しており、6月中頃よりアスファルト舗装工事を順次施工する予定となります。
 6月末には、西尾東IC区間において、本線路肩規制による工事を行なうため近隣住民の皆様にご不便ご迷惑をお掛けしますが、安全第一に工事を進め、早期完成に努めてまいりますので、ご理解ご協力をよろしくお願い致します。

⑤ 平成26年度 23号岡崎BP新矢作川橋床版工事

丸洋建設(株)

工事概要

工事名 平成26年度 23号岡崎BP新矢作川橋床版工事
 工事場所 西尾市中原町～安城市藤井町
 工期 平成27年3月21日～平成27年12月25日
 工事内容 床版工 1式
 排水装置工 1式
 地覆工 1式
 橋梁用防護柵工 1式
 橋梁用高欄工 1式
 橋梁足場工 1式

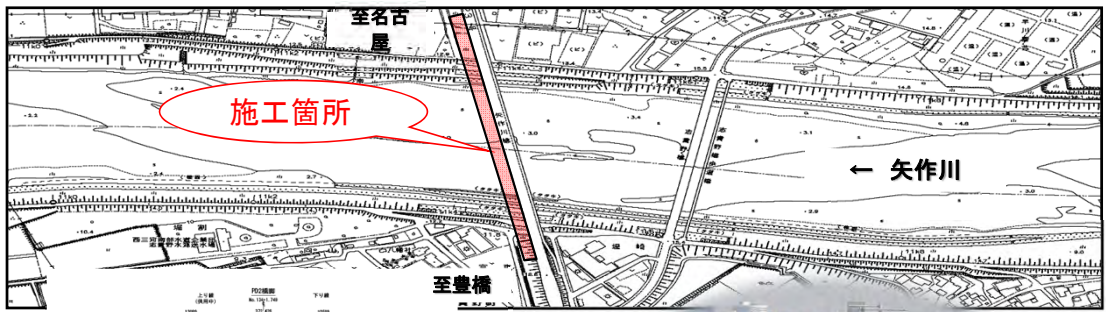


工事進捗

5月末進捗率: 9.4%

着手して1か月、足場も完了し橋の半分まで桁に型枠の組立が完了しました。この後、鉄筋等の重量物を運搬するために、線路を設置し電動の台車にて運搬し、鉄筋を組み立てます。コンクリート打込み(完成)に向けて少しずつ進めていきます。

地元の方々をはじめ、皆様には、何かとご不便ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力のほど宜しくお願いいたします。

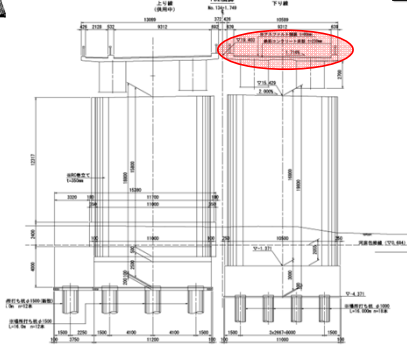

丸洋建設株式会社
 すべてはゆたかなくらしのために

⑥ 平成26年度 23号岡崎BP標識設置工事

(株)光建

工事概要

工事名 平成26年度 23号岡崎BP標識設置工事
 工事場所 西尾市駒場町～安城市藤井町
 工期 平成27年3月24日～平成28年3月30日
 工事内容 大型標識設置工 1式
 標識撤去工 1式
 構造物撤去工 1式



工事進捗

5月末進捗率: 1.7%

20基の標識(新設・建替)を行います。現在施工準備中です。6月中旬から矢作古川橋北側の既設構造物撤去に入ります。施工は側道を占有して行います、ご理解、ご協力をよろしくお願い致します。



下り線 矢作古川橋から北を望む 施工
