

岡崎バイパス工事便り 平成28年 9月号




一般国道23号岡崎バイパスは名豊道路の一部として計画され、東は蒲郡バイパス、西は知立バイパスと接続する延長14.6kmのバイパスです。岡崎バイパスのうち、安城西尾ICから西尾東ICまでは4車線で供用されており、西尾東ICから幸田芦谷ICまでは、暫定的に2車線で供用されています。

平成28年2月26日に藤井ICから西尾東ICまでを4車線で供用することができました。現在は安城西尾ICから西尾東ICまでの区間について側道の整備を行っています。

現在施工中の工事の概要と進捗等についてお伝えしていきます。

西尾建設監督官詰所(0563-55-7081)

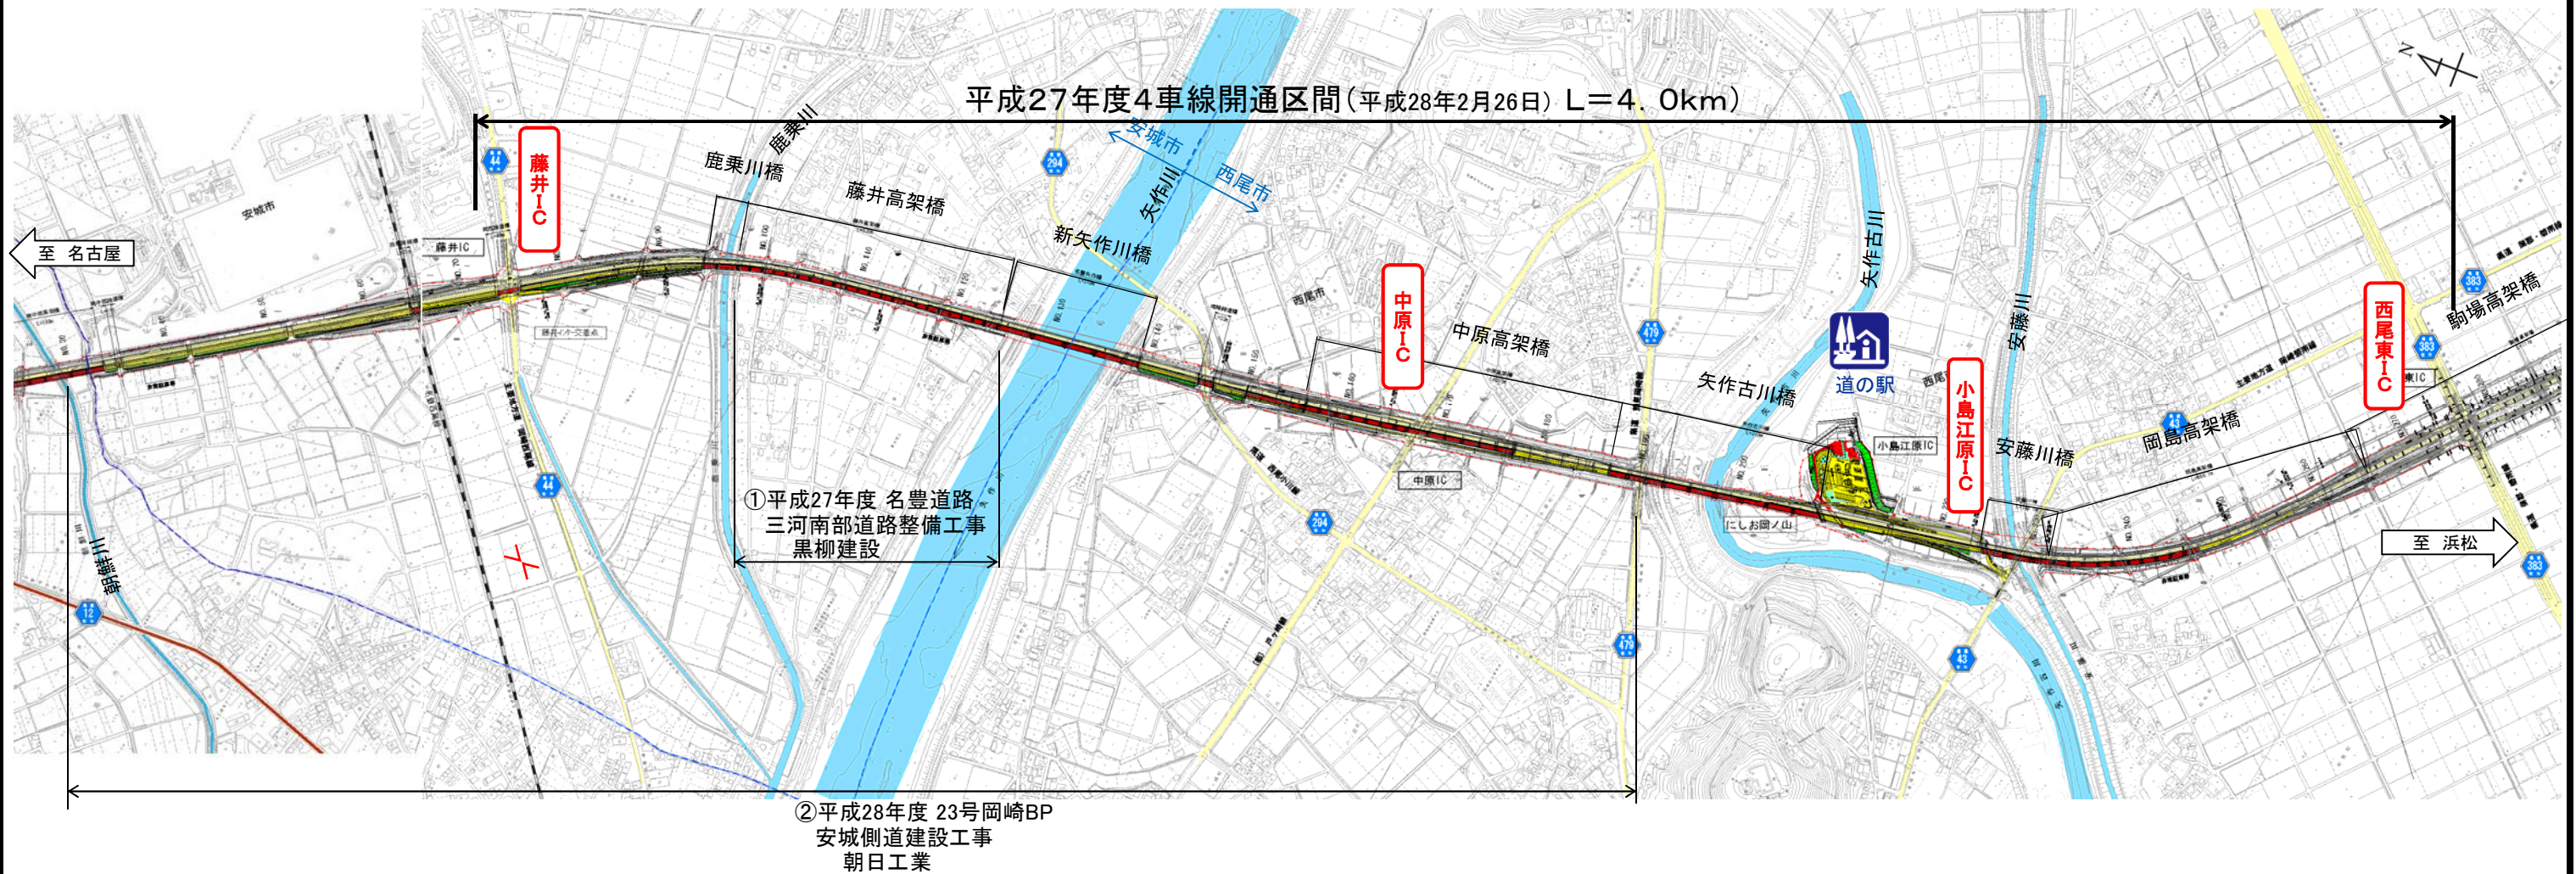

① 平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事 黒柳建設(株)

工事概要

工事名 平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事
工事場所 安城市藤井町 (506m)
工期 平成28年1月13日～平成29年3月24日
工事内容 排水構造物工 1式
 道路付属施設工 1式
 調整池工 1式

工事進捗

8月31日 工事完了

4月下旬より工事を進めておりましたが、皆様のご理解・ご協力のおかげで6箇所の調整池すべてを8月末に完成させることができました。

工事期間中は皆様に大変ご不便をお掛けしました。今後も工事にご理解・ご協力をお願い致します。

最後に、地域の皆様、関係者の方々ありがとうございました。


起点側より終点を望む



調整池張コンクリート完了状況



調整池(6箇所/6箇所) 完成しました。

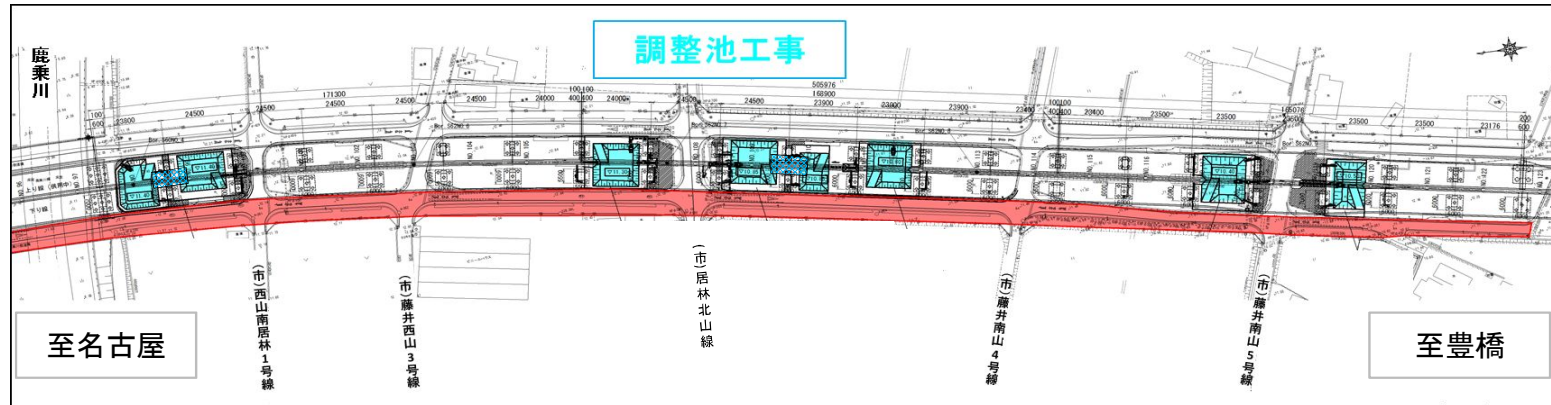

② 平成28年度 23号岡崎BP安城側道建設工事 朝日工業(株)

工事概要

工事名 平成28年度 23号岡崎BP安城側道建設工事
工事場所 安城市藤井町～西尾市中原町 (3280m)
工期 平成28年7月8日～平成29年2月28日
工事内容 道路土工 防護柵工
 舗装工 区画線工
 排水構造物工 構造物撤去工
 縁石工

工事進捗

8月末進捗率 0%

9月12日より路肩規制で準備工(草刈、舗装切断)を行い、9月20日から藤井ICより名古屋側の側道通行止めを行い本体工事に着手します。10月上旬から藤井ICより豊橋側の側道通行止めを行う予定です。通行止め期間については、現地に看板等で案内いたします。皆様には、しばらくの間、ご不便をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願い致します。



起点から藤井ICを望む 9/20通行止め予定



終点から藤井ICを望む 10月上旬通行止め予定

