

岡崎バイパス工事便り 平成28年 11月号




一般国道23号岡崎バイパスは名豊道路の一部として計画され、東は蒲郡バイパス、西は知立バイパスと接続する延長14.6kmのバイパスです。岡崎バイパスのうち、安城西尾ICから西尾東ICまでは4車線で供用されており、西尾東ICから幸田芦谷ICまでは、暫定的に2車線で供用されています。

平成28年2月26日に藤井ICから西尾東ICまでを4車線で供用することができました。現在は安城西尾ICから西尾東ICまでの区間について側道の整備を行っています。

現在施工中の工事の概要と進捗等についてお伝えしていきます。

西尾建設監督官詰所 (0563-55-7081)

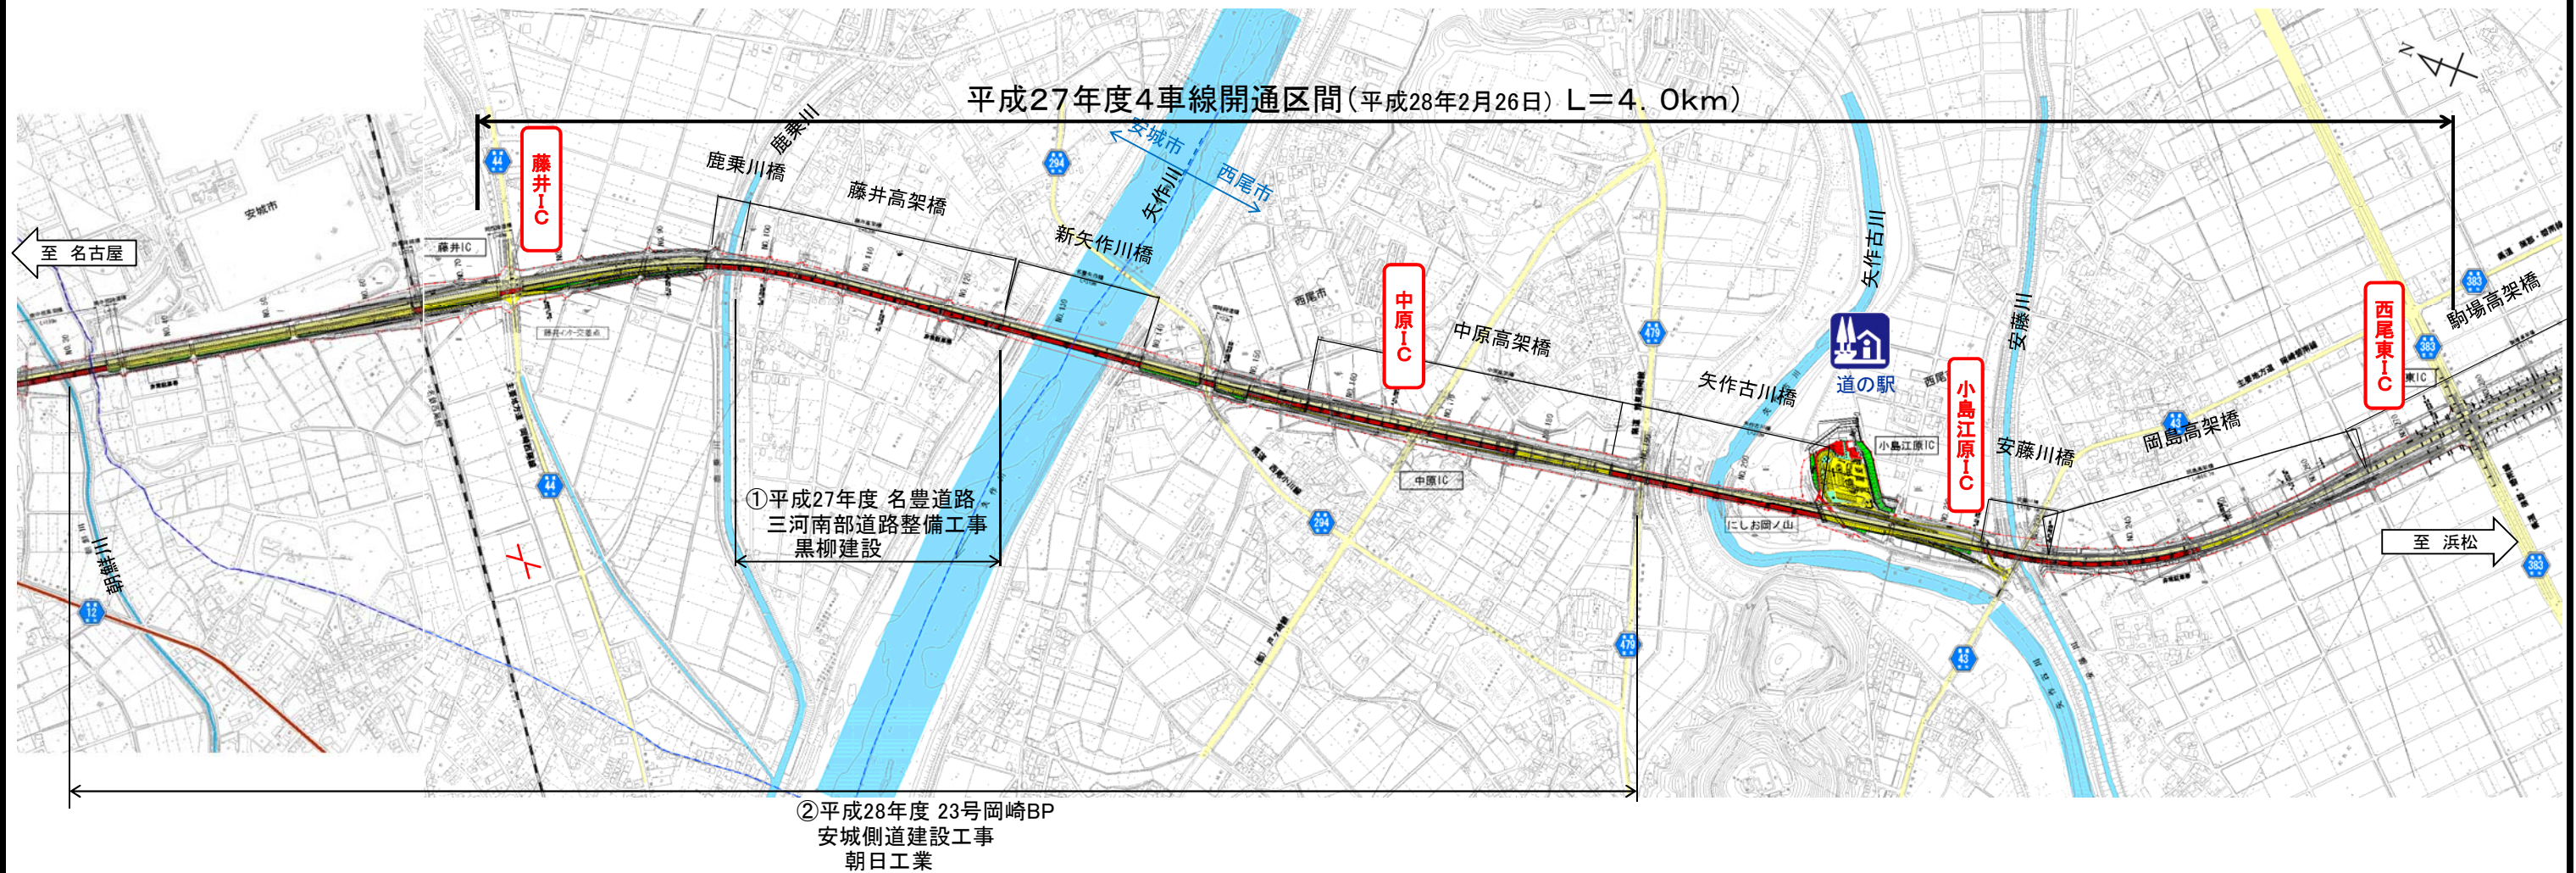

① 平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事 黒柳建設(株)

工事概要

工事名 平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事
工事場所 安城市藤井町 (506m)
工期 平成28年1月13日～平成29年3月24日
工事内容 排水構造物工 1式
 道路付属施設工 1式
 調整池工 1式

工事進捗

8月31日 工事完了

4月下旬より工事を進めておりましたが、皆様のご理解・ご協力のおかげで6箇所の調整池すべてを8月末に完成させることができました。

工事期間中は皆様にご不便をお掛けしました。今後も工事にご理解・ご協力をお願い致します。

最後に、地域の皆様、関係者の方々ありがとうございました。


起点側より終点を望む



調整池張コンクリート完了状況



調整池(6箇所/6箇所) 完成しました。

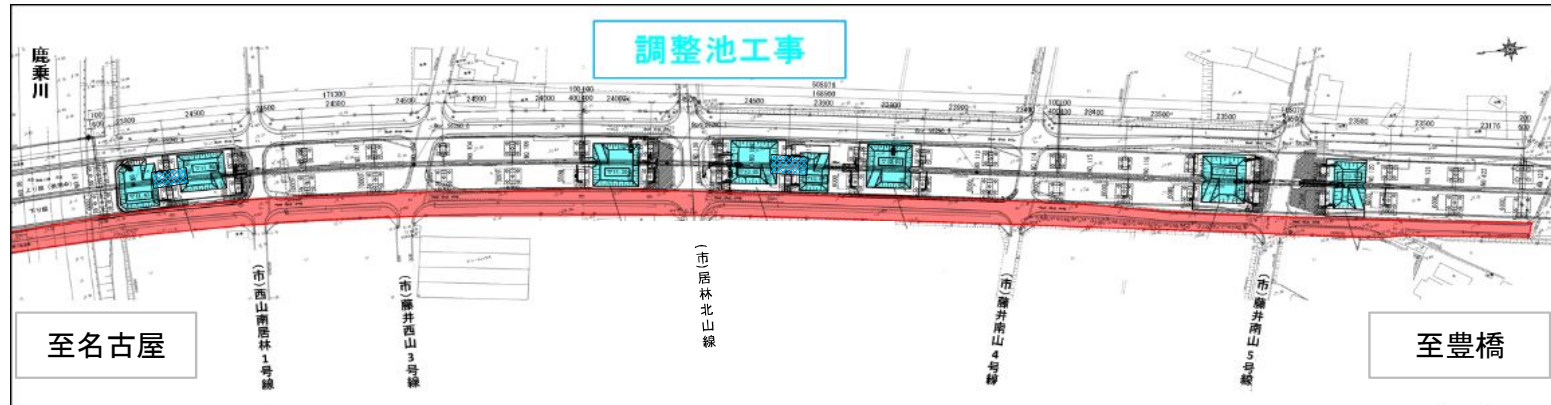

② 平成28年度 23号岡崎BP安城側道建設工事 朝日工業(株)

工事概要

工事名 平成28年度 23号岡崎BP安城側道建設工事
工事場所 安城市藤井町～西尾市中原町 (3280m)
工期 平成28年7月8日～平成29年2月28日
工事内容 道路土工 1式
 舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 縁石工 1式
 防護柵工 1式
 区画線工 1式
 構造物撤去工 1式

工事進捗

10月末進捗率 30.5%

現在、藤井ICより名古屋側下り線を11月12日まで側道通行止で歩道設置を行っております。(一部施工完了)11月14日より上り線を側道通行止めで施工予定です。

藤井ICより豊橋側上り線を11月30日まで側道通行止めを行い歩道設置の施工中です。12月1日より下り線を側道通行止めで施工予定です。

通行止迂回路については、現地に看板等で案内いたしております。

皆様には、しばらくの間、ご不便をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願い致します。



起点から藤井ICを望む 11月14日まで日側道通行止にて歩車道境界ブロック施工中 (一部施工完了)

終点から藤井ICを望む 11月30日まで側道通行止にて自由勾配側溝施工中

