

① 平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事 黒柳建設(株)

工事概要

工事名 平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事
工事場所 安城市藤井町 (506m)
工期 平成28年1月13日～平成29年3月24日
工事内容 排水構造物工 1式
 道路付属施設工 1式
 調整池工 1式

工事進捗

8月31日 工事完了

4月下旬より工事を進めておりましたが、皆様のご理解・ご協力のおかげで6箇所の調整池すべてを8月末に完成させることができました。

工事期間中は皆様にご不便をお掛けしました。今後も工事にご理解・ご協力をお願い致します。

最後に、地域の皆様、関係者の方々ありがとうございました。


起点側より終点を望む



調整池張コンクリート完了状況



調整池(6箇所/6箇所) 完成しました。

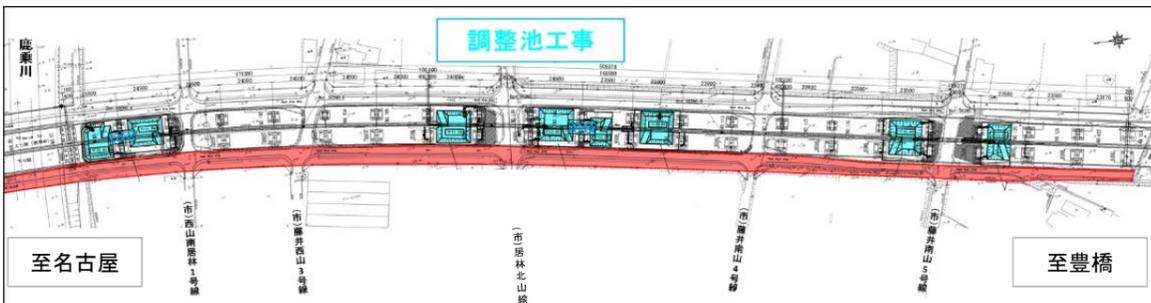

② 平成28年度 23号岡崎BP安城側道建設工事 朝日工業(株)

工事概要

工事名 平成28年度 23号岡崎BP安城側道建設工事
工事場所 安城市藤井町～西尾市中原町 (3280m)
工期 平成28年7月8日～平成29年2月28日
工事内容 道路土工 1式
 舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 縁石工 1式
 防護柵工 1式
 区画線工 1式
 構造物撤去工 1式

工事進捗

12月末進捗率 73.7%

現在、藤井ICより名古屋側下り線は歩道設置を完了しました。上り線を側道通行止め歩道設置を行っております。一部施工完了しましたが、引き続き側道通行止め作業します。


藤井ICより豊橋側上り線は歩道設置を完了しました。下り線を引き続き側道通行止め作業をしております。

通行止迂回路については、現地に看板等で案内いたしております。皆様には、しばらくの間、ご不便をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願い致します。



起点から藤井ICを望む 側道上り線にて一部歩道整備完了しました。

終点から藤井ICを望む 平成28年12月1日より側道通行止めにて上り線歩道施工中です。

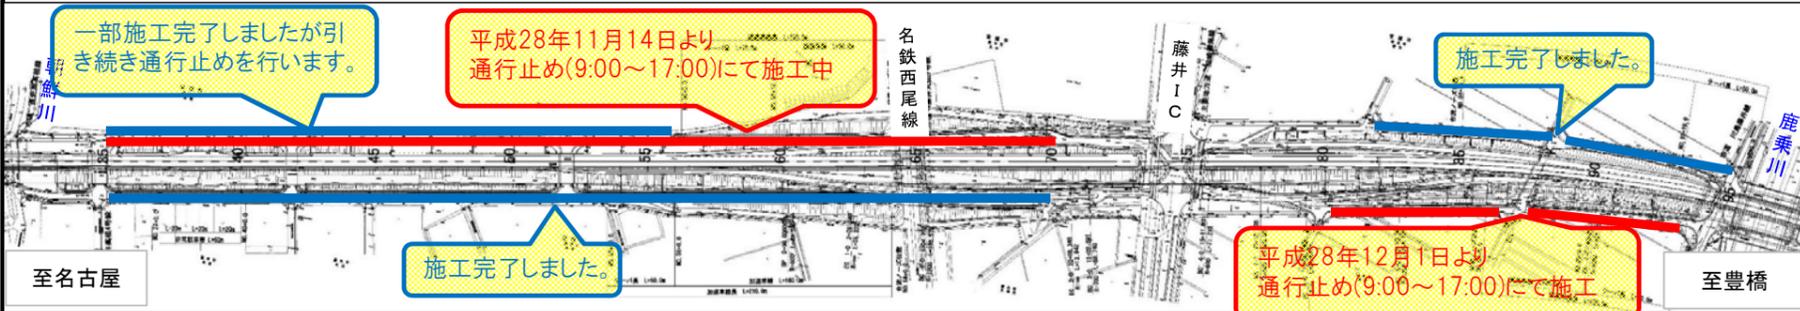

③ 平成28年度 23号岡崎BP西尾側道建設工事 長坂建設興業(株)

工事概要

工事名 平成28年度 23号岡崎BP西尾側道建設工事
工事場所 安城市藤井町～西尾市江原町 (2770m)
工期 平成28年9月14日～平成29年3月10日
工事内容 道路土工 1式
 舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 縁石工 1式
 防護柵工 1式
 区画線工 1式
 構造物撤去工 1式

工事進捗

12月末進捗率 40.0%

現在、藤井ICより豊橋側下り線は歩道を復旧しております。

また、中原ICより名古屋側上り線は歩道を設置する工事を施工しております。下り線においては、1月6日より歩道を設置する工事を始めます。

皆様には、しばらくの間、ご不便をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願い致します。



藤井ICより豊橋側 起点から終点を望む

中原IC周辺 終点から起点を望む (上り線側)

