


岡崎バイパス工事便り 平成29年 2月号

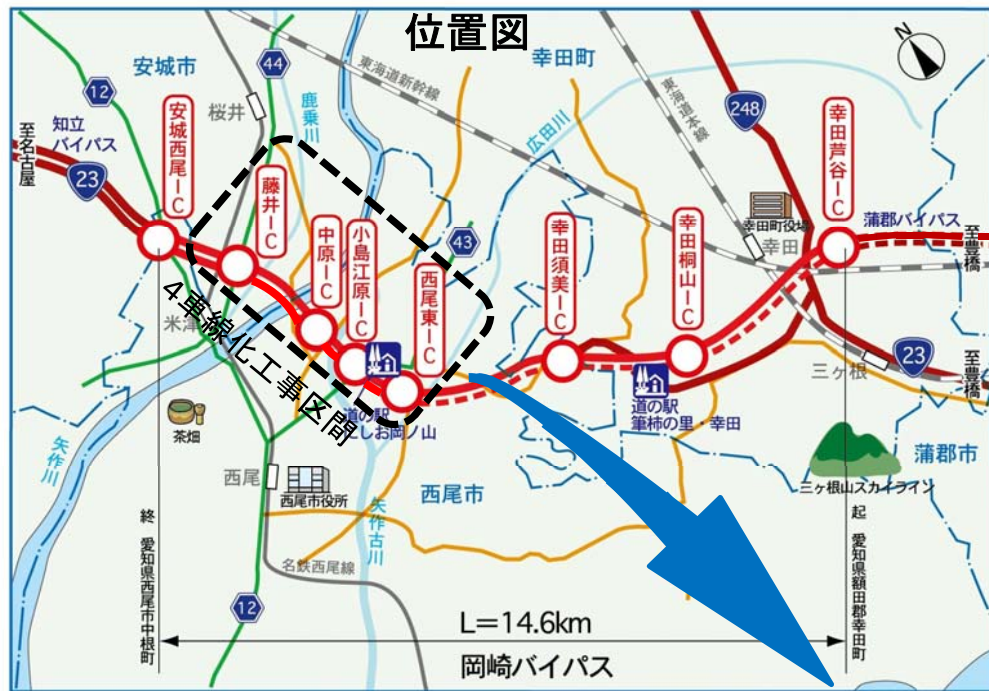


一般国道23号岡崎バイパスは名豊道路の一部として計画され、東は蒲郡バイパス、西は知立バイパスと接続する延長14.6kmのバイパスです。岡崎バイパスのうち、安城西尾ICから西尾東ICまでは4車線で供用されており、西尾東ICから幸田芦谷ICまでは、暫定的に2車線で供用されています。

平成28年2月26日に藤井ICから西尾東ICまでを4車線で供用することができました。現在は安城西尾ICから西尾東ICまでの区間について側道の整備を行っています。

現在施工中の工事の概要と進捗等についてお伝えしていきます。

西尾建設監督官詰所 (0563-55-7081)

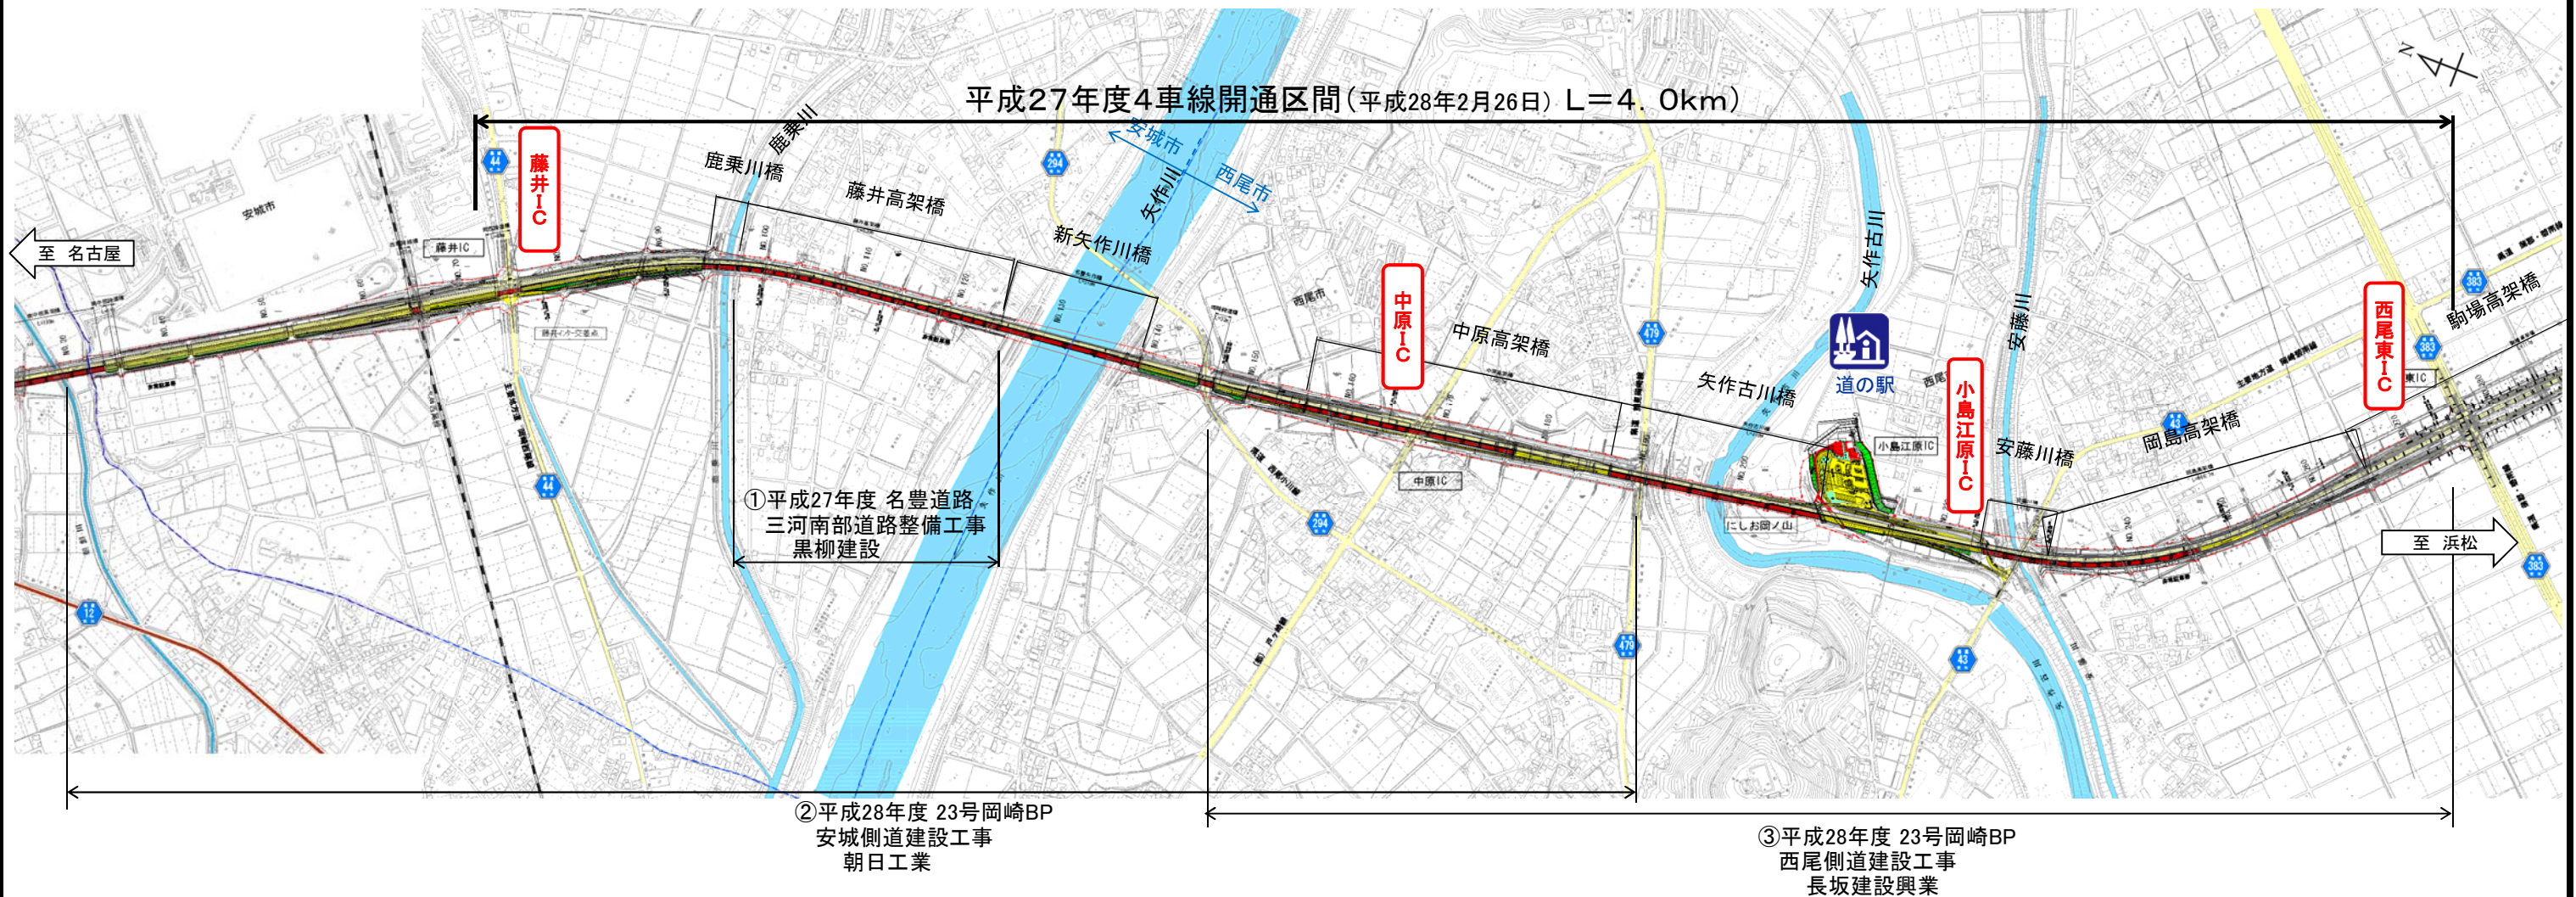

① 平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事 黒柳建設(株)

工事概要

工事名 平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事
工事場所 安城市藤井町 (506m)
工期 平成28年1月13日～平成29年3月24日
工事内容 排水構造物工 1式
 道路付属施設工 1式
 調整池工 1式

工事進捗

8月31日 工事完了
 4月下旬より工事を進めておりましたが、皆様のご理解・ご協力のおかげで6箇所の調整池すべてを8月末に完成させることができました。
 工事期間中は皆様にご不便をお掛けしました。今後も工事にご理解・ご協力をお願い致します。
 最後に、地域の皆様、関係者の方々ありがとうございました。


起点側より終点を望む



調整池張コンクリート完了状況



調整池(6箇所/6箇所) 完成しました。

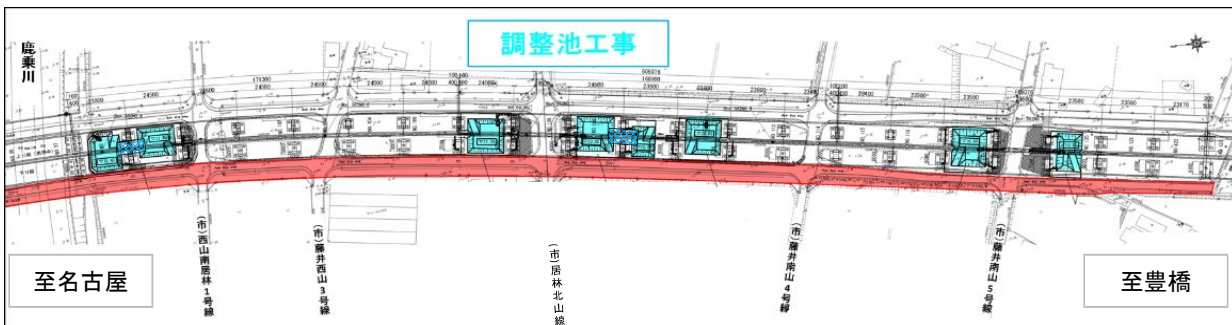

② 平成28年度 23号岡崎BP安城側道建設工事 朝日工業(株)

工事概要

工事名 平成28年度 23号岡崎BP安城側道建設工事
工事場所 安城市藤井町～西尾市中原町 (3280m)
工期 平成28年7月8日～平成29年2月28日
工事内容 道路土工 1式
 舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 縁石工 1式
 防護柵工 1式
 区画線工 1式
 構造物撤去工 1式



工事進捗

1月末進捗率 77.0%
 現在、藤井ICより名古屋側上下線は歩道設置を完了しました。側道通行止めも完了です。藤井IC上りオフランプを路肩規制にて施工しています。
 藤井ICより豊橋側上り線は歩道設置を完了しました。下り線を引き続き側道通行止めにて施工をしています。
 2月1日より中原ICと矢作古川の間で植樹帯を撤去から防草舗装を行います。
 通行止迂回路については、現地に看板等で案内いたしております。
 また、工事工期は3月24日まで延期を予定しています。皆様には、しばらくの間、ご不便をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願い致します。



起点から藤井ICを望む 側道上り線にて歩道整備完了しました。

終点から藤井ICを望む 2月28日まで側道通行止めにて上り線歩道施工中です。

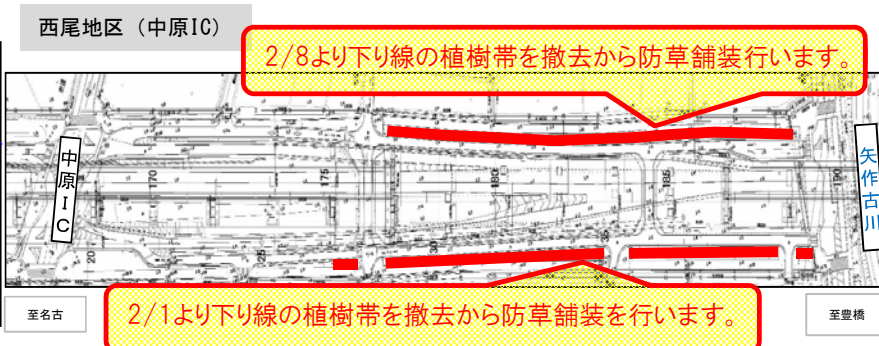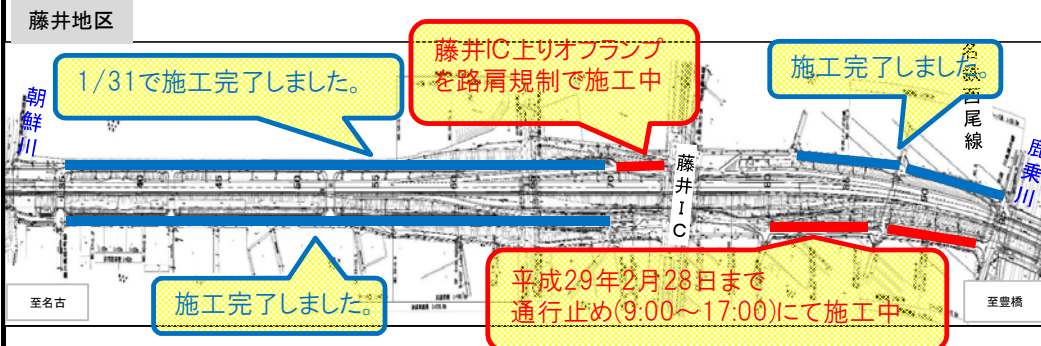

③ 平成28年度 23号岡崎BP西尾側道建設工事 長坂建設興業(株)

工事概要

工事名 平成28年度 23号岡崎BP西尾側道建設工事
工事場所 安城市藤井町～西尾市江原町 (2770m)
工期 平成28年9月14日～平成29年3月10日
工事内容 道路土工 1式
 舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 縁石工 1式
 防護柵工 1式
 区画線工 1式
 構造物撤去工 1式



工事進捗

H29.1月末進捗率 76.4%
 現在、藤井ICより豊橋側下り線は歩道を復旧しており、中原ICより名古屋側上下線で歩道を設置する工事を施工しています。
 工事区間においては、終日路肩規制にて施工しています。
 また、工事工期は3月24日まで延期を予定しています。皆様には、しばらくの間、ご不便をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願い致します。



藤井ICより豊橋側 起点から終点を望む

中原IC周辺 終点から起点を望む (下り線側)

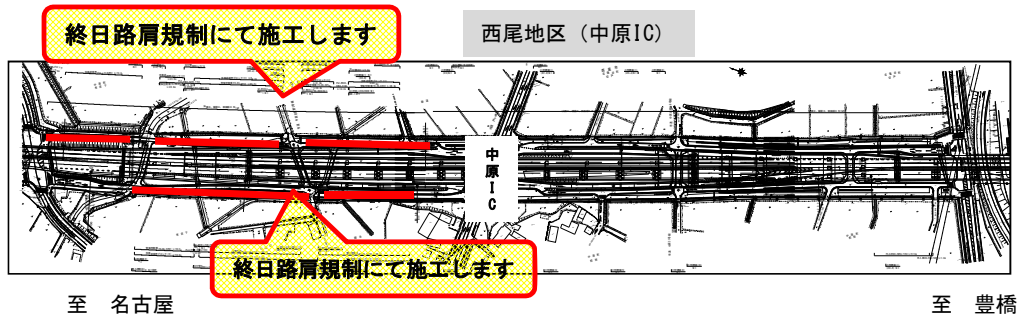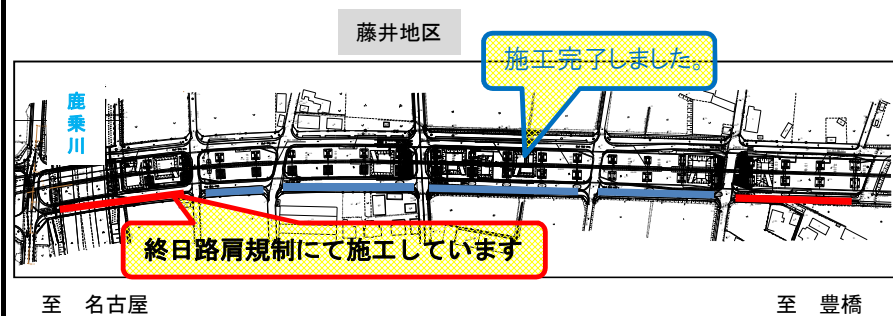

至 名古屋

至 豊橋

至 名古屋

至 豊橋
