


櫛田川通信

櫛田川出張所
第 5 号
平成21年2月

(櫛田川支部工事安全衛生協議会)

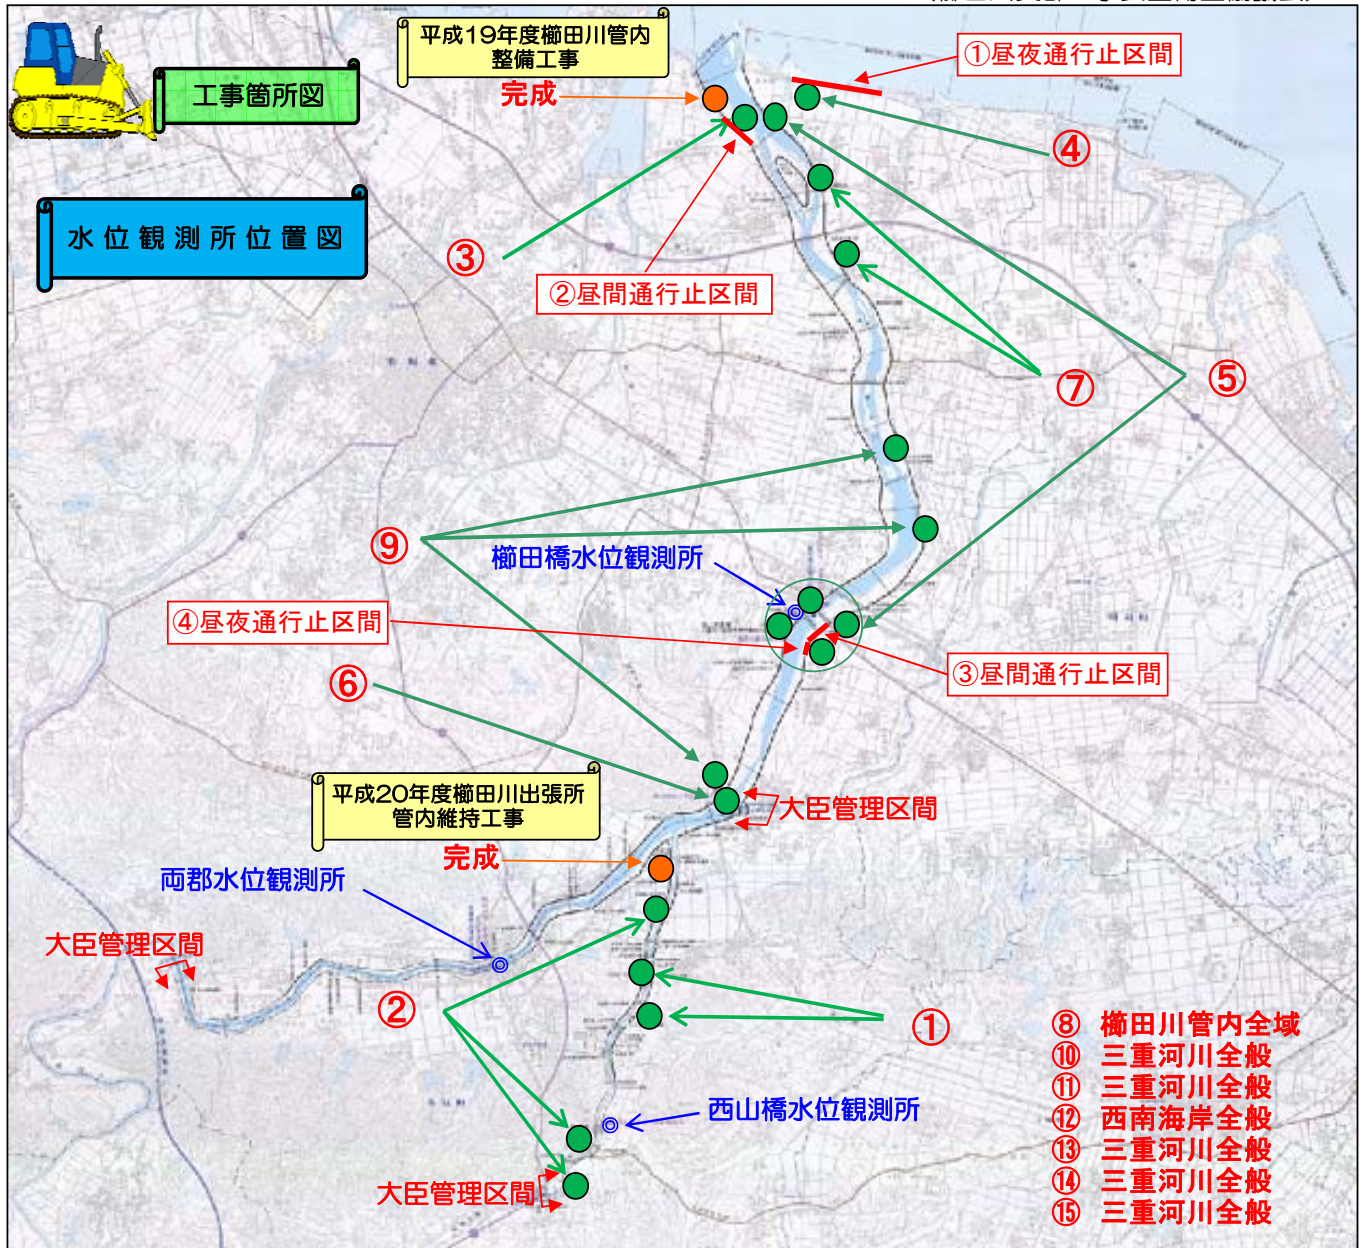

工事に伴う通行規制

- ① 昼夜通行止区間
- ② 昼間通行止区間
- ③ 昼間通行止区間
- ④ 昼夜通行止区間

箇所：松名瀬海岸～東黒部漁港（堤防天端）
期間：～平成21年3月10日まで（予定）

箇所：高須堤防天端
期間：～平成21年3月25日まで（予定）

箇所：松阪市目田町 地先
期間：～平成21年3月25日まで（予定）

箇所：「ホテルあおい」～上流区間（堤防天端）
期間：～平成21年3月25日まで（予定）

No	工 事 名	進捗率%	工 期 末	請 負 者
①	平成19年度 佐奈川五佐奈災害復旧工事	87%	～21. 02. 27	丸亀産業(株)
②	平成20年度 佐奈川災害復旧工事	80%	～21. 03. 10	藤田土木(株)
③	平成20年度 櫛田川高須高潮堤防工事	67%	～21. 03. 25	中井土木(株)
④	平成20年度 西南海岸松名瀬堤防工事	61%	～21. 03. 10	(株)カドヤ
⑤	平成20年度 櫛田川法田地区築堤護岸工事	73%	～21. 03. 25	(株)カドヤ
⑥	平成20年度 櫛田川可動堰機械設備修繕工事	50%	～21. 03. 27	三菱重工鉄構エンジニアリング(株)
⑦	平成20年度 櫛田川東黒部堤防整備工事	15%	～21. 03. 27	松阪土建(株)
⑧	平成20年度 櫛田川出張所管内河川維持工事	40%	～21. 03. 24	松阪土建(株)
⑨	平成20年度 櫛田川出張所管内整備工事	20%	～21. 03. 24	(株)宮本組
⑩	平成20年度 三重河川情報監視設備工事	—	～21. 03. 26	日立国際電気(株)
⑪	平成20年度 三重河川情報通信線布設工事	—	～21. 03. 27	日本電話施設(株)
⑫	平成20年度 西南海岸整備工事	—	～21. 03. 10	(株)宮本組
⑬	平成20年度 三重河川国道管内営繕関係整備工事	—	～21. 03. 25	(株)山口工務店
⑭	平成20年度 三重河川通信設備整備工事	—	～21. 03. 27	日立国際電気(株)
⑮	平成20年度 三重管内河川機械設備整備工事	—	～21. 03. 27	宇野重工(株)

平成19年度櫛田川管内整備工事

完成

無災害で工事を完成する事が出来ました。
長らくありがとうございました。



現場代理人・監理技術者
森田 清文

施工者 株式会社 カドヤ
TEL 0598-51-9133



着手前



完成

左岸0.1k高須工区

平成20年度櫛田川出張所管内維持工事

完成

皆様のご協力のもと無事に工事を完了することが
できました。
今後ともよろしくお願いします。



現場代理人・主任技術者
宇田 陽介

施工者 松阪土建株式会社
TEL 0598-21-1335



着手前



完成

佐奈川左岸0.2k

平成19年度佐奈川五佐奈災害復旧工事

進捗率 87%

現在、法覆護岸工が完了したところです。
これから根固め工（捨石）→仮設撤去→河川土工（残土処理）の施工を順次行います。

施工者 丸亀産業株式会社
TEL 0598-53-9111

地球にいいことしよう！



現場代理人・監理技術者
浅沼 哲也



佐奈川右岸2.6k
下流側より望む

平成20年度佐奈川災害復旧工事

進捗率 80%

現在、西山工区においては舗装工の作業をしています。五桂工区においてはブロック積工、階段工、根固め工の施工を進行中です。2月は五佐奈地区において、河床掘削の施工予定です。



現場代理人
木村 守道



監理技術者
沼田 俊彦

施工者 藤田土木株式会社
TEL 0598-58-0008



佐奈川左岸4.4k(西山)



佐奈川右岸5.2k(五桂)

平成20年度櫛田川高須高潮堤防工事

進捗率67%

高須～西黒部地区で、高潮堤防工事を行っています。現在、堤防道路上を昼間通行止にし、堤防最上段の波返し施工を行っています。今後は、引き続き波返し部の施工と、坂路の取付などを行っていきます。3月末頃完成予定です。



現場代理人
水谷 隆至



監理技術者
中村 仁

施工者 中井土木(株)
TEL 0598-51-7565



左岸0.6k

平成20年度西南海岸松名瀬堤防工事

進捗率61.2%

コンクリート被覆工の施工を行っています。
現在4班体制で工期に向かって、工事を進めています。3月早々には、斜路舗装を行う予定です。



現場代理人・監理技術者
中谷 憲司

施工者 株式会社 カドヤ
TEL 0598-59-0680



松名瀬堤防 No.93付近

平成20年度櫛田川法田地区築堤護岸工事

進捗率 73.6%

当初契約工事は、ほぼ完了しました。
第1回変更により、法田工区(築堤・護岸)及び、新たに松名瀬工区が増工となり、工期が延長となりました。1月末より増工分の工事へ着手します。



現場代理人・監理技術者
南条 弘幸

施工者 株式会社 カドヤ
TEL 0598-28-8860



右岸7.8k(法田低水工区)

平成20年度櫛田川可動堰機械設備修繕工事

進捗率65%

整備工事
塗装作業が完了し交換品・整備品の取付を実施中。
工場製作品が順次到着し取付を待っています。
先日の増水で流失した仮設橋の盛土も大型土嚢増強を含め復旧しました。



現場代理人
岡出 毅彦



専任技術者
吉江 和彦

施工者 三菱重工鉄構エンジニアリング株式会社
TEL 0598-28-6022 (櫛田川作業所)

扉体整備品到着



扉体塗装完了内・外面
(櫛田川可動堰)



仮橋復旧 上流側
トンパック増強



左岸10.5k
(櫛田川可動堰)



平成20年度櫛田川出張所管内河川維持工事

進捗率15%

櫛田川、佐奈川、祓川にて、河川の緊急的な工事及び小規模な維持工事を行っています。
より良い河川にするため、緊急的な工事等で近隣の皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。



現場代理人・主任技術者

施工者 松阪土建株式会社
TEL 0598-21-1335



塵芥処理



可動堰網場ゴミ処理

櫛田川出張所管内

櫛田川右岸10.2k付近

平成20年度櫛田川東黒部堤防工事

進捗率40%

現在、松名瀬工区川表側で旧構造物撤去・基礎工・1次盛土が完了しました。引き続き、コンクリートブロック張工・2次盛土・張芝工を施工する予定です。松名瀬工区川裏側・東黒部工区におきましては、ブロック積工を行っています。地元の方々には大変御迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力下さいますようよろしくお願いします。



現場代理人
河口 辰夫



監理技術者
生駒 貴矢

施工者 松阪土建株式会社
TEL 0598-21-1335



松名瀬工区（右岸1.6k）



東黒部工区（右岸2.6k）

平成20年度櫛田川出張所管内整備工事

進捗率 20.0%

河川の整備及び台風等災害の為に洪水対策の伐木、備蓄ブロックの製作及び水路整備の工事を行っています。

工事期間中はご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力よろしくお願いします。



現場代理人・監理技術者
杉坂 正博

施工者 株式会社 宮本組
TEL 0598-51-4545



高木工区 右岸6.2k
根固めブロック製作箇所



川島工区 伐木・除根予定箇所
右岸3.6k 3.8k

平成20年11月15日(土)
『川と海のクリーン大作戦(佐奈川)』(シャープ㈱主催)
を実施しました。

収 集 風 景



佐奈川の情緒豊かな景色を守るため、川の周辺の美化を実施しました。
当日は、小雨降る中一般参加157名を含む168名が参加。
今年度は、『川と海のクリーン大作戦』全体で総数一般参加383名を含む552名の皆様にご協力頂きました。ゴミの集計は、松名瀬・中万地区で5.8㎡、高須・佐奈川地区で810kgでした。ご協力ありがとうございました。

実施状況



河川の水位や雨の情報

三重河川国道事務所のHP

(<http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/>)

インターネット版

<http://www.river.go.jp>

iモード版

<http://i.river.go.jp>

櫛田川出張所へのアクセス



ご意見・ご感想等のご連絡はこちらへ

国土交通省	三重河川国道事務所	櫛田川出張所
松阪市豊原町1341-1	tel	0598-28-2265
	fax	0598-28-6798

大空高く舞う” 手作り凧揚げ大会”

平成21年2月1日（日）松阪市高須町の櫛田川河川敷モーターグライダー滑空場で、開かれました。「年配者から子供までの広い世代間の交流や地域のふれあい、昔の遊びの凧を現代の子供達に伝える」ことを目的として「西黒部町民凧揚げ大会」が開催されて今年で14回目を迎えました。当日は、昨日からの強風の中約300人の地元の子供からお年寄り、町外の人々の見物の中、盛大に行われました。

参加者風景



舞い上がる凧



強風で迷走する凧



力作の一品

