



暑さますます厳しく、しのぎがたい毎日が続いております。

だれもが暑さでうちしおれているなかで、ひまわりだけが咲き誇っています。

中勢バイパスは開通を目指し、私たち工事関係者も安全に努め頑張っているところであります。

しばらくの間、皆さまにはご迷惑をお掛けしますがご理解・ご協力を引き続きお願い致します。



**平成26年6月21日に日本で18件目となる世界遺産に
「富岡製糸場と絹産業遺産群」が登録されました。
日本の近代化、経済・産業発展の歴史を物語る
証拠であります。三重県からは少し遠いですが、
一度見に行ってみてはどうでしょう？**



富岡製糸場のあらまし



富岡製糸場は明治5年(1872年)、明治政府が近代化のために最初に設置した模範器械製糸場です。

明治維新後、政府は日本を外国と対等な立場にするため、産業や科学技術の近代化を進めました。そのための資金を集める方法として、生糸の輸出が効果的だと考え、生糸の品質改善・生産向上と技術指導者を育成するため、洋式の繰糸器械を備えた模範工場を造ることにしました。



建築方法



主要な建物は木の骨組みに、壁に煉瓦を積み入れて造る「木骨煉瓦造」で建てられました。煉瓦という西洋の新しい材料を取り入れながら、屋根は伝統的な日本瓦で葺くなど、日本と西洋の建築技術を見事に融合して建てられました。



現在の状況



(東繭倉庫)

操糸場、東・西繭倉庫、外国人宿舎等の主要建物は、ほぼ創業当時の状態で良好に保存されています。

明治政府がつくった官営工場の中で、ほぼ完全な形で残っているのは富岡製糸場だけです。



① 平成24年度 23号稲生道路建設工事



法面の植生マットも完成し、工事は無事完了致しました。施工中は何かとご協力頂き大変ありがとうございました。

施工者 朝日土木株式会社
TEL 059-367-7621
現場代理人 豊田 芳彦
監理技術者 佐田 貴志

② 平成25年度 23号中勢道路標識工事

本線NO.1182付近



本線NO.1228付近



中勢バイパスの標識設置工事をします(株)キクテックです。工事は安全第一で進めていきますので、よろしくお願いします。
工事内容は今回供用予定区間の約6kmの標識工事を作業していきます。開通に向け標識基礎の作成を進めていきます。

3ヶ月予定工程

施工者 (株)キクテック 三重支店
Tel059-232-6131

現場代理人 富樫 昭夫
監理技術者 山下 廣幸

標識基礎設置

平成26年8月 9月 10月



③ 平成25年度 23号神戸北道路建設工事

中勢BP本線を北東側より望む



中勢BP本線を北西側より望む




中勢BPと県道雲出野田バイパス(将来)が立体交差となる場所の松阪市側で、道路構築工事を行っています。現在、中勢BP本線の土砂掘削と擁壁工事(上下線)がほぼ完了しました。今後は、9月末の完成に向けて、道路の盛土と防護柵の設置工事を行います。

施工者 アイトム建設 (株)
TEL: 059-253-8461
現場代理人 森田 大介
監理技術者 井田 貴宏

3ヶ月予定工程

道路土工
防護柵工

平成26年8月 9月 10月



④ 平成25年度 23号神戸跨道橋鋼上部工事

中勢バイパス下り側道から南側を見る



中勢バイパス上り側道から南側を見る



中勢バイパス本線と県道雲出野田バイパス(将来)が立体交差となる地点で、中勢バイパス本線の鉄の桁と車道部分のコンクリート工事を行っています。桁部分はほぼ完成したので、コンクリート部分を施工しています。


施工者 日本車輛設計株式会社
TEL: 059-253-3801

現場代理人 和田 昌浩
監理技術者 加藤 亨

3ヶ月予定工

合成床版
壁高欄工
足場工

平成26年8月 9月 10月



⑤ 平成25年度 23号神戸中部道路建設工事

本線NO,1131付近～



中勢バイパス開通に向け、本線の土砂掘削・運搬作業を進めています。
土砂掘削後、法面工、排水構造物工と順次進めていきます。

3ヶ月予定工程


施工者 株式会社 田村組

TEL:059-261-6969

現場代理人 中西 一万
監理技術者 中須 伸行

道路土工
法面工
排水構造物工

平成26年8月 9月 10月



⑥ 平成25年度 23号神戸南道路建設工事

中勢BP本線(神戸工区)



中勢BP(神戸～半田区間)にて擁壁工の施工を行っています。引き続き、擁壁工及び道路土工の施工を行っていきます。

中勢BP本線(久居工区)



中勢BP(久居桜ヶ丘)にて、遮音壁の基礎(コンクリート構造物)を施工しています。引き続き、遮音壁基礎の施工と本線道路の改良工事を進めて行きます。

3ヶ月予定工程

施工者 (株)谷口建設

TEL:059-253-7331

現場代理人 谷本 和也
監理技術者 中川 貴裕

道路土工
路床改良工
擁壁工
遮音壁基礎工

平成26年8月 9月 10月



⑦ 平成25年度 23号神戸1号橋鋼上部工事

大型クレーンによる架設状況



中勢BP本線 鈴鹿市方面を望む



神戸地先において、大型クレーンを使用して鋼桁の架設を7月末で完了しました。

施工者 佐藤鉄工 (株)
TEL:059-264-7261
現場代理人 碓井 勝巳
監理技術者 碓井 勝巳

3ヶ月工程

ヤード整備工
鋼桁架設工
足場工

平成26年5月 6月 7月

完

⑧ 平成25年度 23号久居北舗装工事

相川高架橋から撮影



本線No.1275～終点を撮影



中勢バイパスの久居相川町～久居野村町の舗装工事です。
久居停車場津線から元町孝行井戸線までの本線と接続する交差点部の整備も含めて工事を進めていきます。

施工者 岐建 株式会社
TEL:0584-81-2126

現場代理人 常川 裕司
監理技術者 今野 敦史

3ヶ月予定工程

舗装工
情報ボックス工
排水構造物工

8月 9月 10月

⑨ 平成25年度 23号久居南舗装工事

中勢BP本線 国道165号側から北を望む



中勢BP本線 国道165号側から北を望む



野村街道から国道165号接続までの約1.3kmを車が通行できるように工事をしております。
現在の作業内容ですが、国道165号と中勢バイパスが接続される場所で、側溝やブロックを設置しています。
引き続き、側溝やブロック、電気通信管等を中心に作業を進めていく予定です。

3ヶ月予定工程


施工者 福田道路(株) 中部支店
TEL:059-264-7032
現場代理人 新納 摂章
監理技術者 清水 一秋

排水構造物工
情報ボックス工
舗装工


平成26年8月	9月	10月

⑩ 平成26年度 23号久居相川舗装工事

久居停車場津線から北向きに撮影

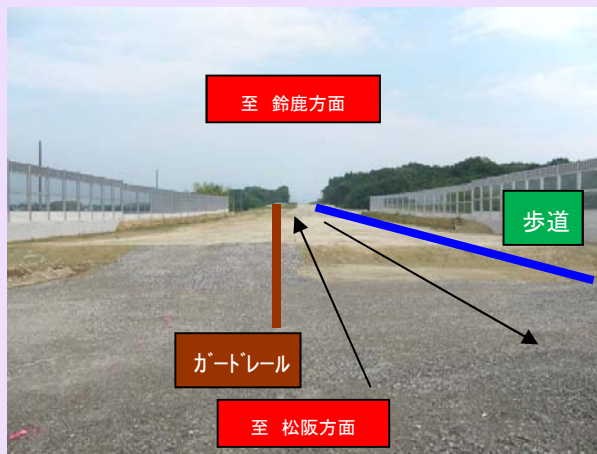

津久居線から南向きに撮影

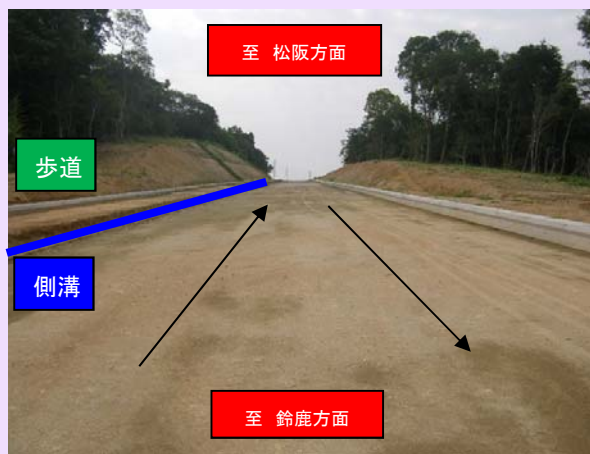

新規工事となります株式会社NIPPOです。災害ゼロを目標に工事を進めてまいります。
津市神戸～久居相川町までの本線と半田街道の交差点の取付けを含め、舗装工事を行います。
片側1車線対面交通、施工延長1.4kmで車両および歩行者が快適に通行できる道を作ります。

3ヶ月予定工程

施工者 株式会社 NIPPO
TEL:059-273-6191
現場代理人 佐柳 孝志
監理技術者 白鳥 雅之

準備工
道路土工
排水構造物工

平成26年8月	9月	10月

⑪ 平成26年度 23号小野辺側道舗装工事

(市道)桜ヶ丘脇田山団地線から
南側を望む(左側側道)



(市道)新町城山口線から
南側を望む(右側側道)




中勢バイパス12工区(津市久居小野辺町～野村町～高茶屋小森町 工事延長約2km)にて側道舗装工事を行います。工事起点(小野辺町)より順次、除草作業及び撤去作業を行い、構造物の施工に着手して行きます。沿道及び地域住民の皆様にご迷惑をお掛け致しますが、ご協力お願い致します。

施工者 東海土建株式会社
TEL 059-227-6101
現場代理人 兼平 隆明
監理技術者 巾 勇次

3ヶ月予定工程

準備工(除草作業)
撤去工(万能鋼板・フェンス)
側溝工



⑫ 平成26年度 23号神戸南舗装工事

神戸2号橋から撮影



本線No.1159～終点を撮影




中勢バイパスの津市神戸町の本線舗装工事です。神戸1号橋から神戸2号橋まで(神戸工区L=1.95kmの内L=569m)の本線の工事を進めていきます。


施工者 日本土建株式会社
TEL:059-253-7602
現場代理人 寺田 昭次
監理技術者 寺田 昭次

3ヶ月予定工程

道路土工
舗装工
排水構造物工



⑬ 平成26年度 23号野田ランプ舗装工事

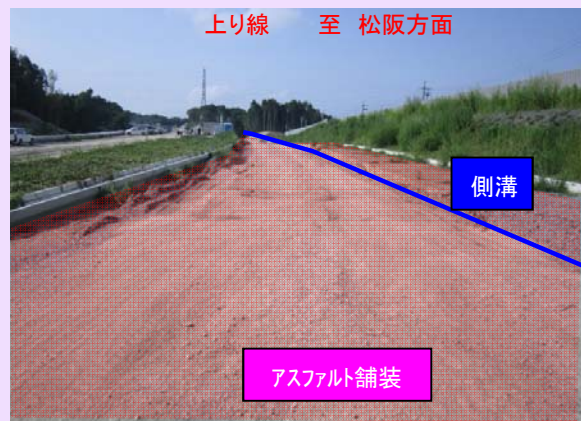


中勢バイパスの野田ランプを舗装する工事です。8月下旬から排水構造物の設置工事を行い、10月下旬頃から舗装工事に取り掛かる予定です。安全第一で作業を進めて参りますので、ご協力お願い致します。

3ヶ月予定工程

施工者 アイテム建設株式会社
TEL 059-253-8461
現場代理人 高橋 昭彦
監理技術者 鈴木 啓司

排水構造物工
舗装工



⑭ 平成26年度 23号中勢道路トンネル防災設備工事




中勢バイパスのトンネル防災設備(押ボタン通報装置・警報表示板・非常電話機)及び道路情報板を設置する工事です。10月中旬から現場着工予定です。

3ヶ月予定工程


施工者 名古屋電機工業(株)
TEL:052-443-0327
現場代理人 山本 浩二
主任技術者 熊谷 英明

準備工
配線工




⑮ 平成26年度 23号中勢道路照明設備工事

中勢BP本線を南側より高茶屋トンネル望む

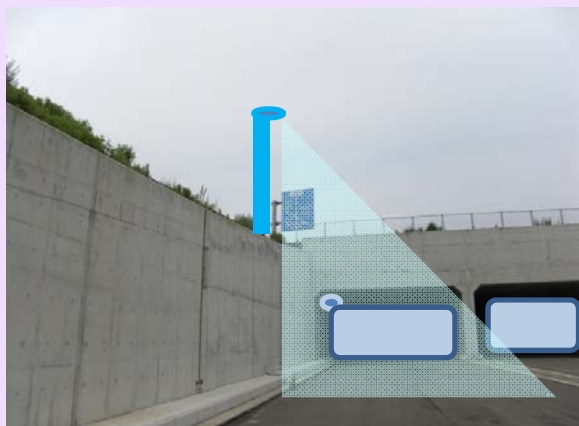

中勢BP本線を南東側より望む

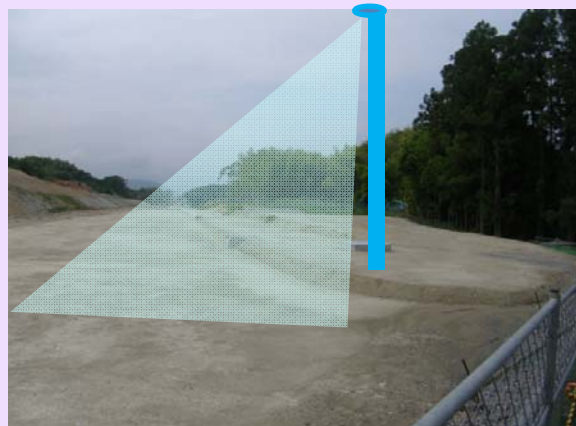

新規工事となります大岳電気工業(株)です。安全第一で工事を進めてまいりますのでよろしくお願いいたします。
工事の内容は、新設中勢バイパスと阿漕浦野田線から国道165号までの6交差点と野田ICランプ部、高茶屋トンネルの道路照明設備の設置工事を行います。ご協力お願いいたします。

3ヶ月予定工程

施工者 大岳電気工業株式会社


TEL 059-213-6060

現場代理人 中島 龍一

主任技術者 中島 龍一

準備工
道路照明設備設置工

平成26年8月 9月 10月




⑯ 平成26年度 23号野田舗装工事

おごえ川から北を望む



本線から南を望む

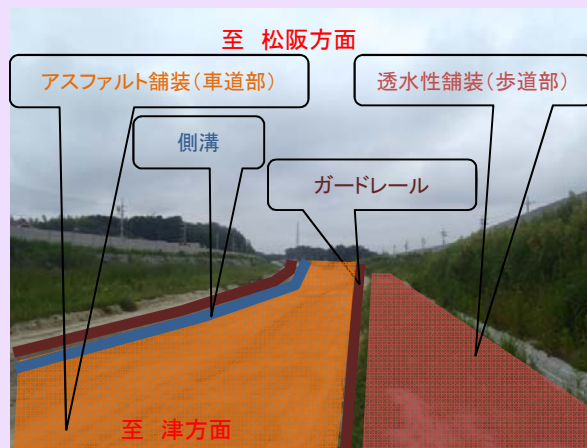

中勢バイパスにて新規工事を行います、株式会社佐藤渡辺です。よろしくお願いいたします。
工事内容は、県道657号(野田)～緑が丘間の約920m間のアスファルト舗装工事となります。
工事期間中は交通規制等にて、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力お願いいたします。

3ヶ月予定工程

施工者 株式会社佐藤渡辺


TEL:059-213-7233

現場代理人 森田 享太

監理技術者 中島 竜二

準備工
道路土工
排水構造物工

平成26年8月 9月 10月



⑰ 平成26年度 23号野村舗装工事

中勢BP開通区間 ～ 国道165号方面を望む

至 鈴鹿方面

舗装工事 → 区画線工事 → ガードレール設置工事と進めていきます。



至 松阪方面

中勢バイパスアンダーパス部の本線舗装工事を行います。国道165号付近から現在開通区間までのL=905.3m間です。開通に向けての最終工事となります。安全第一で進めていきますのでご協力をお願いします。


3ヶ月予定工程

施工者 日本土建株式会社
TEL:059-229-5656
現場代理人 高塚 幸宣
監理技術者 西川 充則

準備工

舗装工


平成26年8月 9月 10月



⑱ 平成26年度 23号神戸北舗装工事

本線工事起点側No.1100～終点を望む。

本線No.1126～終点を望む。

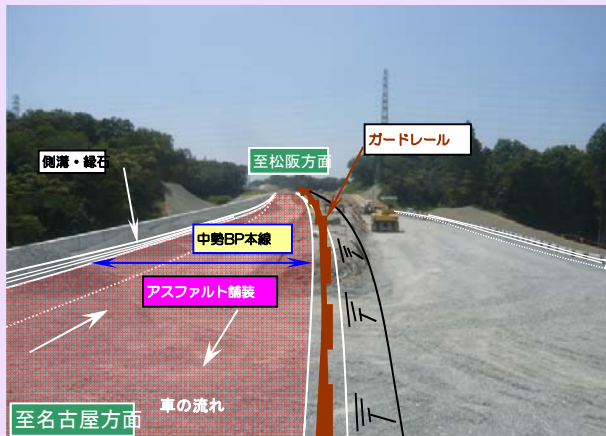

中勢バイパスの神戸北舗装工事を担当します(株)ガイアート・Kです。中勢バイパスと県道雲出野田バイパス(将来)が立体交差する箇所より松阪市側の約1.1kmの排水構造物、防護柵工、本線にてアスファルト舗装工、歩道舗装工等の工事を順次進めていきます。

施工者 (株)ガイアート・K中部支店
TEL:059-253-3768


現場代理人 村瀬 広泰

監理技術者 神谷 裕之


3ヶ月予定工程

準備工
道路土工
排水構造物工
情報ボックス工

平成26年8月 9月 10月



施工箇所見取図

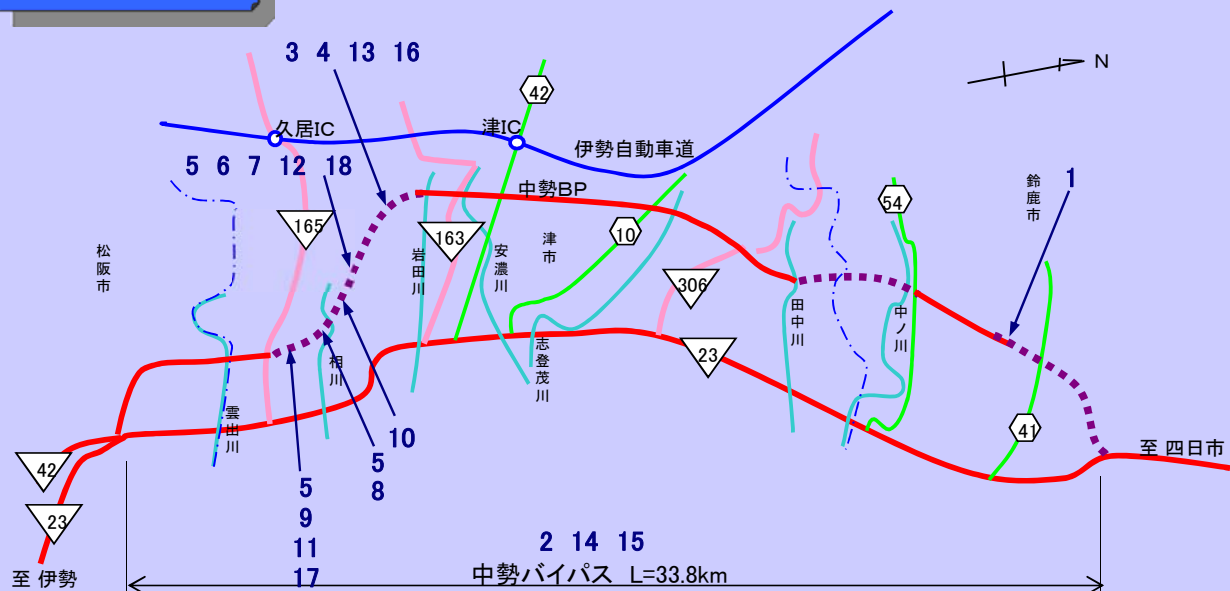

【工事一覧表】

No	工 事 名	工期	工 事 内 容	施 工 者
1	H24 23号稲生道路建設工事	～H26.8.4	道路土工・擁壁工 1式	朝日土木(株)
2	H25 23号中勢道路標識工事	～H27.1.16	道路標識工 1式	(株)キクテック
3	H25 23号神戸北道路建設工事	～H26.9.30	道路土工・擁壁工 1式	アイトム建設(株)
4	H25 23号神戸跨道橋鋼上部工事	～H26.9.30	橋梁上部工 1式	日本車輛製造(株)
5	H25 23号神戸中部道路建設工事	～H26.9.30	道路土工・擁壁工 1式	(株)田村組
6	H25 23号神戸南道路建設工事	～H26.11.28	道路土工・擁壁工 1式	(株)谷口建設
7	H25 23号神戸1号橋鋼上部工事	～H26.8.25	橋梁上部工 1式	佐藤鉄工(株)
8	H25 23号久居北舗装工事	～H27.1.30	舗装工 排水構造物工 1式	岐建(株)
9	H25 23号久居南舗装工事	～H27.1.23	舗装工 排水構造物工 1式	福田道路(株)
10	H26 23号久居相川舗装工事	～H27.2.6	舗装工 排水構造物工 1式	(株)NIPPO
11	H26 23号小野辺側道舗装工事	～H27.3.10	舗装工 排水構造物工 1式	東海土建(株)
12	H26 23号神戸南舗装工事	～H27.1.27	舗装工 排水構造物工 1式	日本土建(株)
13	H26 23号野田ランプ舗装工事	～H27.1.27	舗装工 排水構造物工 1式	アイトム建設(株)
14	H26 23号中勢道路トンネル防災設備工事	～H27.1.30	防災設備工 1式	名古屋電機工業(株)
15	H26 23号中勢道路照明設備工事	～H27.1.30	照明設備工 1式	大岳電気工業(株)
16	H26 23号野田舗装工事	～H27.1.29	舗装工 排水構造物工 1式	(株)佐藤渡辺
17	H26 23号野村舗装工事	～H27.1.27	舗装工 排水構造物工 1式	日本土建(株)
18	H26 23号神戸北舗装工事	～H27.1.29	舗装工 排水構造物工 1式	(株)ガイアート・T・K

ご覧になったご感想や
ご意見がございましたら
右記の連絡先まで
お寄せ下さい。

本紙で紹介している工事の「今後の予定工程」は、
天候その他の事情により変更となる場合がありますので
あらかじめご了承ください。

【連絡先】

〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8
三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
tel 059-387-8470 fax 059-387-8471

または

〒514-0824 津市神戸881
中勢BP工事連絡協議会事務局(アイトム建設(株)内)
tel 059-253-8461 fax 059-253-8462
