



ちゅうばす通信

中勢BP連絡協議会

朝夕はめっきり涼しくなりましたが、皆様にはいつもながらお変わりなく何よりに存じます。

中勢バイパスの工事も先月から今月にかけて新しい業者が決まりました。「平成27年度23号中勢道路整備工事」は(株)松本組が施工することになりました。中勢バイパス全体が工事区域ですが主には津市で遮音壁などの設置工事をします。もう一つは、「平成27年度23号越知地区道路建設工事」です。三重農林建設(株)が施工します。中ノ川右岸で水路の切り回し工事が主な仕事です。近隣の皆様にはいろいろご不便やご迷惑をおかけしますがよろしくお願ひします。

9月7日に職員研修の一環として「施工技術研修」を実施しました。三重河川国道事務所の職員は、私のように監督員にならないと、なかなか現場に行くことがなく机の上の業務ばかりになってしまいます。やはり、現場の施工を知ることが大切だということでこういった研修を実施しています。



出張所で育てていたジャンボオクラは、まだ生育が進行しているようで、台風のために室内に避難させたところ、もう5cmくらいで天井に届く勢いです。相変わらず、大きなオクラを生み出していますが、湯がいても硬くて評判が悪いです。残念！現在、195cm。200cm越えも視野にはいっています！

そろそろ次期の候補を探しています。今度は綺麗な花を咲かせようと思っています。

①平成26年度 23号中ノ川高架橋下部工事



鈴鹿市御園町地内において橋梁下部工事を行っております。工事期間中は、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い致します。

施工者 日本土建(株)
TEL059-389-7223
現場代理人 伊藤 憲一
監理技術者 中川 基司

3ヶ月予定工程



②平成26年度 23号鈴鹿・津地区道路建設工事

本線NO.1315~1319左(高茶屋工区)




本線NO.1315~1319右(高茶屋工区)



中勢ハイパス津市高茶屋工区及び津市久居野村町工区において、側道整備工事を行っております。
高茶屋工区の進捗状況・・・10月中旬までに歩道部の張コンクリートが完了となり、
10月下旬ごろ、側道舗装・歩道舗装の完了を予定しています。
野村工区の進捗状況・・・縁石工(歩車道境界ブロック)を施工中、10月中旬から舗装工の予定。

施工者 三重農林建設(株)
TEL059-232-0603
現場代理人 大家 裕貴
監理技術者 小島 久典

3ヶ月予定工程



③平成26年度 23号鈴鹿・津地区整備工事

本線NO.495付近(終点側)

9月16日現在



本線NO.467付近(起点側)

ボックスカルバート施工箇所



中勢バイパスの整備工事をします三重農林建設です。工事は安全第一で進めていきますので、よろしくお願いします。工事内容は三行地区で区間約0.6kmの工事用道路作る作業していきます。現在、工事用道路を作る為の伐採作業とボックスカルバートの作業ヤードの整備行っています。10月中旬以降に掘削・土の搬出を予定しています。

3ヶ月予定工程

施工者 三重農林建設(株)
Tel.059-232-0555

現場代理人 内田 啓介

監理技術者 青木 則正


	平成27年9月	10月	11月
道路土工		■	■
地盤改良工			■
仮設工	■	■	
準備工(伐採・除根)	■		

④平成26年度 23号鈴鹿地区道路建設工事

地盤改良工

本線NO.1182付近

至 津方面

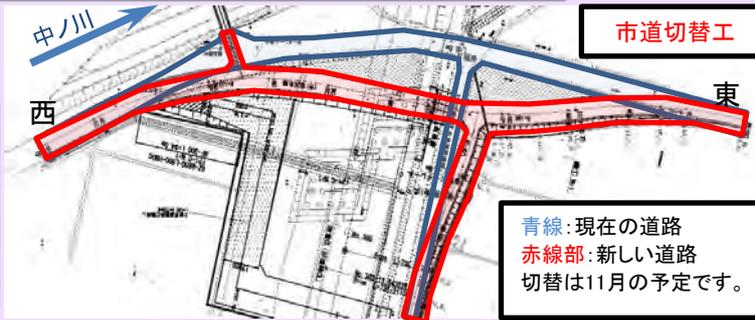

市道切替工

青線:現在の道路
赤線部:新しい道路
切替は11月の予定です。

株式会社アイケーディです。軟弱地盤の改良工事と市道栄天名線(中ノ川の右岸堤防道路)の切替えを行っていきます。地盤改良工は現在機械足場の準備が出来、いよいよ大きな機械で深いところの改良を来年1月頃まで行う予定です。改良にあたっては粉塵の抑制等につとめて施工してまいります。市道切替工に関しては一部交通規制をかけた後、夜間作業も予定しています。事故のないように努めていきますのでご協力お願いします。

東からみた図



施工者 (株)アイケーディ
Tel.059-225-7117

3ヶ月予定工程

現場代理人 石田 義信

監理技術者 後藤 博伸

	平成27年10月	11月	12月
市道切替工	■		
地盤改良工・仮設工	■	■	■

⑤平成27年度23号中勢道路整備工事

このたび、中勢バイパスの整備工事を行うこととなりました(株)松本組です。
 施工範囲は、鈴鹿市北玉垣町～松阪市小津町(L=33.8km)となります。
 施工期間中は、安全第一を考えて施工を進めていきますので、これから宜しくお願い致します。
 現在は、施工準備を行っており、9月末から11工区雲出野田線の掘削及び場内残土運搬を行っていく予定です。

11工区県道久居線 スロープ



工事内容は、中勢バイパス本線から旧県道へ向いて、盛土及び舗装等を行い、歩道を設置します。
 施工時期は、平成27年11月初旬からを予定しております。

12工区相川高架橋下整備



工事内容は、排水溝・舗装・立入禁止柵等の設置を行います。
 施工時期は、11月末からを予定しております。

12工区野村街道交差点 遮音壁



工事内容は、交差点から側道へ向いて遮音壁を設置します。施工時期は、平成28年1月末からを予定しております。

13工区木造市道擁壁



工事内容は、舗装の痛んでいる所を削り取り、その上に新たに舗装する作業と痛んだ水路を撤去し、擁壁の設置及び水路を復旧する作業を行います。
 施工時期は、平成27年10月初旬からを予定しております。

3ヶ月予定工程


施工者 (株)松本組
 TEL0598-42-2266

現場代理人 川口 直也


監理技術者 羽根 俊幸

11工区雲出野田線
 11工区県道久居線 スロープ
 12工区相川高架橋下整備
 13工区木造市道擁壁

平成27年9月 10月 11月



施工箇所見取図

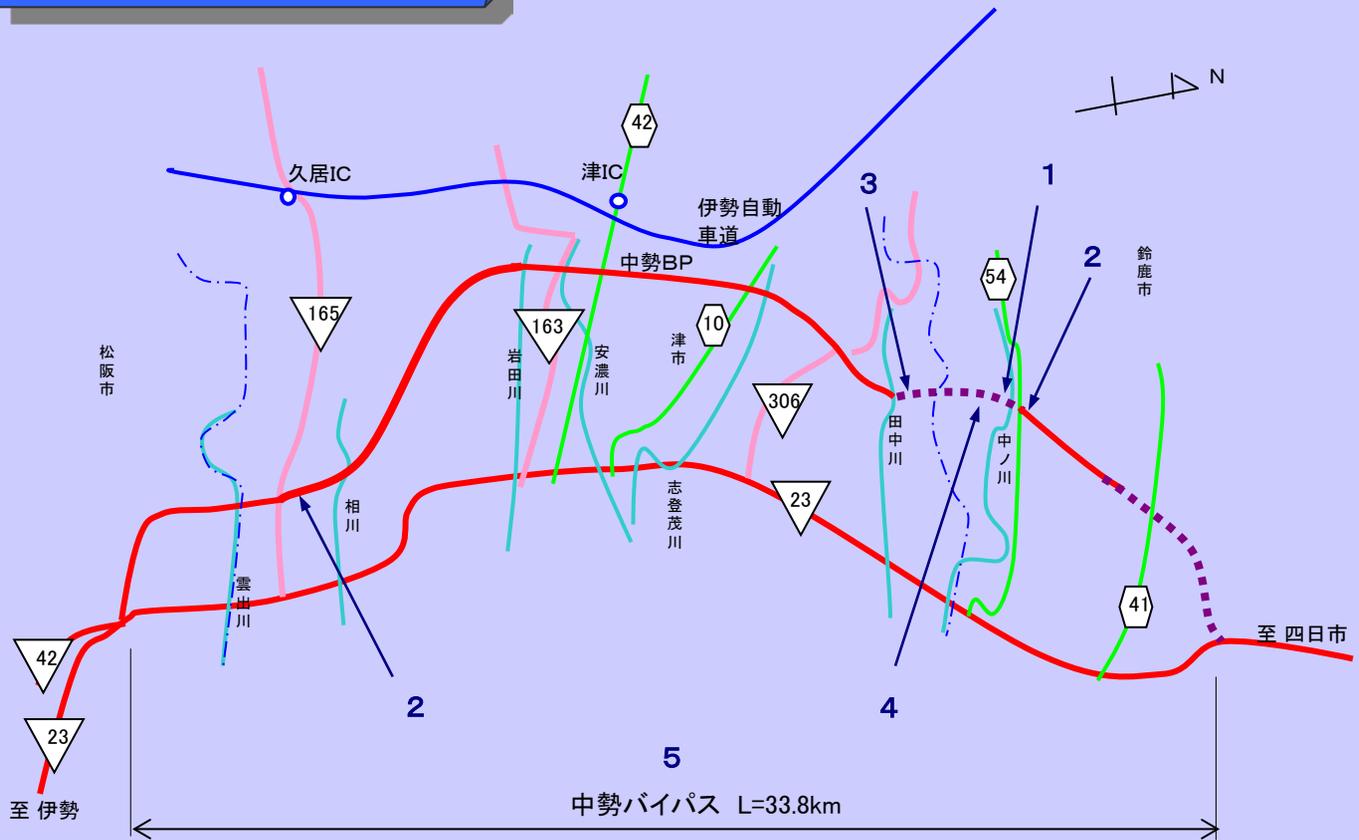

【工事一覧表】

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
1	H26 23号中ノ川高架橋下部工事	H27.10.30	橋梁下部工	日本土建(株)
2	H26 23号鈴鹿・津地区道路建設工事	H28.3.18	橋梁下部工、排水工、除草	三重農林建設(株)
3	H26 23号鈴鹿・津地区整備工事	H28.2.29	道路土工、カルバート工	三重農林建設(株)
4	H26 23号鈴鹿地区道路建設工事	H28.2.29	地盤改良工	(株)アイケーディ
5	H27 23号中勢道路整備工事	H28.3.18	遮音壁工、排水工、土工	(株)松本組

ご覧になった
ご感想やご意見等が
ございましたら
右記の連絡先まで
お寄せ下さい。

【連絡先】

〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8
三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
tel 059-387-8470 fax 059-387-8471

または

中勢BP工事連絡協議会事務局
(三重農林建設(株)内)
tel 059-232-0603

※本紙で紹介している工事の「今後の予定工程」は、天候その他の事情により変更となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。
