



あゆばす通信

Route23
CHUSEI
BYPASS

Communication

現場情報など各種掲載

中勢BP工事連絡協議会



今月号のラインナップ



- 4工区（鈴鹿（安塚）工区）の進捗状況について（1年での比較写真）
- 12月の工事進捗状況と今後の予定

4工区（鈴鹿（安塚）工区）の進捗状況について（1年での比較写真）

令和2年10月撮影



令和3年11月撮影



令和2年11月撮影



位置図



令和3年10月撮影



4工区（鈴鹿（安塚）工区）の進捗状況について、以前の状況と写真で比較をしてみると、すっかり景色が変わったことが分かります。令和5年度開通に向けて、今後も安全第一で工事を行ってまいりますので、今年もどうぞご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。



令和2年11月撮影



令和3年12月撮影



中勢バイパス4工区 工事進捗状況と今後の予定

末広地区



剛性防護柵基礎工事
安塚川支川付替作業
市道 末広千代崎線

工事⑬	23号末広道路建設工事 (株)松本組	進捗率	38%
-----	-----------------------	-----	-----

今月は安塚川支川付替作業、本線の剛性防護柵基礎工事を行っています。安全第一で工事を行っています。

安塚・末広地区



工事完成

工事⑧	23号安塚・末広地区道路建設工事 三重農林建設(株)	進捗率	100%
-----	-------------------------------	-----	------

昨年10月に始まったこの工事も、おかげさまで12月末に無事工事完了致しました。工事中はご理解・ご協力のほどありがとうございました。

玉垣地区




盛土工事
補強土壁工事
山上池

工事⑬	23号北玉垣東道路建設工事 (株)杉本組	進捗率	89%
-----	-------------------------	-----	-----

今月も引き続き本線部の補強土壁工事、盛土工事の施工を行います。作業中の騒音・粉塵に配慮して工事を安全に進めていきます。


玉垣地区

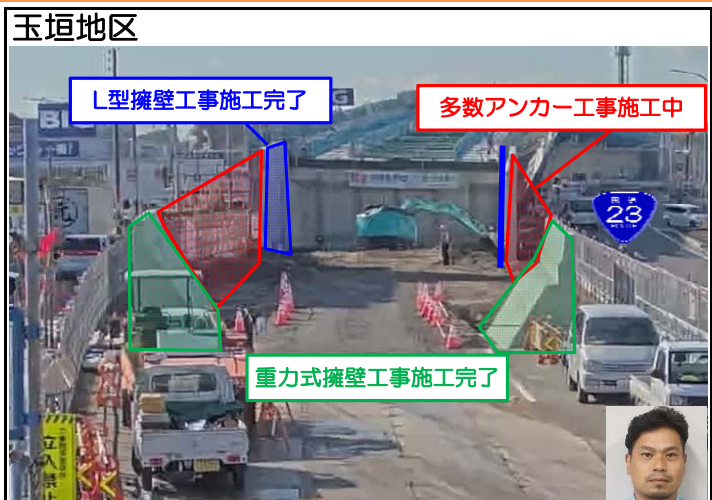

L型擁壁工事施工完了
多数アンカー工事施工中
重力式擁壁工事施工完了

工事⑭	23号北玉垣北道路建設工事 丸亀産業(株)	進捗率	40%
-----	--------------------------	-----	-----

L型式擁壁工事、重力式擁壁工事の施工が完了し、多数アンカー工事を本格的に施工中です。風が強い日が多くなりますが、飛散物に注意し作業を行います。

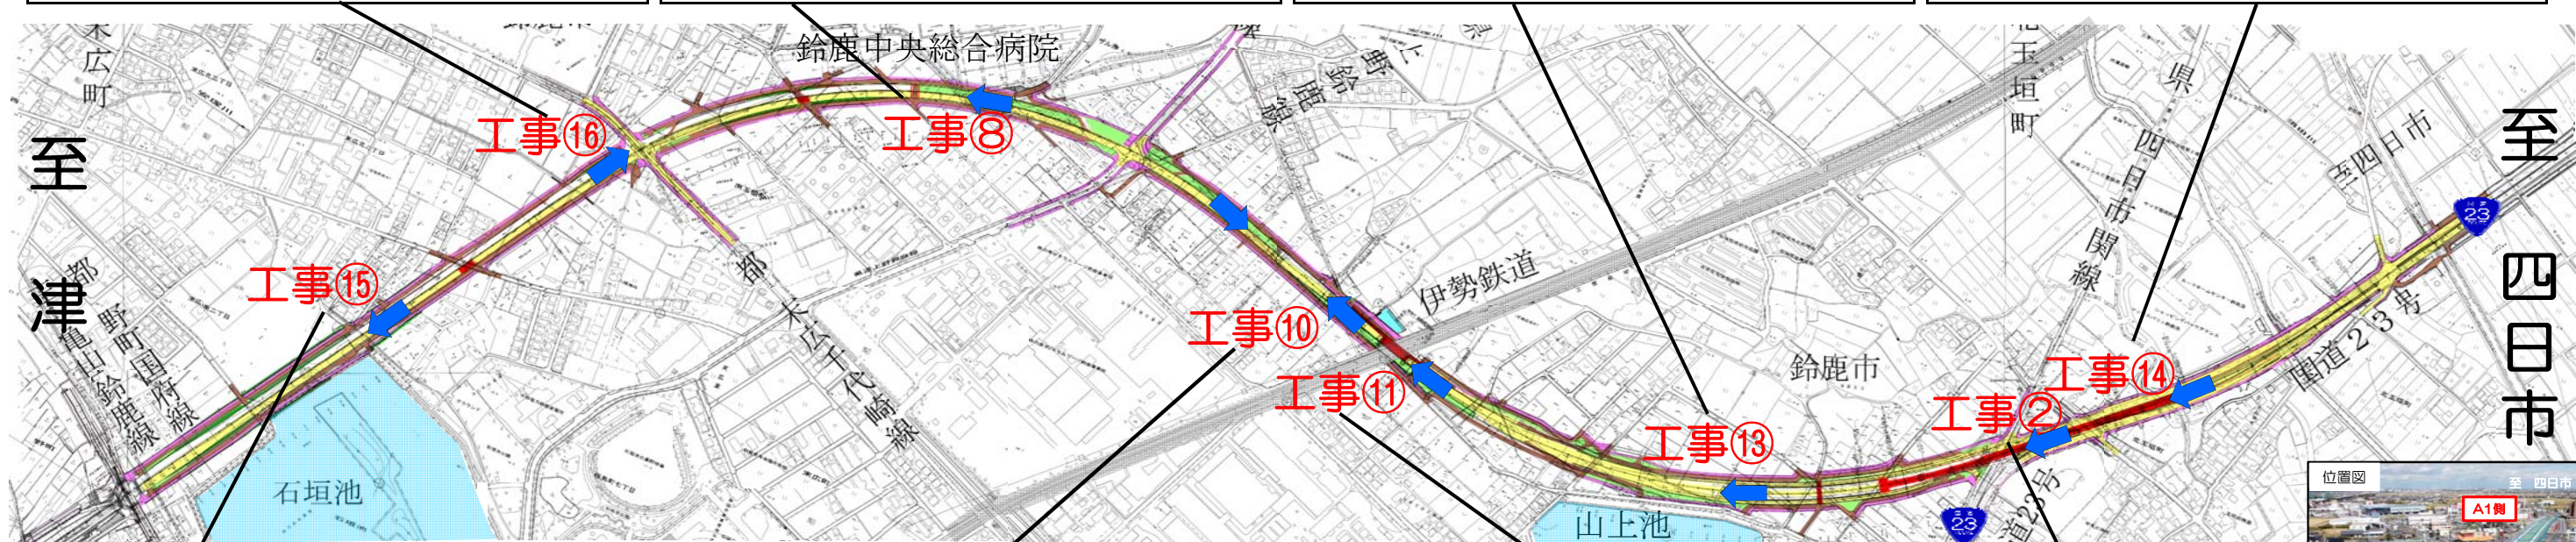

末広地区



県道 亀山鈴鹿線
石垣池
歩道
側道車道

工事⑮	23号中勢道路整備工事 朝日土木(株)	進捗率	55%
-----	------------------------	-----	-----

本工事で石垣池前から県道亀山鈴鹿線までの間の下り線側側道部の舗装を行います。石垣池の遊歩道近くで施工を行うので、遊歩道利用の方の安全に留意し施工を行っています。

玉垣地区



補強土壁工事
排水構造物工事
踏掛版工事

工事⑩	23号玉垣地区道路建設工事 中井土木(株)	進捗率	80%
-----	--------------------------	-----	-----

今月は補強土壁工事、排水構造物工事、踏掛版工事を行います。ダンプトラックが頻繁に出入りするので、粉塵や道路汚損に注意して、安全第一で工事を進めていきます。

玉垣地区




伊勢鉄道

工事⑪	23号玉垣跨線橋上部工事 川田工業(株)	進捗率	78.6%
-----	-------------------------	-----	-------

12月末に床版コンクリートの打設が完了しました。引き続き壁高欄、歩車道境界等のコンクリート打設を行います。周辺環境への粉塵や騒音に注意して工事を進めていきます。

玉垣地区

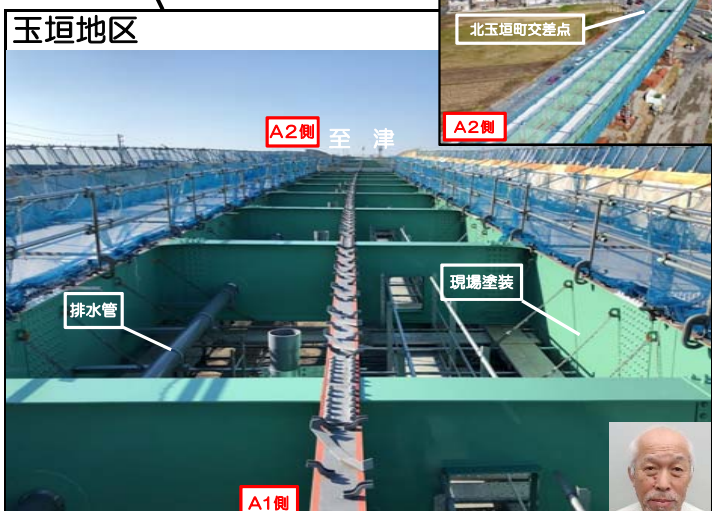

A2側 至津
現場塗装
排水管
A1側

工事②	23号北玉垣高架橋鋼上部工事 (株)駒井ハルテック	進捗率	97%
-----	------------------------------	-----	-----

いよいよ現場施工最終段階となります。飛来落下飛散防止等に注意して、現場塗装作業及び排水装置設置作業を安全第一で進めて参ります。

道路緊急
ダイヤル **#9910**
