



平成 26 年 7 月 16 日 10 時 00 分
中 部 地 方 整 備 局

土石流災害の南木曾町へ TEC-FORCE 隊を派遣（第 8 報） ～ 県道 264 号 梨子沢橋の仮橋が完成～

中部地方整備局は、長野県の要請を受け、7 月 13 日以降土石流被害を受けた長野県木曾郡南木曾町へ、TEC-FORCE 隊・橋梁架設支援チームを派遣してきました。

今般、県道 264 号 梨子沢橋の仮橋が完成し、TEC-FORCE 隊・橋梁架設支援チームの活動が終了しましたので、お知らせします。

1. 中部地方整備局からの派遣状況

○ TEC-FORCE

橋梁架設支援チーム 7 月 13 日～7 月 16 日（延べ 13 名）

飯田国道事務所

7 月 16 日撮影



写真①



写真②

※上記写真データについては、<http://www.cbr.mlit.go.jp/saigai/NEWS/MAIN/140716TEC08.pdf> にアクセスし、ダウンロードしてください。

2. 配布先

中部地方整備局記者クラブ、飯田市役所記者クラブ、木曾合同庁舎記者室、塩尻桔梗ヶ原記者クラブ

3. その他

関連記者発表：H26.7.16 長野県南木曾町 県道 264 号 梨子沢橋の仮橋完成の見通し
(飯田国道事務所)

4. 問い合わせ先

中部地方整備局 総務企画官	北村 智昭	052-953-8256
入札契約監査官	岡森 文男	
道路管理課長補佐	鈴木 克章	052-953-8176
道路管理課長補佐	野田 茂樹	



平成26年 7月16日

長野県木曾建設事務所

国土交通省中部地方整備局
飯田国道事務所

長野県南木曾町 県道264号梨子沢橋の仮橋完成の見通し

1. 概要

県道264号梨子沢橋については、台風8号による土石流被害によって損傷を受けました。このため、長野県では飯田国道事務所が所有する仮橋の貸与を受け、設置を進めてきました。

このたび、仮橋の架設工事が進み、本日10時に完成（開通）することとなりましたので、お知らせします。

2. 完成時期（予定）

平成26年7月16日（水） 10:00

3. 資料

別添1：これまでの経緯、仮橋設置位置図

別添2：進捗状況写真

4. 記者発表資料 配布先

長野県庁会見場、飯田市役所記者クラブ、木曾合同庁舎記者室、
塩尻桔梗ヶ原記者クラブ

5. 問い合わせ先

長野県木曾建設事務所

整備課長 向山 秀樹

TEL 0264-25-2240

FAX 0264-22-4028

国土交通省中部地方整備局飯田国道事務所

副所長 坂地 光博

調査設計課長

草野 真史

TEL 0265-53-7200

FAX 0265-53-7210

道路の異状を発見したら・・・道路緊急ダイヤル **#9910**（通話料無料・24時間受付）

1. これまでの経緯

7月11日(金)

- ・長野県から中部地方整備局に対し、橋梁調査の要請
- ・中部地方整備局から橋梁調査のためテックフォース2名を派遣
- ・調査の結果、損傷状況は大変厳しい状況
- ・長野県から中部地方整備局に対し、仮橋設置検討の依頼
- ・中部地方整備局から仮橋設置検討のためテックフォース4名を派遣

7月12日(土)

- ・仮橋設置検討及び準備

7月13日(日)

- ・仮橋設置の準備及び架設着手
- ・中部地方整備局から仮橋架設の技術支援のため、テックフォース4名を派遣

7月14日(月)

- ・仮橋架設工事を継続
- ・中部地方整備局から仮橋架設の技術支援のため、テックフォース5名を派遣

7月15日(火)


- ・仮橋取付部の施工
- ・中部地方整備局から仮橋取付部施工の技術支援のため、テックフォース4名を派遣

7月16日(水) 予定

- ・完成

2. 仮橋設置位置図

至 塩尻

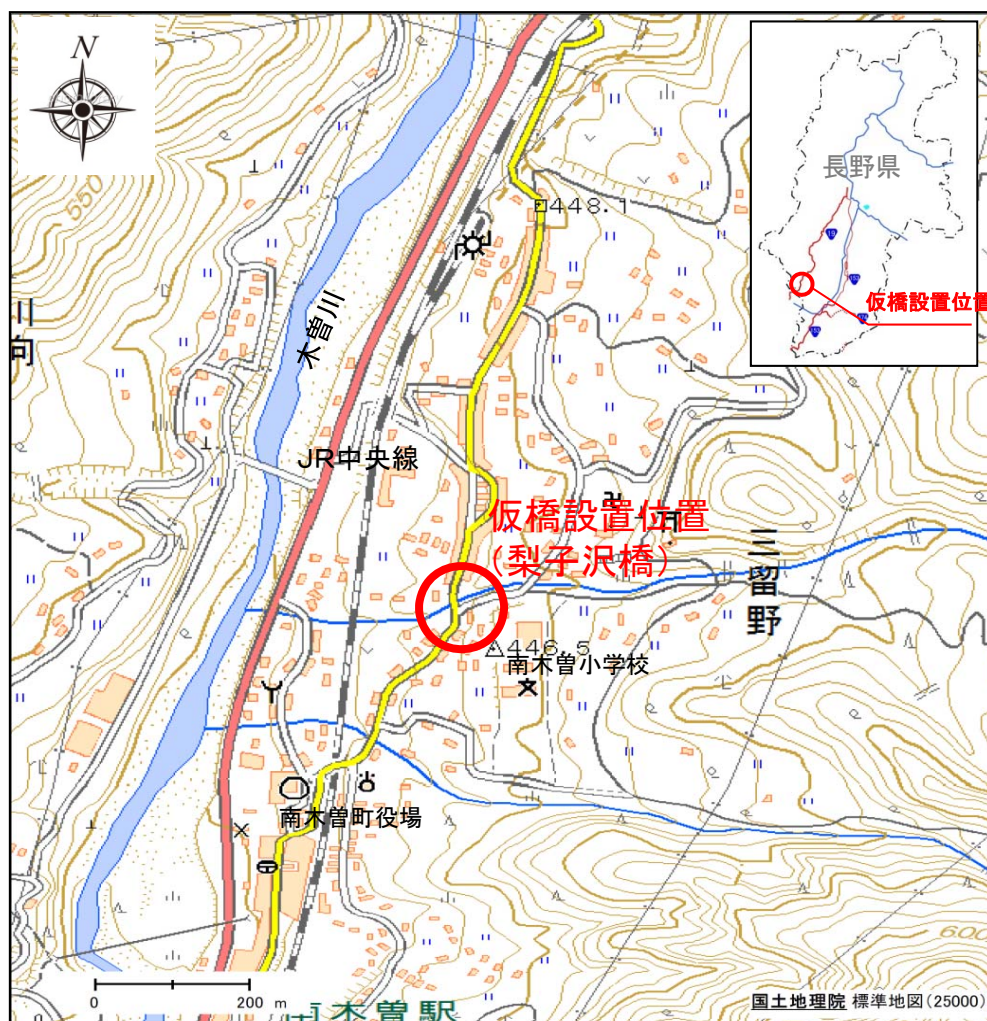

至 中津川

進捗状況写真 No. 1



①被災直後(7月11日 AM撮影)



②架設準備状況(7月12日 PM撮影)



③基礎(支承台座及び沓)設置(7月13日 14:30撮影)



④トラス主桁組立状況(7月13日 15:00撮影)

■進捗状況写真 No. 2



⑤トラス桁架設状況(7月13日 18:00撮影)



⑥横桁・横構取付、覆工板据付状況(7月14日 15:00撮影)



⑦ガードレール取付状況(7月14日 16:30撮影)



⑧仮橋取付部施工状況(7月15日 14:00撮影)
