



# 静清バイパス 清水立体 工事だより 第23号

## 【はじめに】

清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。  
今回(第23号)は、5月以降の工事予定をお知らせします。  
現場では、橋の柱(橋脚)を作る工事で、夜間、交通規制を伴う作業を引き続き行っていきます。  
また、横砂北交差点～庵原川までの車線を外側へ切り替える工事は4月21日に完了しました。  
引き続きご不便をおかけしますが安全第一で作業を進めてまいりますので、宜しくお願いします。

No14 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋西下部工事

施工会社：鈴与建設(株)  
工期：令和3年2月26日まで  
工事状況：清水IC西交差点北側の歩道整備を行っています。6月には清水IC西交差点周辺の車道舗装を行います



歩道PC桁架設状況

No6 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋西下部工事

施工会社：静和工業(株)  
工期：令和2年7月6日まで  
工事状況：掘削作業は終了し、今後は地盤を固める作業を実施する予定です。



P29橋脚施工状況

No5 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋東下部工事

施工会社：(株)白鳥建設  
工期：令和2年7月30日まで  
工事状況：橋脚工事を進めています。5月中旬に底版の生コン打設が完了予定です。



P26橋脚施工状況

No1 平成30年度 1号清水立体 庵原高架橋西下部工事

施工会社：木内建設(株)  
工期：令和2年6月30日まで  
工事状況：P19橋脚は完了し、今後は、P20橋脚の埋戻し・覆工板撤去を行います。



P19 覆工板撤去仮舗装完了

No12 令和元年度 1号清水立体 尾羽第3高架橋西側鋼製梁工事

施工会社：佐藤鉄工(株)  
工期：令和2年9月30日まで  
工事状況：P11～13橋脚において、工場で作成した鋼製梁のピースを現地で連結(溶接やボルトを使用)し、大型クレーンを使用して既存のコンクリート支柱の上に乗せます。

新規工事

着手前

No11 令和元年度 1号清水立体 尾羽第3高架橋中鋼製梁工事

施工会社：瀧上工業(株)  
工期：令和2年9月30日まで  
工事状況：P8～P10橋脚において、工場で作成した鋼製梁のピースを現地で連結(溶接やボルトを使用)し、大型クレーンを使用して既存のコンクリート支柱の上に乗せます。

新規工事

着手前

No10 令和元年度 1号清水立体 尾羽第3高架橋東側鋼製梁工事

施工会社：宮地エンジニアリング(株)  
工期：令和2年9月30日まで  
工事状況：P5～P7橋脚において、工場で作成した鋼製梁のピースを現地で連結(溶接やボルトを使用)し、大型クレーンを使用して既存のコンクリート支柱の上に乗せます。

新規工事

着手前

No9 令和元年度 1号清水立体 尾羽地区舗装工事

施工会社：鈴与建設(株)  
工期：令和2年6月30日まで  
工事状況：4月21日に上り線の車線切替が完了しました。5月から尾羽交差点内の歩道橋撤去・舗装を、上下線の右折レーンを開始して行っています。



上り線尾羽地区車線切替完了

No24 令和元年度 1号清水立体 横砂地区舗装工事

施工会社：静和工業(株)  
工期：令和3年2月26日まで  
工事状況：橋台とボックスカルバートの工事をメインに行っています。



着手前


No8 令和元年度 1号清水立体 横砂地区舗装工事

施工会社：日本道路(株)  
工期：令和2年6月30日まで  
工事状況：4月21日に上り線の車線切替が完了しました。今後は横砂北交差点内及び上り線側の切削オーバレイを行います。



上り線横砂地区車線切替完了

## 工事位置図

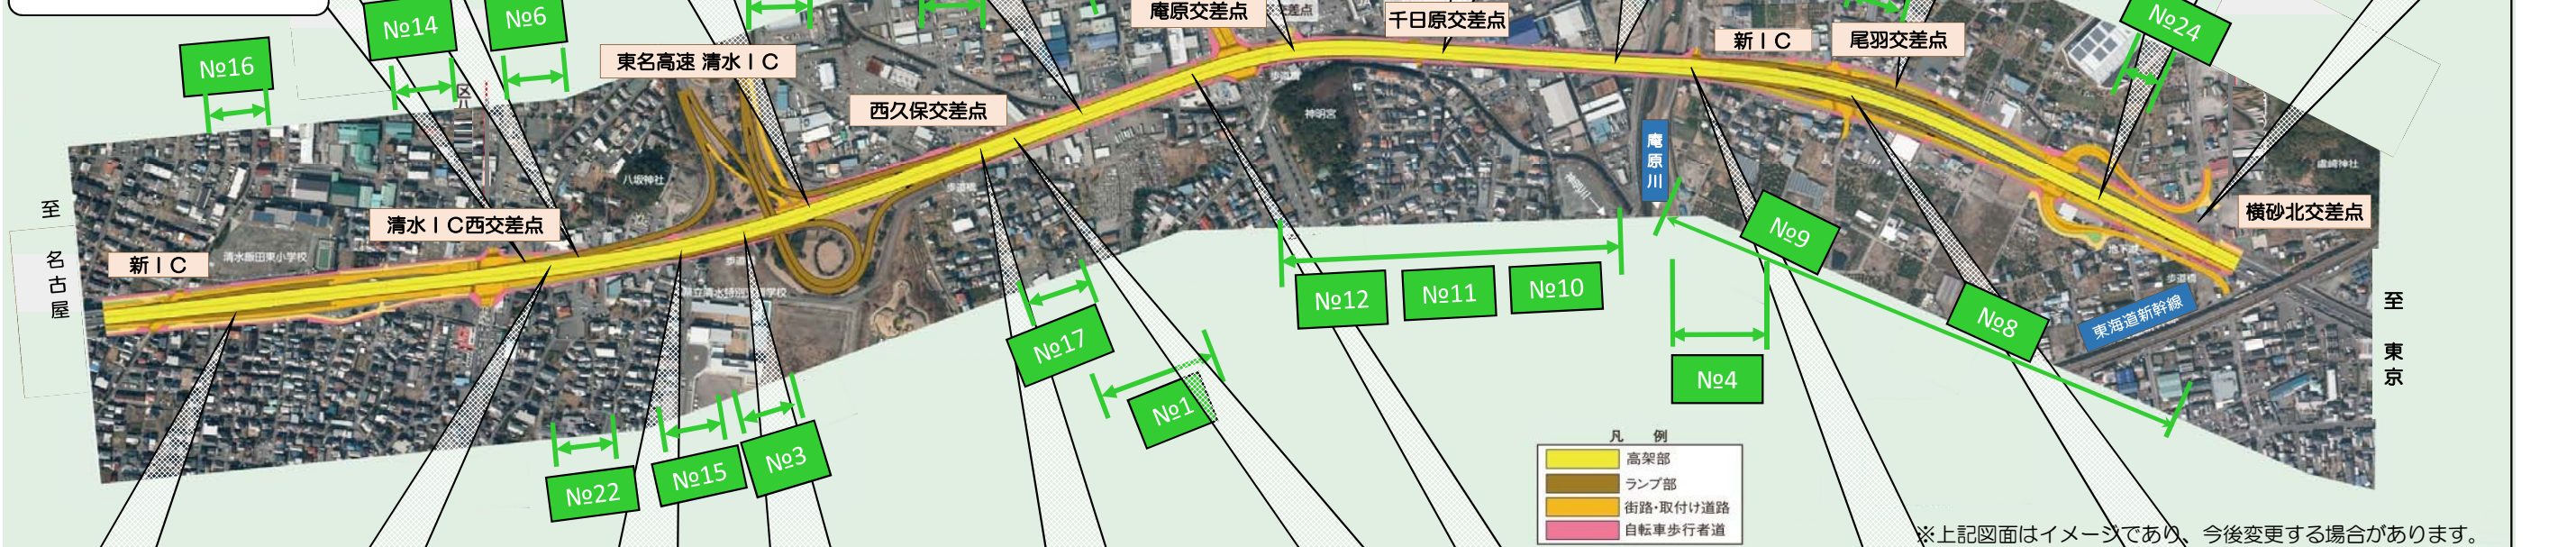

凡例

- 高架部
- ランプ部
- 街路・取付け道路
- 自転車歩行者道

※上記図面はイメージであり、今後変更する場合があります。

No16 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋東下部工事

施工会社：静和工業(株)  
工期：令和3年2月26日まで  
工事状況：上り線側既設オンランプの床版撤去を5月11日から施工開始します。今後はP30の橋脚を施工します。

新規工事

着手前

No22 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋中下部工事

施工会社：静和工業(株)  
工期：令和3年3月26日まで  
工事状況：清水IC西交差点東側のP31、P32の橋脚を施工します。

新規工事

着手前

No15 令和元年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋下部工事

施工会社：木内建設(株)  
工期：令和3年2月26日まで  
工事状況：下り線既設オンランプの床版撤去とP28橋脚の施工を行います。現在、工事を進めるための準備中です。

新規工事

着手前

No3 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋中下部工事

施工会社：五光建設(株)  
工期：令和2年7月30日まで  
工事状況：P27橋脚の底版部の施工を行っています。



P27橋脚躯体施工状況

No2 平成30年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋西下部工事

施工会社：平井工業(株)  
工期：令和2年7月30日まで  
工事状況：P22橋脚の基礎杭の作業を行っています。5月中旬より掘削作業を引き続き夜間作業にて行います。



P22橋脚場所打ち杭施工状況

No17 令和元年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋下部工事

施工会社：五光建設(株)  
工期：令和3年2月26日まで  
工事状況：P21、P24橋脚の施工を行っています。着工は6月を予定しています。

新規工事

着手前

No18 令和元年度 1号清水立体 庵原地区下部工事

施工会社：静鉄建設(株)  
工期：令和3年2月26日まで  
工事状況：P17橋脚の施工を行いません。現在、工事を進めるための準備中です。

新規工事

着手前

No4 平成30年度 1号清水立体 尾羽第2高架橋下部工事

施工会社：鈴与建設(株)  
工期：令和2年12月25日まで  
工事状況：P4橋脚の底版部のコンクリート打設が完了しました。5月から柱部の施工を行います。P3橋脚も施工を開始し、5月から6月中旬まで基礎杭の施工を行います。



P4橋脚 施工状況

No25 令和元年度 1号清水立体 尾羽第1高架橋下部工事

施工会社：鈴与建設(株)  
工期：令和3年2月26日まで  
工事状況：尾羽交差点の西側に橋脚3基(P1橋脚等)を施工します。5月下旬からアスファルト撤去を行い、6月より杭の施工を行う予定です。

新規工事

着手前



静岡国道事務所 ホームページ  
<http://www.cbr.mit.go.jp/shizukoku/>

令和2年 5月  
清水監督官話所  
TEL 054-250-8920  
編集：清水監督官話所 清水立体安全協議会  
担当：日本道路(株) (田所 泰弘)

# 静清バイパス 清水立体 5月・6月 交通規制案内

※ 略図は完成形イメージです。  
 ※ 規制日が決まり次第、各規制箇所へ予告看板を設置し  
 詳細をご案内いたします。



**No16** **No14**

**上り線副道通行止め(終日)**  
 歩行者・自転車、車両ともに通行できません。  
 現地迂回路看板に沿って迂回をお願いします。


**No2**  
**上下線:車線規制(夜間)**  
 夜間、中央分離帯に近い方の車線を規制して  
 作業を行います。

**No9**  
**5月上旬~6月中旬**  
**上下線:右折レーン閉鎖(昼間)**  
 尾羽交差点の右折レーン(上下線)を**通行止**  
 規制して作業を行います。

**No8**  
**5月中旬~6月上旬**  
**上り線:車線規制(夜間)**  
 夜間、車線規制にて舗装作業を行  
 います。

**No14**  
**上り線:車線規制(夜間)**  
 橋脚に近い方の車線を規制して  
 作業を行います。

**No14**  
**5月末まで**  
**地下道**  
**車両通行止**  
**(終日)**  
 歩行者・自転車  
 は通行でき  
 ます。

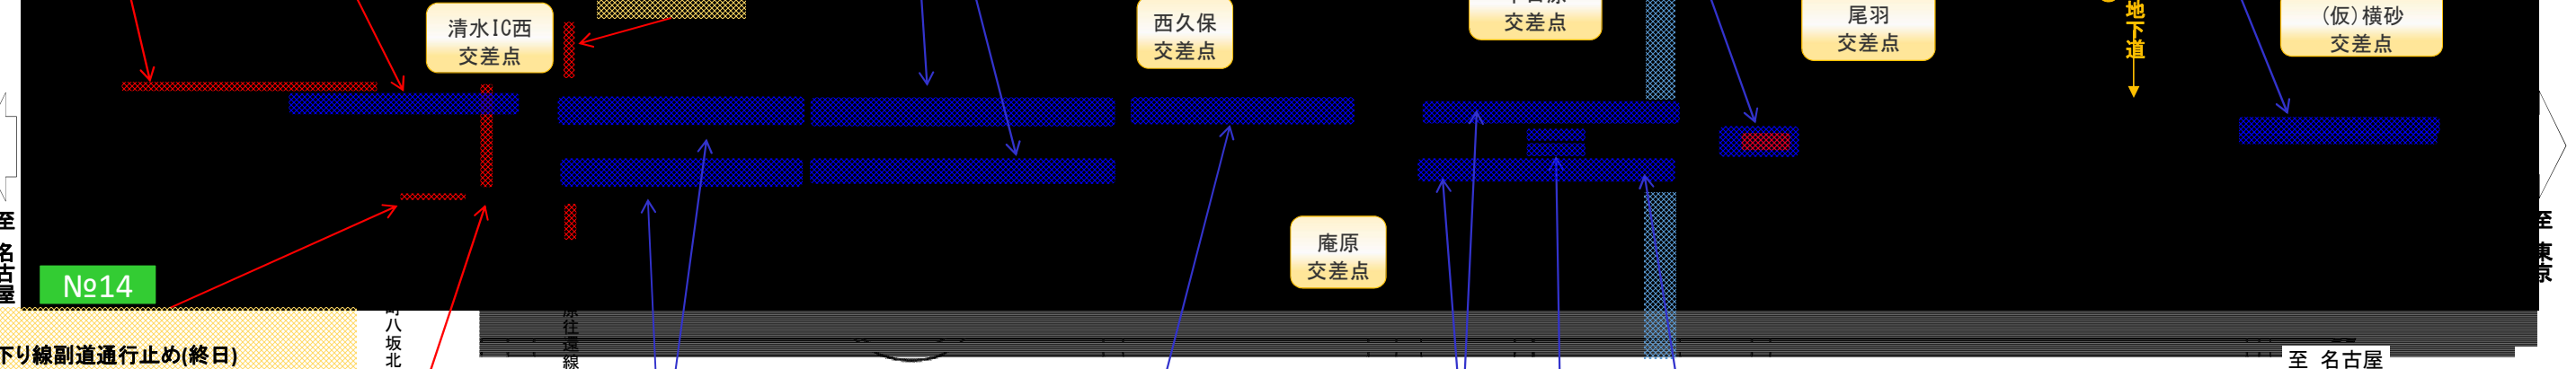

**No14**  
**下り線副道通行止め(終日)**  
 歩行者・自転車の通行ができません。  
 現地迂回路看板に沿って迂回をお願  
 います。

**No14**  
**横断歩道通行止め(終日)**  
 交差点西側の横断歩道は、歩行  
 者・自転車ともに通行できなくな  
 ります。  
 現地迂回路看板に沿って迂回を  
 お願いします。

**No3** **No6**  
**上下線:車線規制(夜間)**  
 夜間、中央分離帯に近い方の車線を規制して  
 作業を行います。

**No1**  
**上下線:車線規制(夜間)**  
 夜間、中央分離帯に近い方の車道を規制して作  
 業を行います。

**No12** **No11** **No10**  
**上下線:車線規制(夜間)**  
 夜間、中央分離帯に近い方の車道を規制して作  
 業を行います。

- 【凡例】
- : 歩道・路肩規制
  - : 車線規制
  - : 通行止め

