




# 静清バイパス 清水立体 工事だより 第25号

## 【はじめに】

清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。  
 今回（第25号）は、7月以降の工事予定をお知らせします。  
 現場では、橋の柱（橋脚）を作る工事で、夜間、交通規制を伴う作業を引き続き行っていきます。  
 また、今月下旬には鋼製の梁を設置する工事で庵原交差点～横砂北交差点付近の区間において、1週間程度の夜間対面通行規制を予定しております。  
 引き続きご不便をおかけしますが安全第一で作業を進めてまいりますので、宜しくお願いいたします。

<b>No13</b> 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋西下部工事 施工会社：鈴与建設(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：清水IC西交差点の切替のため、舗装を進めています。  切廻し本線舗装状況	<b>No6</b> 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋西下部工事 施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年3月31日まで 工事状況：7月中頃より基礎工事を実施する予定です。  P29橋脚施工状況	<b>No18</b> 令和元年度 1号清水立体 清水IC西道路建設工事 施工会社：あおみ建設(株) 工期：令和4年2月28日まで 工事状況：東名清水IC西側で、清水立体と東名高速道路を繋げる道路を作ります。たぐいま工事を進めるための準備中です。  着手前	<b>No5</b> 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋東下部工事 施工会社：倅白鳥建設 工期：令和2年7月30日まで 工事状況：橋脚柱コンクリート打設が完了し、以後仮設工撤去及び舗装を夜間作業をメインに行います。  P26橋脚施工状況	<b>No1</b> 平成30年度 1号清水立体 庵原高架橋西下部工事 施工会社：木内建設(株) 工期：令和2年6月30日まで 工事状況：6月で工事完了致しました。ご協力ありがとうございました。  完了	<b>No11</b> 令和元年度 1号清水立体 尾羽第3高架橋西側架設工事 施工会社：佐藤鉄工(株) 工期：令和2年9月30日まで 工事状況：P11～P13橋脚において、柱頭部の架設が終わり、中詰コンクリートを打設した後、7月下旬に梁部の架設を行います。  P11-P13柱頭部架設状況	<b>No10</b> 令和元年度 1号清水立体 尾羽第3高架橋東側架設工事 施工会社：瀧上工業(株) 工期：令和2年9月30日まで 工事状況：P8～P10橋脚において、柱頭部の架設が終わり、中詰コンクリートを打設した後、7月下旬に梁部の架設を行います。  P8-P10柱頭部架設完了	<b>No9</b> 令和元年度 1号清水立体 尾羽第3高架橋東側架設工事 施工会社：空地エンジニアリング(株) 工期：令和2年9月30日まで 工事状況：P5～P7橋脚において、柱頭部の架設が終わり、中詰コンクリートを打設した後、7月下旬に梁部の架設を行います。  P5-P7柱頭部架設完了	<b>No8</b> 令和元年度 1号清水立体 尾羽地区舗装工事 施工会社：鈴与建設(株) 工期：令和2年6月30日まで 工事状況：市道の通行止め等地域の皆様方にはご迷惑をお掛けしましたが、ご協力頂いたおかげで、無事故・無災害で工事完了できました。ご協力ありがとうございました。  完成（尾羽交差点～庵原）	<b>No22</b> 令和元年度 1号清水立体 横砂跨道橋西下部工事 施工会社：平井工業(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：橋台を作る為に基礎の整備をしました。7月から杭工事を施工していきま  A2橋台 基礎整備完了	<b>No23</b> 令和元年度 1号清水立体 横砂跨道橋東下部工事 施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：工事を始める準備として、取壊し工事を行っています。7月より杭の工事を始めます。  着手前
---	--	--	---	---	--	--	---	---	---	---

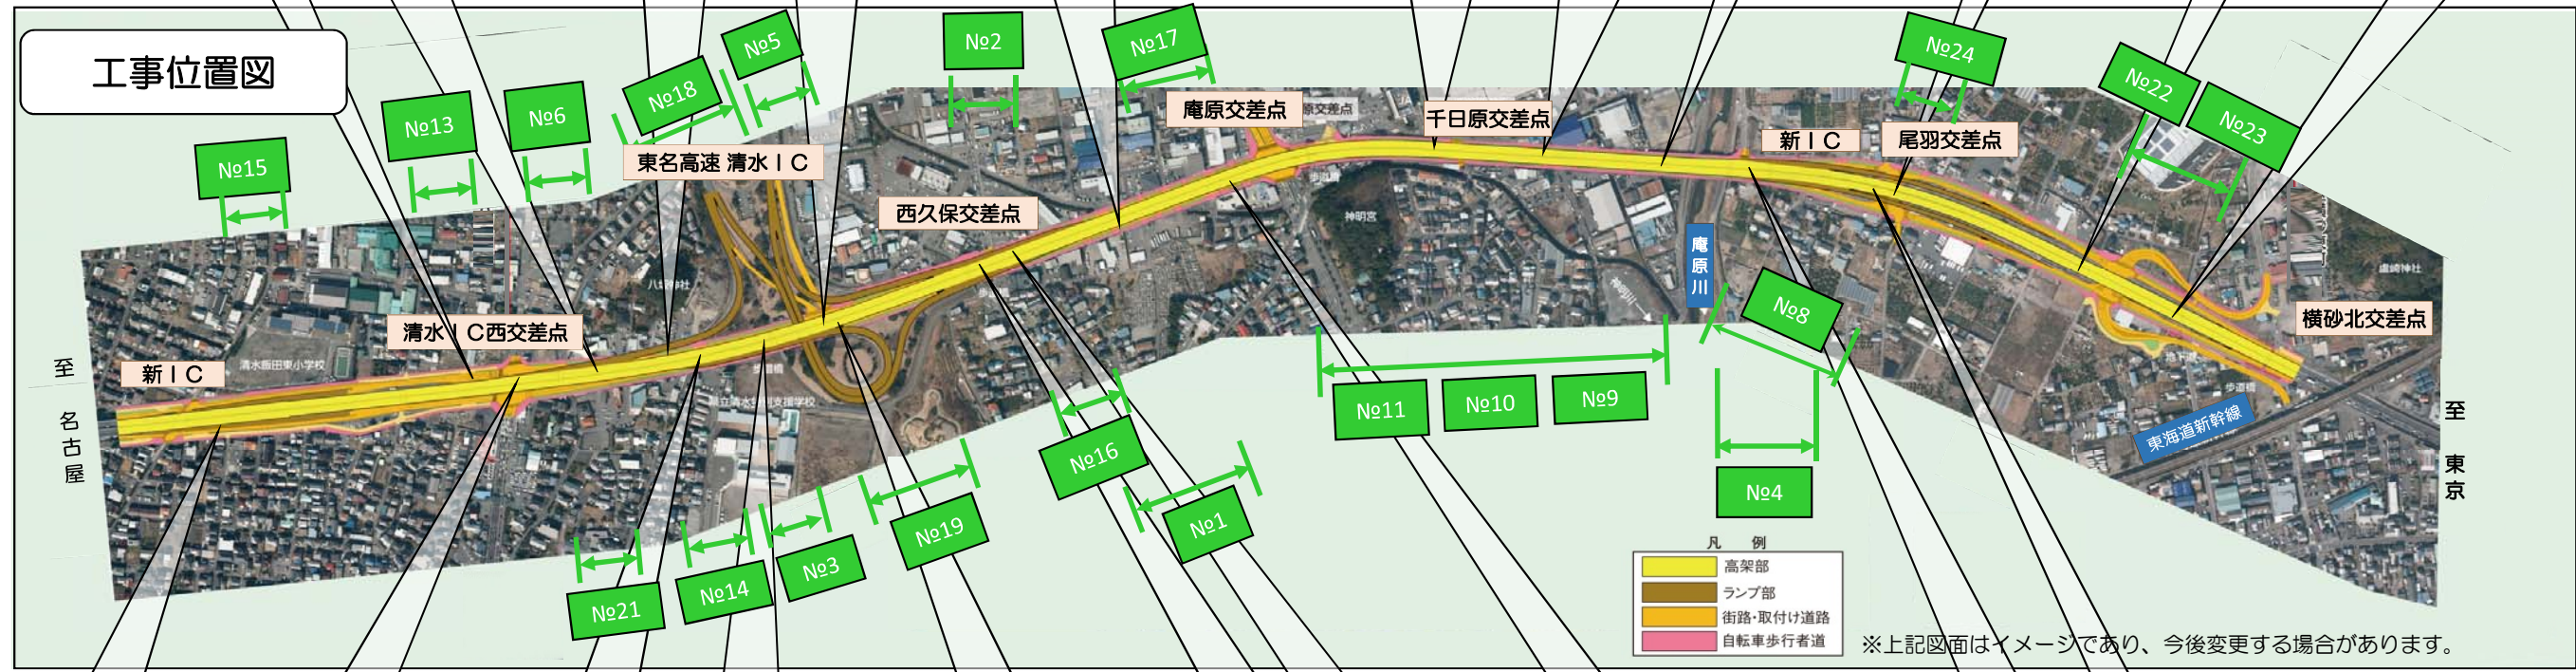

<b>No15</b> 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋東下部工事 施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：7月2日より側道橋の取壊しに着手しました。  上り線側道橋支保工組立	<b>No21</b> 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋中下部工事 施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年3月26日まで 工事状況：P31・P32橋脚の施工を行います。たぐいま工事を進めるための準備中です。  着手前	<b>No14</b> 令和元年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋下部工事 施工会社：木内建設(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：6月25日より側道橋の取壊しに伴う準備作業に着手しました。8月初旬より取壊しを行う予定です。  下り線側道橋下基礎施工状況	<b>No3</b> 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋中下部工事 施工会社：五光建設(株) 工期：令和2年7月30日まで 工事状況：躯体工事完了後、工事完成に向けて残りの仮設工、舗装工事を夜間施工にて行います。  P27橋脚施工状況	<b>No19</b> 令和元年度 1号清水立体 清水IC東道路建設工事 施工会社：名工建設(株) 工期：令和4年2月28日まで 工事状況：東名清水IC東側で、清水立体と東名高速道路を繋げる道路を作ります。たぐいま工事を進めるための準備中です。  着手前	<b>No2</b> 平成30年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋西下部工事 施工会社：平井工業(株) 工期：令和2年7月30日まで 工事状況：6月で掘削から杭の処理工事を終えて、7月から柱の基礎部分の鉄筋工事、コンクリート工事を行っています。  P22橋脚 杭頭処理完了状況	<b>No16</b> 令和元年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋橋下部工事 施工会社：五光建設(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：工事準備中  着手前	<b>No17</b> 令和元年度 1号清水立体 庵原地区下部工事 施工会社：静鉄建設(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：7月上旬から仮設工の準備として、中央分離帯等の撤去を行い、7月中旬に杭打ち機を搬入予定です。  着手前	<b>No4</b> 平成30年度 1号清水立体 尾羽第2高架橋下部工事 施工会社：鈴与建設(株) 工期：令和2年12月25日まで 工事状況：P3橋脚では、鋼製の矢板を圧入する作業を行っており、完了後掘削作業を開始します。P4橋脚では、7月中で埋戻し作業を行い完了となります。  P3橋脚 鋼矢板施工状況	<b>No24</b> 令和元年度 1号清水立体 尾羽第1高架橋下部工事 施工会社：鈴与建設(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：現在場所打ち杭の施工を行っています。7月2日以降からは庵原川から尾羽交差点までを夜間規制にて舗装工事を行う予定です。  P1橋脚 場所打ち杭施工状況
---	---	---	--	---	---	---	--	--	--

静岡国道事務所 ホームページ  
<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>

令和2年7月  
 清水監督官話所  
 TEL 054-250-8920  
 編集：清水監督官話所 清水立体安全協議会  
 担当：空地エンジニアリング(株) (坪井 行一)
