




静清バイパス 清水立体 工事だより 第27号

【はじめに】

清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。
 今回（第27号）は、9月以降の工事予定をお知らせします。
 現場では、橋の柱（橋脚）を作る工事で、夜間、交通規制を伴う作業を引き続き行っていきます。
 引き続きご不便をおかけしますが安全第一で作業を進めてまいりますので、宜しくお願いいたします。

No13 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋西下部工事 施工会社：鈴与建設(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：8月下旬から中央分離帯内で場所打杭の施工を行っています。	No6 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋西下部工事 施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年3月31日まで 工事状況：9月上旬にて橋脚基礎工の埋戻し作業が終了致しました。ご迷惑をお掛けいたしました。引き続き宜しくお願い致します。	No18 令和元年度 1号清水立体 清水IC西側にて、清水立体と東名高速道路を繋げる道路を作ります。現在、本施工に向け、9月上旬から工事用車両出入り口および伐採工を施工していく予定です。	No5 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋東下部工事 施工会社：(株)白鳥建設 工期：令和2年9月30日まで 工事状況：9月上旬にて工事完成予定です。皆さまのご協力ありがとうございました。	No12 令和元年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋橋脚下部工事 施工会社：佐藤鉄工(株) 工期：令和3年1月29日まで 工事状況：9月中旬から中央分離帯内で鋼製橋脚の地組立てを行う予定です。よろしくお願致します。	No11 令和元年度 1号清水立体 尾羽第3高架橋西鋼梁架設工事 施工会社：佐藤鉄工(株) 工期：令和2年9月30日まで 工事状況：P11-P13橋脚において、塗装作業が終わり、足場解体、補修塗装で工事が完了します。最後まで気を緩めることなく進めてまいります引き続きよろしくお願い致します。	No10 令和元年度 1号清水立体 尾羽第3高架橋中鋼梁架設工事 施工会社：瀧上工業(株) 工期：令和2年9月30日まで 工事状況：P8~P10橋脚において、塗装作業が終わり、足場で足場解体を進めてまいります。引き続き宜しくお願い致します。	No9 令和元年度 1号清水立体 尾羽第3高架橋東鋼梁架設工事 施工会社：宮地エンジニアリング(株) 工期：令和2年9月30日まで 工事状況：P5-P7橋脚において、塗装作業、足場解体、補修塗装で工事が完了します。最後まで気を緩めることなく進めてまいります引き続きよろしくお願い致します。	No22 令和元年度 1号清水立体 横砂踏道橋西下部工事 施工会社：平井工業(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：A2橋台及び擁壁の場所打ち杭の打設が完了し、鋼矢板による仮締切工を行っています。矢板打設完了後、掘削してまいります。一部矢板打込の際に夜間施工となりますが、安全に十分注意して作業いたします。	No23 令和元年度 1号清水立体 横砂踏道橋東下部工事 施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：現在、A1橋台において仮設工の鋼矢板打設と横砂地区の地下道の掘削作業を並行して作業しております。
--	---	--	--	--	---	--	--	---	--

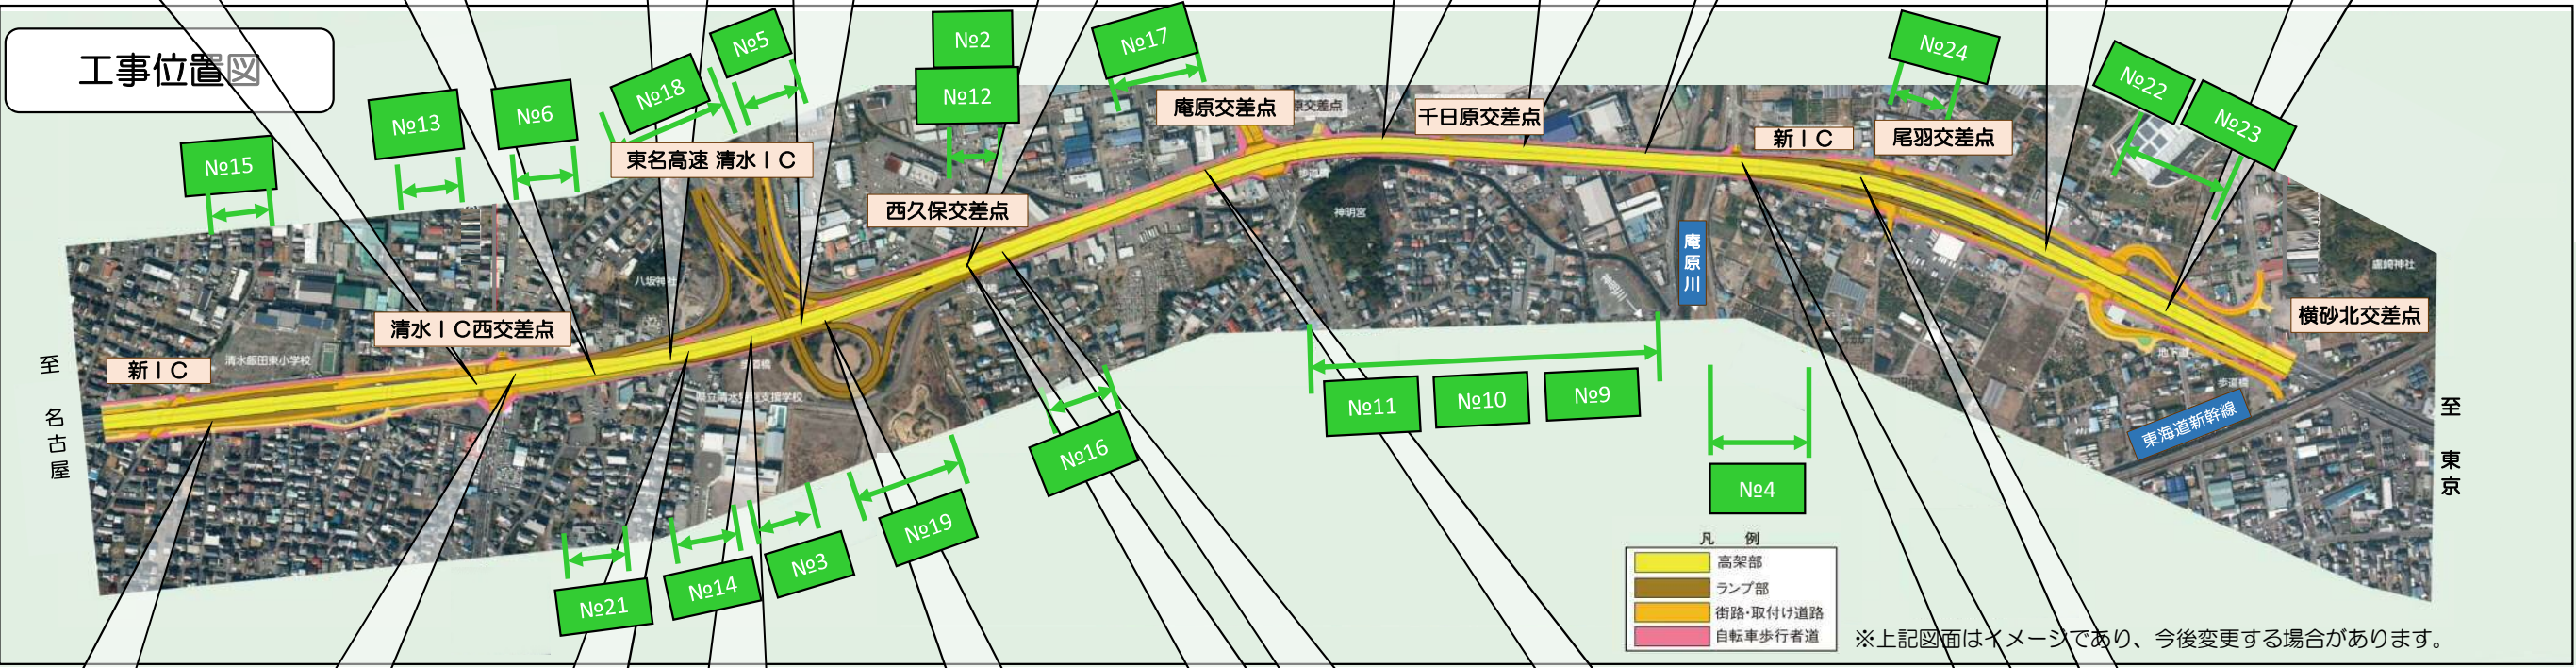

No15 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋東下部工事 施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年3月26日まで 工事状況：現在、上り線の側道橋の撤去が完了しました。引き続き写真手前の橋台の撤去作業に着手します。	No21 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋中下部工事 施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年3月26日まで 工事状況：P32橋脚の工事着手をしました。	No14 令和元年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋下部工事 施工会社：木内建設(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：下り線の側道橋をワイヤーソーで切断・撤出しています。騒音を最小限に抑えた工法です。	No3 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋中下部工事 施工会社：五光建設(株) 工期：令和2年9月30日まで 工事状況：9月中旬にて工事完成予定です。皆さまのご協力ありがとうございました。	No19 令和元年度 1号清水立体 清水IC東道路建設工事 施工会社：名工建設(株) 工期：令和4年2月28日まで 工事状況：清水IC東側にて、清水立体と東名高速道路を繋げる道路を作ります。9月1日より工事着手し、工事用道路造成と伐採工を進めていきます。	No2 平成30年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋西下部工事 施工会社：平井工業(株) 工期：令和2年9月30日まで 工事状況：柱の基礎部分のコンクリート打設が完了しました。一部を埋戻して工事完了となります。	No16 令和元年度 1号清水立体 清水IC第1第2高架橋下部工事 施工会社：五光建設(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：仮設工の施工中となります。	No17 令和元年度 1号清水立体 庵原地区下部工事 施工会社：静鉄建設(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：仮設工継続中、9月10日より鋼管杭の打込み材料・機械搬入を行い11日より鋼管杭の打込みを予定しています。	No4 平成30年度 1号清水立体 尾羽第2高架橋下部工事 施工会社：鈴与建設(株) 工期：令和2年12月25日まで 工事状況：8月末時点でP3橋脚底板部の鉄筋組立が完了します。9月は底板部のコンクリート打設後、柱部の施工(鉄筋組立→型枠組立→コンクリート打設)に移ります。	No24 令和元年度 1号清水立体 尾羽第1高架橋下部工事 施工会社：鈴与建設(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：矢板の打込みが終了し、7月まで作業をしていた場所打ち杭工の杭頭処理を施工しています。安全に気を付けて行っていきます。
--	--	--	--	---	--	--	--	---	---

静岡国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>

令和2年9月
 清水監督官事務所
 TEL 054-250-8920
 編集：清水監督官事務所 清水立体安全協議会
 担当：佐藤鉄工(株) (碓井 勝巳)
