

令和元年10月末 中津川出張所 工事進捗状況

①（中津川流域）		進 捗 率		②（落合川流域）		進 捗 率		③（中津川出張所管内）		進 捗 率	
工 事 名：平成30年度 中津川第2防堰堤改築工事		予定	21.3%	工 事 名：平成30年度 本谷砂防堰堤工事用道路工事		予定	45.9%	工 事 名：平成31年度 中津川出張所整備工事		予定	52.5%
契約工期：平成31年3月28日～令和2年3月31日 変更工期：令和1年5月13日～令和2年3月31日		実施	25.0%	契約工期：平成31年3月30日～令和2年2月28日 変更工期：平成31年4月8日～令和2年2月28日		実施	45.0%	工 期：平成31年4月1日～令和2年3月31日		実施	58.1%
請負業者名：（株）加藤工務店		差	3.8%	請負業者名：（株）鳴海組		差	-0.9%	請負業者名：（株）吉川工務店		差	5.6%
											
10月作業：護岸工 多自然型護岸工巨石積(練)、道路土工 掘削・路体盛土		10月作業：高強度ネット工(鉄筋挿入工)、(Webカメラ設置・配信開始)		10月作業：道路改良工 帯鋼補強土壁工基礎コンクリート、補強土壁工		10月作業：水叩き工 左岸型枠工及びコンクリート打設、四ッ目川遊砂工整備工事					
11月予定：護岸工 多自然型護岸工巨石積(練)、道路工 ブロック積床掘		11月予定：高強度ネット工(鉄筋挿入工・高強度ネット張)		11月予定：道路改良工 帯鋼補強土壁工(補強土盛土・横断排水・基盤排水層)		11月予定：水叩き工 右岸床掘・型枠工及びコンクリート打設、四ッ目川遊砂工整備工事					
④（中津川流域）		進 捗 率		⑤（落合川流域）		進 捗 率		⑥（落合川流域）		進 捗 率	
工 事 名：平成31年度 川上流路工宮前橋工事 10月21日(月)14時50分事故発生、10月31日まで休止		予定	28.8%	工 事 名：令和元年度 荒道工事用道路工事		予定	3.3%	工 事 名：令和元年度 薬師沢砂防堰堤工事 副堰堤工 工事の一部一時中止(令和2年1月9日まで)		予定	3.7%
工 期：令和元年6月26日～令和2年3月30日		実施	27.0%	工 期：令和元年9月12日～令和2年2月20日		実施	0.8%	工 期：令和元年9月12日～令和2年2月20日		実施	2.4%
請負業者名：（株）中島工務店		差	-1.8%	請負業者名：（株）鳴海組		差	-2.5%	請負業者名：（株）吉川工務店		差	-1.3%
						余 白					
10月作業：橋梁下部 A1橋台掘削工・法面吹付工、床固工床掘工		10月作業：起工測量、伐採、仮設工準備		10月作業：起工測量、伐採準備、仮設工							
11月予定：橋梁下部 A1橋台床掘・法面吹付、1号、2号床固工床掘・法面吹付		11月予定：仮設工 砂防締切、道路改良 擁壁工(ブロック積工)準備		11月予定：用水路付替工 仮設工、伐採準備							

令和元年10月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

①

工 事 名 : 平成30年度
庄内川水系 平園第6砂防堰堤工事
工 期 : 平成31年3月9日 ~ 令和2年4月14日

施工業者: (株)藤本組

進 捗 率 : 予定 40.0 % 実施 43.9 % 差 3.9%

堰堤部



《今月作業》コンクリート堰堤工:コンクリート打設

《12月作業》コンクリート堰堤工:コンクリート打設

②

工 事 名 : 平成30年度
妻木出張所整備工事
工 期 : 平成31年3月30日 ~ 平成32年3月31日

施工業者: (株)藤本組

進 捗 率 : 予定 50.0 % 実施 49.5 % 差 -0.5%

指示2: 市之倉作業道



《今月作業》水路工:コンクリート打設、道路土工:道路盛土

《12月作業》道路土工:道路盛土

③

工 事 名 : 平成30年度
庄内川水系 妻木管内流木対策整備工事
工 期 : 平成31年4月8日 ~ 平成32年2月28日

施工業者: (株)藤本組

進 捗 率 : 予定 45.6 % 実施 41.2 % 差 -4.4%

下阿庄地区



《今月作業》下阿庄地区:鋼製スリット設置、かごマット設置、排水側溝設置

《12月作業》下阿庄地区:舗装工、排水構造物工、法面工

④

工 事 名 : 令和元年度
庄内川水系 追沢川流路工事
工 期 : 令和元年7月30日 ~ 令和2年2月7日

施工業者: (株)吉川組

進 捗 率 : 予定 12.4 % 実施 11.8 % 差 -0.6%



《今月作業》流路護岸工:ブロック積

《12月作業》流路護岸工:ブロック積、底板工:コンクリート打設

令和元年10月末 上松出張所 工事進捗状況

	①	平成29年度 木曽川水系 越百川第3砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株)	②	平成30年度 木曽川水系 額付第1砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)	③	平成30年度 上松出張所整備工事 施工業者 奥田工業(株)	④	平成30年度 木曽川水系 下洞沢砂防施設工事 施工業者 大宗土建(株)
		進捗率(予定工程) % 100.0		進捗率(予定工程) % 76.7(76.9)		進捗率(予定工程) % 94.0		進捗率(予定工程) % 82.1(72.3)
		H30.3.30 ~ R1.10.31		H30.5.25 ~ R2. 2.28		H31.3.27 ~ R2. 3.31		H31.3.29 ~ R2. 2.28
								
今月作業		10月28日完成検査。		コンクリート副堰堤工・コンクリート側壁工		指示No.6 梨子沢第3下流左岸整備 指示No.9 長者畑砂防堰堤魚道土砂除去		コンクリート堰堤本体工(型枠)、土工(埋戻し)
来月予定		—		コンクリート側壁工・水叩工		指示No.6 梨子沢第3下流左岸整備 指示No.8 上山沢砂防堰堤上流土砂除去 指示No.10 桜洞砂防堰堤堆砂域伐採		土工(埋戻し)
	⑤	平成30年度 木曽川水系 和合工事用道路工事 施工業者 (株)宮坂組	⑥	平成30年度 木曽川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曽土建工業(株)	⑦	平成30年度 木曽川水系 下在蛇抜沢砂防施設工事 施工業者 奥田工業(株)	⑧	平成30年度 木曽川水系 上松管内砂防施設工事 施工業者 奥田工業(株)
		進捗率(予定工程) % 57.7(64.4)		進捗率(予定工程) % 100.0		進捗率(予定工程) % 31.9(31.9)		進捗率(予定工程) % 36.2(36.2)
		H31.3.29 ~ R2. 2.28		H31.4.3 ~ R2. 2.28		H31.4.9 ~ R2. 2.28		H31.4.16 ~ R2. 3.28
								
今月作業		擁壁工・石ブロック積工・排水構造物工		10月24日完成検査。		コンクリート側壁工・水叩工(型枠組立・コンクリート打設) 床固め工(作業土工・水叩工)		矢垂沢地区 強じんワイヤーネット工(アンカー工)
来月予定		道路土工・擁壁工・石ブロック積工・排水構造物工		—		床固め工【側壁・水叩(型枠組立・コンクリート打設)】		猿沢地区 仮設工

令和元年10月末 上松出張所 工事進捗状況


	⑨	令和元年度 木曽川水系 滑川整備工事 施工業者 木曽土建工業(株)	⑩	令和元年度 木曽川水系 越百川第3砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株)	⑪	令和元年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)	⑫	令和元年度 木曽川水系 額付第1砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)
		進捗率(予定工程) % 37.6 (37.2)		進捗率(予定工程) % 1.5(1.5)		進捗率(予定工程) % 3.0 (12.6)		進捗率(予定工程) % 42.3 (42.3)
		R1. 7.27 ~ R2. 2.14		R1. 8.27 ~ R3. 2.15		R1. 8.27 ~ R2. 2.21		R1. 8.27 ~ R2. 2.21
今月 作業								
	作業土工、護床工		工場製作工(鋼製スリット製作準備)		準備工・仮設工(仮設備設置)		作業土工、構造物取壊し工	
来月 予定	作業土工、護床工		工場製作工(鋼製スリット製作) コンクリート堰堤工(型枠組立、コンクリート打設)		準備工・仮設工(仮設備設置)		作業土工、構造物取壊し工	
	⑬	令和元年度 木曽川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事 施工業者 神稲建設(株)	⑭		⑮		⑯	
		進捗率(予定工程) % 0.3(0.3)						
		R1. 9.12 ~ R2. 2.28						
今月 作業								
	準備工、伐採工							
来月 予定	伐採工、仮設工							

平成31年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



21号(下) 3.4kp~3.6kp 道路除草工
工 期：平成31年04月01日~平成33年03月31日
施工業者：日本ハイウェイ・サービス (株)
施工箇所：R19 31.5kp~55.2kp
R21 3.0kp~22.0kp 可児御嵩BP

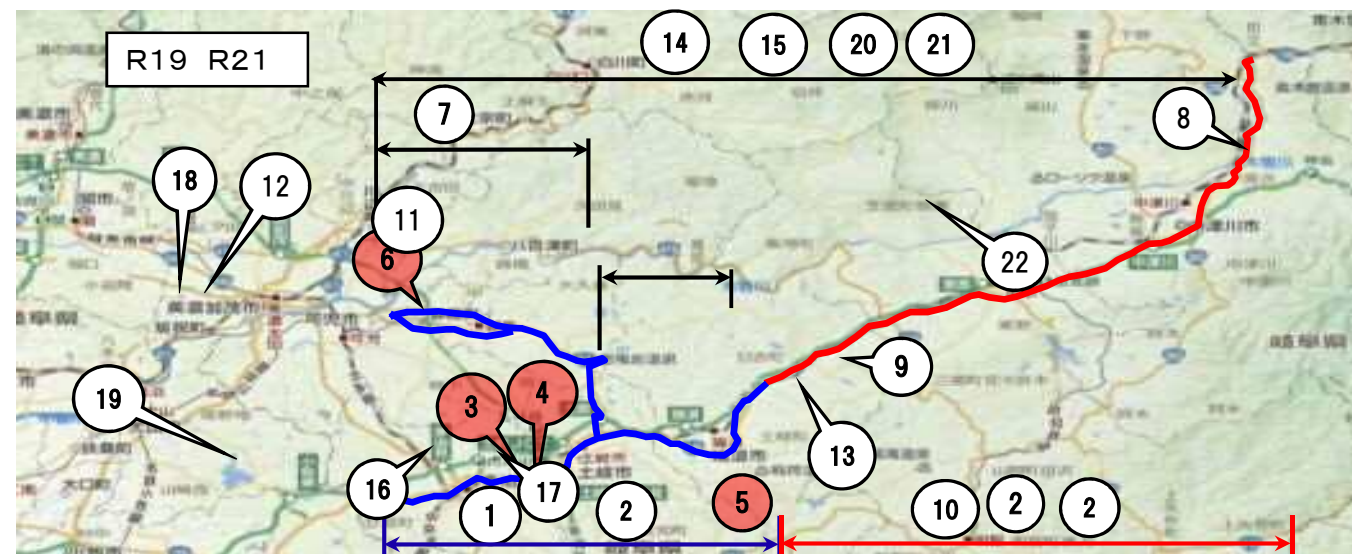

平成30年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号79.850kp(下) 緑地管理工
工 期：平成30年04月01日~令和2年03月31日
施工業者：(有) 木曾ハイウェイサービス
施工箇所：R19 55.2kp~97.0kp

平成30年度 19号土岐口道路建設工事

③



19号39.90kp ~40.30kp付近
工 期：平成30年04月27日~平成31年09月30日
施工業者：(株)吉川組
施工箇所：岐阜県土岐市土岐口地先

完

平成30年度 19号土岐口道路改良工事

④



19号 39.9kp~ 上り線 舗装工
工 期：平成30年04月26日~平成31年09月30日
施工業者：(株)藤本組
施工箇所：岐阜県土岐市土岐口地先

完

平成30年度多治見国道管内交通事故対策整備工事

⑤



19号 70.7kp~70.9kp 薄層カラー舗装工
工 期：平成30年07月12日~令和元年06月10日
施工業者：(株)加藤工務店
施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

完

平成30年度 多治見国道21号御嵩御嵩地区垂炭坑充填工事

⑥



確認ボーリング(大庭工区)
工 期：平成30年10月06日~令和元年07月31日
施工業者：徳倉建設(株)
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内

完

平成30年度多治見管内橋梁補修工事

⑦



土岐3工区 舗装工
工 期：平成31年01月24日~平成32年02月28日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：多治見市、土岐市、御嵩町、恵那市

平成30年度多治見国道東部橋梁補修工事

⑧



乙姫大橋(検査路工)前野橋 完了
工 期：平成31年01月24日~令和2年03月13日
施工業者：(株)梅田組
施工箇所：中津川市山口

平成30年度瑞浪恵那道路瑞浪地区下部工事

⑨



U型擁壁工、新滝沢川橋A1、仮設道路、西半入道西定線
工 期：平成31年01月19日~令和2年01月14日
施工業者：板垣建設(株)
施工箇所：瑞浪市

平成30年度多治見国道橋梁補修工事

⑩



19号 94.67kp 山口2工区 断面修復工、ひび割れ補修工
工 期：平成31年03月09日~平成32年02月28日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：恵那市~中津川市

平成30年度多治見国道防災対策工事

⑪



法面工
工 期：平成31年03月26日~平成31年12月27日
施工業者：セントラル建設(株)
施工箇所：瑞浪市、御嵩町

平成30年度多治見国道21号顔戸地区垂炭坑充填工事

⑫



充填孔
工 期：令和元年05月07日~令和2年01月31日
施工業者：徳倉建設(株)
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地先

平成30年度瑞浪恵那道路釜戸地区下部工事

⑬



A1橋台 躯体工事中 A2橋台 土留め工中

工 期：平成31年04月05日～平成32年02月28日
施工業者：（株）中島工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

平成30年度 多治見国道CCTV設備工事

⑭



準備工

工 期：平成31年04月15日～平成32年01月31日
施工業者：（株）シーテック
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

平成31年度多治見電気通信設備維持工事

⑮



CCTV設備工（次月情報板 R21-10.030kp）

工 期：平成31年04月01日～平成32年03月31日
施工業者：（株）ミライト
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

平成31年度瑞浪恵那道路土岐地区下部工事

⑯



A1橋台 フーチング

工 期：令和元年06月28日～令和03年02月26日
施工業者：（株）加藤工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町地先

平成31年度瑞浪恵那道路整備工事

⑰



伐採工・路体盛土工 No.135付近造成地

工 期：令和元年06月28日～令和02年02月28日
施工業者：セントラル建設（株）
施工箇所：瑞浪市土岐町～恵那市武並町地先

令和元年度多治見国道21号大庭地区亜炭坑充填工事

⑱



準備工、家屋調査工

工 期：令和元年07月27日～令和02年02月28日
施工業者：飛鳥建設（株）
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内

令和元年度多治見国道横断歩道橋塗装工事

⑲



上山町横断歩道橋（足場工・薄層カラー舗装工）

工 期：令和元年08月07日～令和02年02月28日
施工業者：ウノインフラプランテック（株）
施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

令和元年度多治見国道管内整備工事

⑳



準備工

工 期：令和元年08月20日～令和02年02月28日
施工業者：（株）鳴海組
施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

令和元年度多治見国道ブロープ情報用電源設備工事

㉑



19号 21号 屋外用無停電電源装置 書類作成

工 期：令和元年08月07日～令和02年02月28日
施工業者：サンケン電気（株）
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道四ツ目川橋左岸耐震補強工事

㉒



仮設工

工 期：平成31年08月27日～令和元年07月31日
施工業者：（株）吉川工務店
施工箇所：中津川市中津川地先

令和元年度多治見国道東部除雪作業

㉓

準備工

準備工

工 期：令和元年10月09日～令和02年03月31日
施工業者：（株）鳴海組
施工箇所：瑞浪市土岐町～木曽郡南木曽町

令和元年度多治見国道西部除雪作業

㉔

準備工

準備工

工 期：令和元年10月08日～令和02年03月31日
施工業者：セントラル建設（株）
施工箇所：内津～土岐町、泉寺田町～中恵土
