


# 令和4年4月末 中津川出張所 工事進捗状況

① (落合川流域)	進捗率	② (中津川流域)	進捗率	③ (本川筋)	進捗率	④ (中津川出張所管内)	進捗率
工事名: 令和2年度 木曾川水系 本谷砂防堰堤改築工事	予定 64.2%	工事名: 令和3年度 木曾川水系 川上流路工事	予定 69.2%	工事名: 令和3年度 木曾川水系 アクラ沢管理用道路工事	予定 71.5%	工事名: 令和3年度 中津川出張所管内整備工事	予定 32.3%
契約工期: 令和3年4月20日 ~ 令和4年11月7日	実施	契約工期: 令和3年9月1日 ~ 令和4年8月31日	実施	契約工期: 令和2年9月14日 ~ 令和4年8月31日	実施	契約工期: 令和3年12月1日 ~ 令和4年11月30日	実施
請負業者名: (株)鳴海組	差	請負業者名: (株)中島工務店	差	請負業者名: (株)中島工務店	差	請負業者名: (株)吉川工務店	差
							
今月作業: 河床掘削(土砂搬出)等		今月作業: 床固め工、流路護岸工、構造物撤去工、排水構造物工等		今月作業: キャッピングビーム工、補強土壁工等		今月作業: 柳樽川土砂撤去、中津川第2残土受入れ地等	
来月予定: 河床掘削(土砂搬出)、工事用道路工等		来月予定: 床固め工、流路護岸工、構造物撤去工、道路土工、擁壁工、舗装工等		来月予定: 道路土工、補強土壁工、プレキャスト擁壁工等		来月予定: 中津川第2残土受入れ地、松尾谷管理用道路、砂防教室補助等	
⑤ (落合川流域)	進捗率	⑥ (落合川流域)	進捗率	⑦ (中津川流域)	進捗率		
工事名: 令和3年度 木曾川水系 荒道谷砂防堰堤改築工事	予定 92.6%	工事名: 令和3年度 木曾川水系 薬師沢・冷川砂防堰堤工事	予定 4.7%	工事名: 令和3年度 木曾川水系 中津川護岸整備工事	予定 0.1%		
契約工期: 令和4年1月11日 ~ 令和4年8月31日	実施	契約工期: 令和4年3月14日 ~ 令和5年2月28日	実施	契約工期: 令和4年4月25日 ~ 令和5年2月28日	実施		
請負業者名: (株)鳴海組	差	請負業者名: (株)吉川工務店	差	請負業者名: (株)加藤工務店	差		
							
		馬籠地区 薬師沢		神坂地区 冷川			
今月作業: コンクリート堰堤工		今月作業: 準備工		今月作業: 準備工			
来月予定: コンクリート堰堤工、仮排水撤去、後片付け等		来月予定: コンクリート堰堤工、盛土、土砂運搬等(馬籠地区 薬師沢)		来月予定: 多自然型護岸工(張りコンクリート)、砂防仮締切工等			

## 令和4年4月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

<p>①</p> <p>工事名： 令和3年度 妻木出張所管内整備工事</p> <p>工期： 令和3年12月14日 ~ 令和4年11月30日</p> <p>施工業者： (株)藤本組</p> <p>進捗率： 予定 40.0 %      実施                      差</p> <p style="text-align: center;">指示：2生田護岸</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">指示：6一の洞歩道</p> <p>《今月作業》【指示：8里山林道展望台】土留め工・防止柵工 【指示：6一の洞歩道他】階段工・防止柵工</p> <p>《6月作業》【指示：8里山林道展望台】土留め工・防止柵工 【指示：7一の洞歩道他】階段工・防止柵工</p>	<p>②</p> <p>工事名： 令和3年度 庄内川水系 町・一の洞砂防堰堤工事</p> <p>工期： 令和4年3月28日 ~ 令和5年2月28日</p> <p>施工業者： (株)藤本組</p> <p>進捗率： 予定 1.2 %      実施                      差</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">町地区</p> <p style="text-align: center;">一の洞地区</p> <p>《今月作業》【町地区】準備工 【一の洞地区】準備工(起工測量)</p> <p>《6月作業》【町地区】準備工(起工測量) 【一の洞地区】構造物撤去工、道路土工、排水構造物工</p>
<p>③</p> <p>工事名：                      0</p> <p>工期：                        0</p> <p>施工業者：                  0</p> <p>進捗率：                      差</p>	<p>④</p> <p>工事名：                      0</p> <p>工期：                        0</p> <p>施工業者：                  0</p> <p>進捗率：                      差</p>
<p>《今月作業》</p> <p>《6月作業》</p>	<p>《今月作業》</p> <p>《6月作業》</p>

## 令和4年 4月末 上松出張所 工事進捗状況

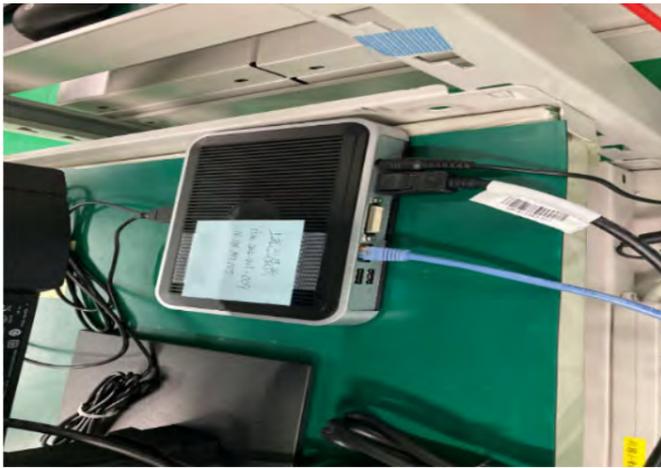
		①	②	③	④
		令和3年度 多治見電機通信設備工事 施工業者 朝日電機工業(株) 進捗率(予定工程) % R3. 9.27~R4. 6.30 週休2日	令和3年度 木曾川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株) 進捗率(予定工程) % R3.12. 1~R5. 1.31 週休2日、ICT	令和3年度 上松出張所管内整備工事 施工業者 大宗土建(株) 進捗率(予定工程) % R3.12. 1~R4.11.30 週休2日	令和3年度 木曾川水系 深沢砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 奥田工業(株) 進捗率(予定工程) % R3.12. 6~R4. 7.29 週休2日、CIM、ICT
					
今月作業		工場立会検査、中津川VOIP-GW移設	5号床固工 5号側壁工 5号水叩き工	・舗装工(指示7) ・敬神の滝周辺整備(指示10) ・伐採工、作業道作成(指示11)	仮設工、伐採、産廃運搬処分、道路土工
来月予定		多治見砂防国道事務所仮想サーバ更新、大桑村光ケーブル敷設	ブロック積擁壁工 底張り工 砂防土工	・伐採工、作業道作成(指示11)	仮設工、産廃運搬処分、道路土工、排水構造物工
		令和3年度 木曾川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 大宗土建(株) 進捗率(予定工程) % R4. 4. 1~R5. 2.28 週休2日、CIM、ICT	令和3年度 木曾川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株) 進捗率(予定工程) % R4. 5. 2~R5. 2.28 週休2日	令和3年度 木曾川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 木曾土建工業(株) 進捗率(予定工程) % R4. 5.10~R5. 2.28 週休2日	令和3年度 木曾川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 木曾土建工業(株) 進捗率(予定工程) % R4. 5.10~R5. 2.28 週休2日
					
今月作業		準備工	-	-	-
来月予定		準備工・仮設舗装工	施工計画	施工計画	-

令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



21号BP(下) 19.30kp 防草シート設置  
工 期：令和02年10月30日～令和05年10月31日  
施工業者：日本ハイウエイ・サービス(株)  
施工箇所：R19 31.5kp～55.2kp  
R21 3.0kp～22.0kp 可児御嵩BP

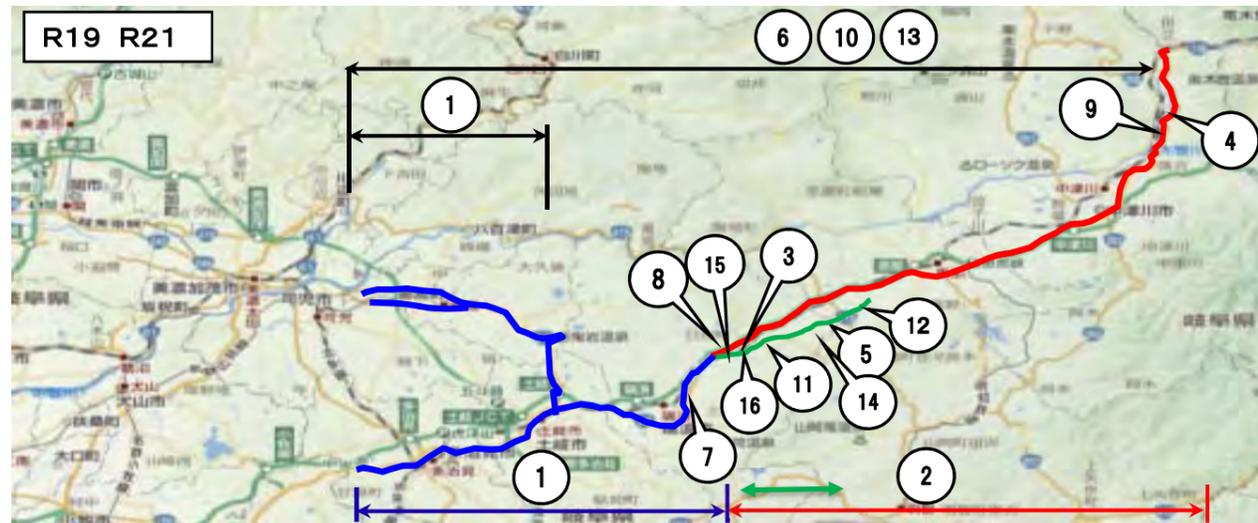

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号76.000kp(下) 道路除草工(機械除草)  
工 期：令和02年04月01日～令和04年10月31日  
施工業者：(有)木曾ハイウエーサービス  
施工箇所：R19 55.2kp～97.0kp

令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

③



4号横断函渠工  
工 期：令和02年09月04日～令和04年05月31日  
施工業者：板垣建設(株)  
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道中津川地区整備工事

④



地山補強土工(2号)  
工 期：令和02年03月29日～令和04年7月28日  
施工業者：(株)加藤工務店  
施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

令和2年度瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事

⑤



道路土工 排水構造物工 月沢川管理用道路  
工 期：令和03年05月11日～令和04年06月3日  
施工業者：恵中建設(株)  
施工箇所：恵那市武並町地先

令和3年度 多治見国道電気通信設備整備工事

⑥



通信設備工(光ケーブル接続)  
工 期：令和03年08月17日～令和04年07月8日  
施工業者：松栄電子工業(株)  
施工箇所：多治見市～中津川市一本松地先

令和3年度 多治見国道小里川橋耐震補強工事

⑦



橋脚巻立て工  
工 期：令和03年09月13日～令和04年06月30日  
施工業者：(株)吉川工務店  
施工箇所：瑞浪市土岐町地先

令和3年度 多治見国道瑞浪地区歩道整備工事

⑧



法面工・舗装工・防護柵工・標識工・道路付属施設工  
工 期：令和03年09月13日～令和04年06月28日  
施工業者：鳴海組  
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和3年度 19号中津川落合地区災害復旧工事

⑨



地盤改良工、重力式擁壁工  
工 期：令和03年11月9日～令和04年08月31日  
施工業者：(株)吉川工務店  
施工箇所：岐阜県中津川市落合

令和3年度 多治見国道橋梁補修工事

⑩



準備工  
工 期：令和04年3月30日～令和04年12月23日  
施工業者：(株)梅田組  
施工箇所：中津川地区(東栗橋、前川橋) 恵那地区(長島第2道専用橋)

令和3年度 瑞浪恵那道路中切道路建設工事

⑪



準備工  
工 期：令和04年03月31日～令和05年03月24日  
施工業者：(株)中島工務店  
施工箇所：恵那市武並町

令和3年度 瑞浪恵那道路中畑道路建設工事

⑫



準備工  
工 期：令和04年04月01日～令和05年02月28日  
施工業者：(株)中島工務店  
施工箇所：瑞浪市釜戸町

令和3年度 瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事

⑬



準備工

工期：令和04年04月01日～令和05年02月28日  
 施工業者：(株)青協建設(株)  
 施工箇所：瑞浪市釜戸町

令和3年度 瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

⑭



準備工

工期：令和04年04月04日～令和05年02月28日  
 施工業者：(株)市川工務店  
 施工箇所：瑞浪市土岐町

令和3年度 多治見国道道路照明設備工事

⑮

準備工

工期：令和04年03月09日～令和05年02月28日  
 施工業者：(株)清水電気商会  
 施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

令和3年度 多治見国道中津川地区整備工事

⑯

写真

準備工

工期：令和04年04月30日～令和04年12月28日  
 施工業者：(株)加藤工務店  
 施工箇所：中津川市山口

⑰

工期：  
 施工業者：  
 施工箇所：

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗
