



国道21号線 坂祝バイパス工事のお知らせ

残暑の候、暑い日が続きますが、皆様には日頃から、坂祝バイパス工事にご理解とご協力を頂きありがとうございます。
ご迷惑をお掛けしますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工いたしますので、ひきつづきご理解、ご協力の程お願い致します。
又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解賜りますようお願い致します。
尚、なにかお気づきの点がございましたら、ご遠慮なく申し付け下さい。**平成25年9月度工事予定**をお知らせ致します。

発注者
国土交通省 中部地方整備局
多治見砂防国道事務所
土岐出張所 0572-54-3722

中央公民館にご意見箱を設置しています。各工事についてお気づきの点がございましたら、ご意見箱に投函していただくか、各現場事務所にてご意見を承ります。



ご意見箱

施工業者

1 **kuriyama**

業者名 (株)栗山組
現場代理人 森田 金也
現場事務所 0574-42-8640
進捗率 83.0%

お知らせ
10月は型枠および足場の解体をおこないます。

9月の作業予定
3回目の側壁・頂版の鉄筋・型枠工事、コンクリート打設を行います。
中旬頃に生コン車が多く通行しますので、ご協力をお願いします。

施工業者

2

業者名 小池土木(株)
現場代理人 土田 裕紀
現場事務所 0574-27-1161
進捗率 7.3%

お知らせ
10月より葦洞池周辺で地盤改良の作業をします。

9月の作業予定
盛土工事を行います。
ダンプトラックが多く通行しますので、ご協力をお願いします。

施工業者

3

業者名 三井住友建設(株)
現場代理人 西海 康弘
現場事務所 0574-23-0460
進捗率 0.4%

お知らせ
工事に伴う騒音振動の測定を随時行います。
10月中旬から防音扉を設置し、昼夜施工を行うための試験施工(騒音測定)を行います。

9月の作業予定
トンネル掘削工事を開始します。
9月中旬より掘削土砂の運搬作業を開始しますので、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

施工業者

4

業者名 北川工務(株)
現場代理人 飯田 正則
現場事務所 0574-49-7282
進捗率 7.8%


お知らせ
10月始め頃より勝山BPへの進入路工を開始しますので、ご協力を御願致します。

9月の作業予定
伐採工事を行います。

※各現場責任者のヘルメットには『現場代理人』・『監理技術者』と赤いシールが貼ってありますので、ご気軽に声をお掛けください。


現場代理人 監理技術者

各工事範囲と期間

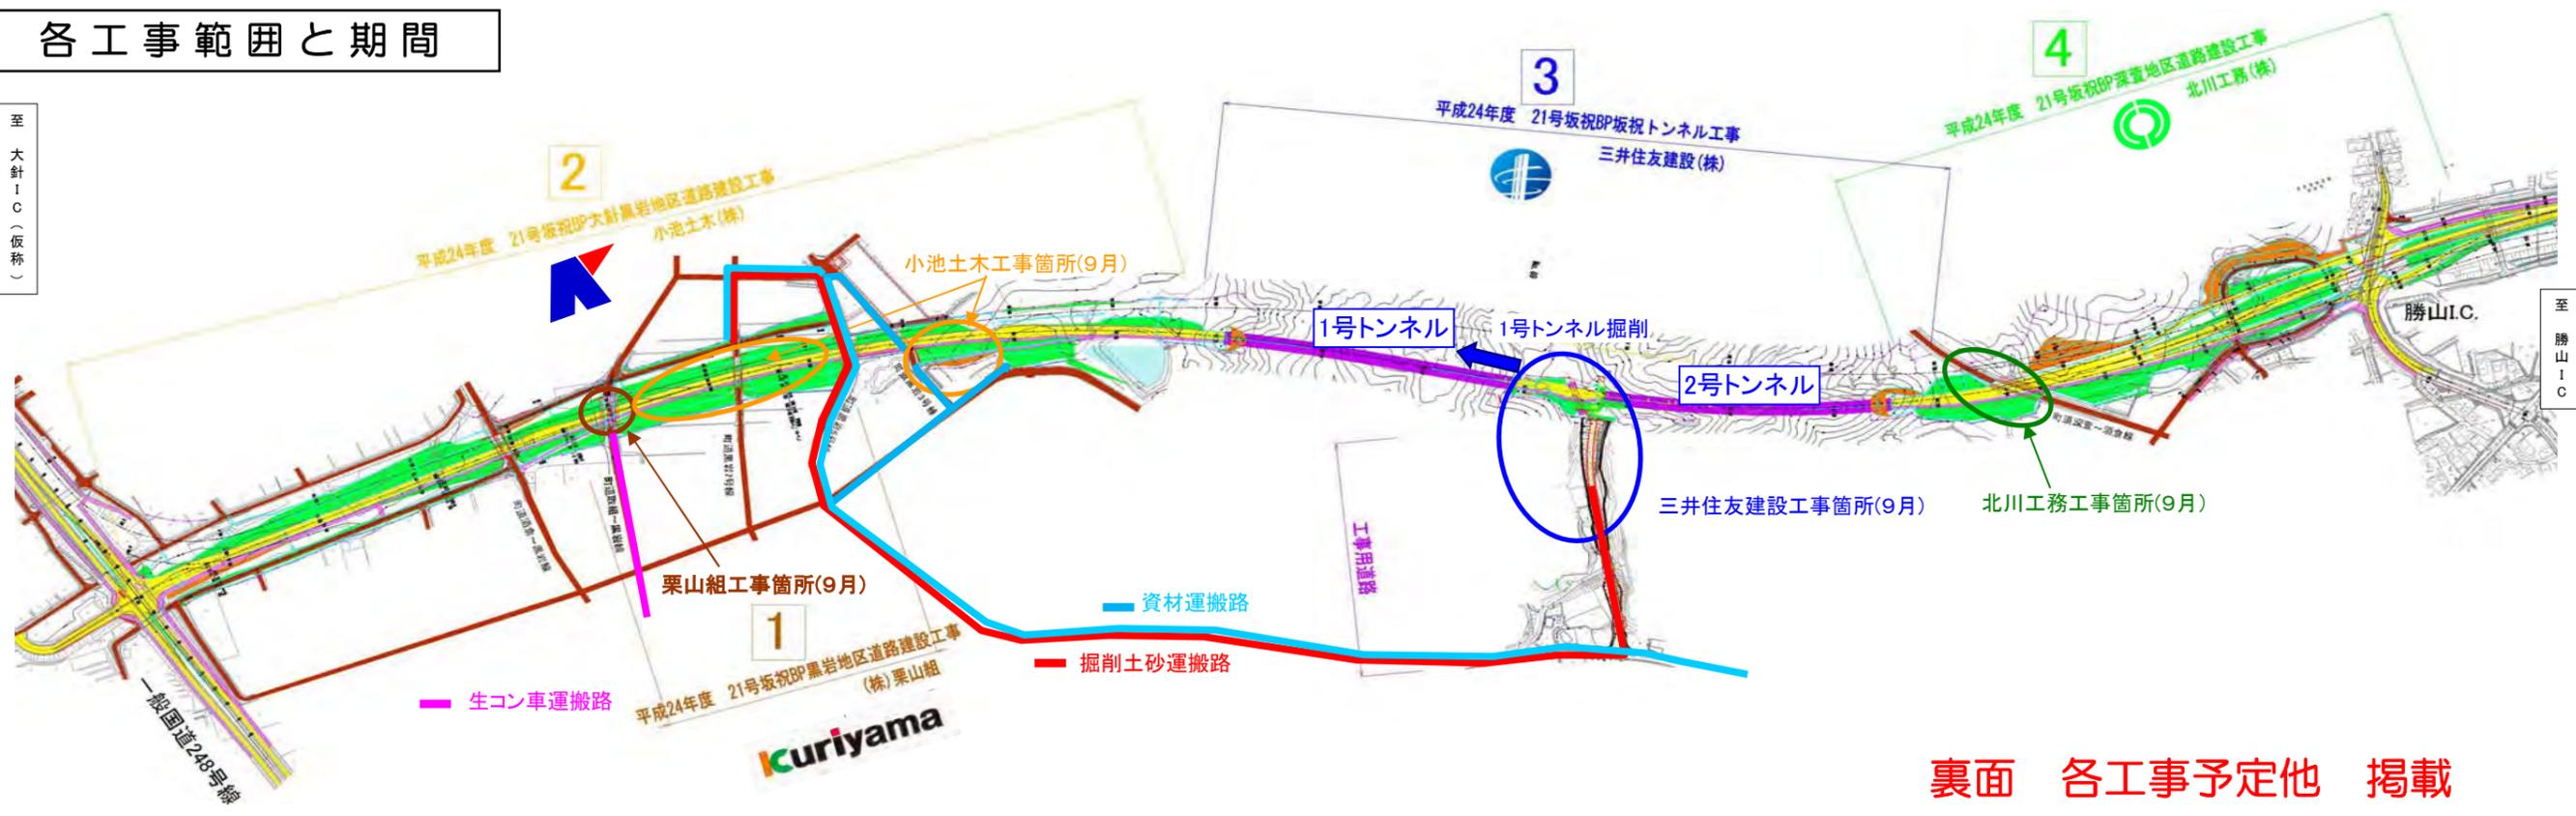

裏面 各工事予定他 掲載


1 平成24年度 21号坂祝BP黒岩地区道路建設工事 施工業者:(株)栗山組 

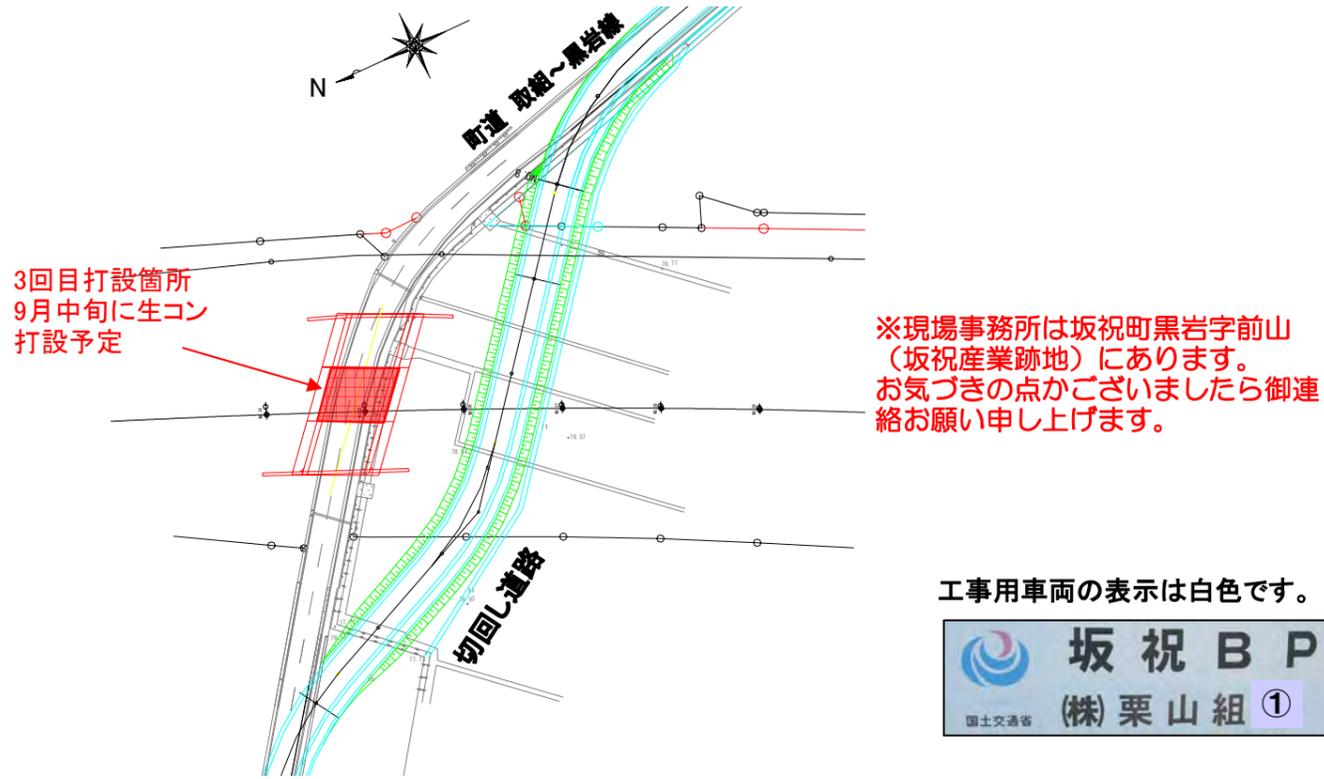


3回目打設箇所
9月中旬に生コン
打設予定

※現場事務所は坂祝町黒岩字前山
(坂祝産業跡地)にあります。
お気づきの点かございましたら御連絡
お願い申し上げます。

工事用車両の表示は白色です。



3 平成24年度 21号坂祝BP坂祝トンネル工事 施工業者:三井住友建設(株) 

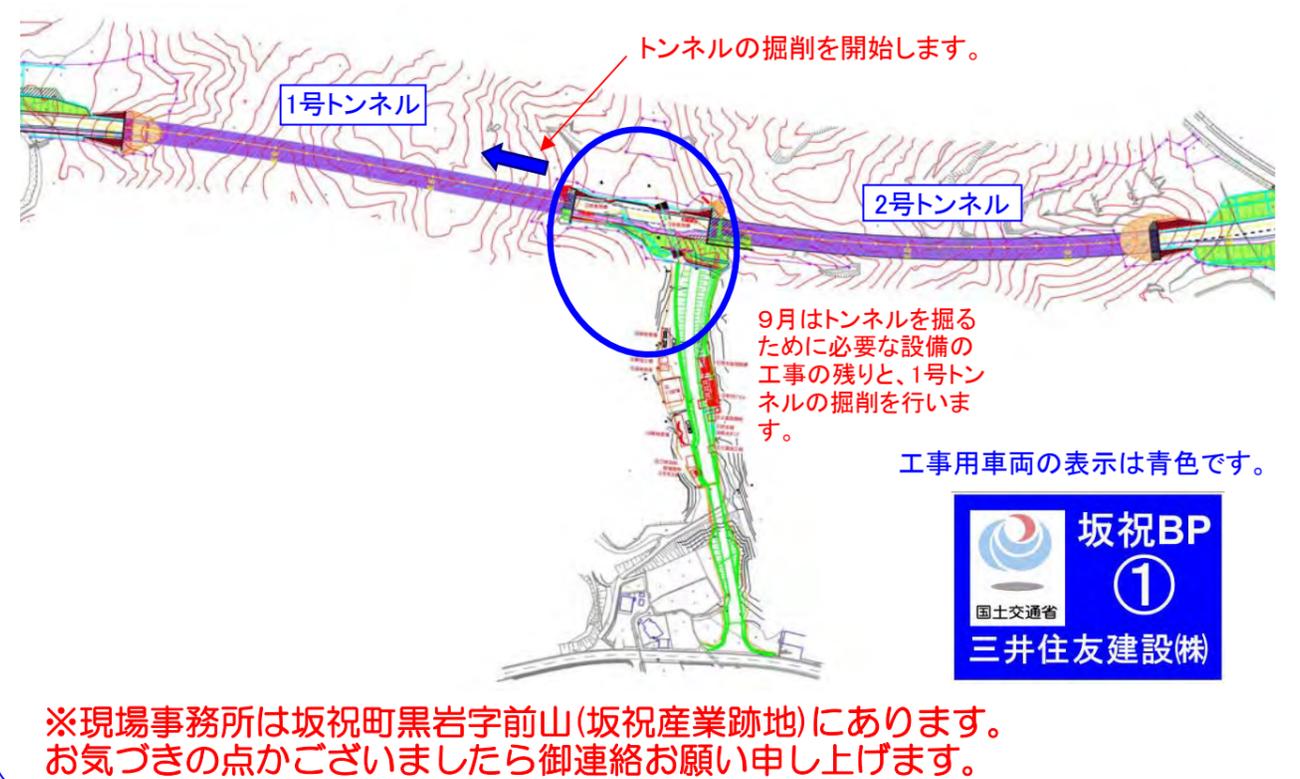

トンネルの掘削を開始します。

1号トンネル

2号トンネル


9月はトンネルを掘る
ために必要な設備の
工事の残りと、1号トン
ネルの掘削を行います。

工事用車両の表示は青色です。



※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。
お気づきの点かございましたら御連絡お願い申し上げます。

2 平成24年度 21号坂祝BP大針黒岩地区道路建設工事 施工業者:小池土木(株) 

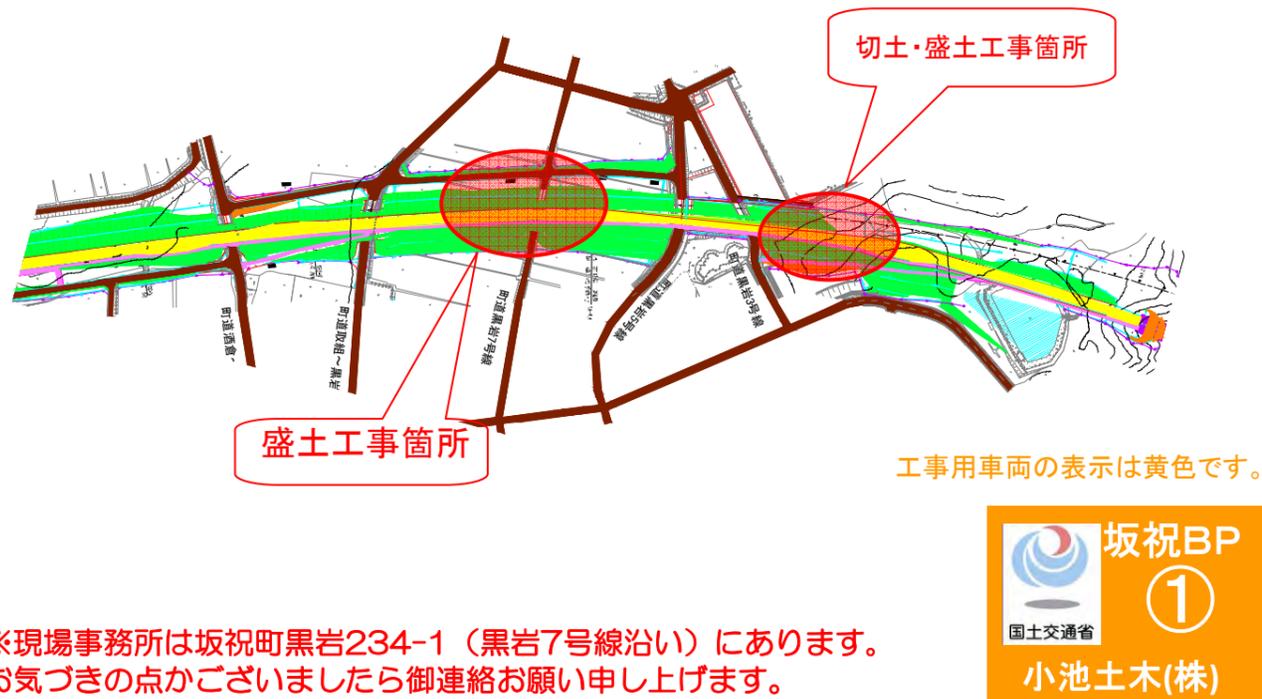

切土・盛土工事箇所


盛土工事箇所

工事用車両の表示は黄色です。



※現場事務所は坂祝町黒岩234-1 (黒岩7号線沿い) にあります。
お気づきの点かございましたら御連絡お願い申し上げます。

4 平成24年度 21号坂祝BP深萱地区道路建設工事 施工業者:北川工務(株) 

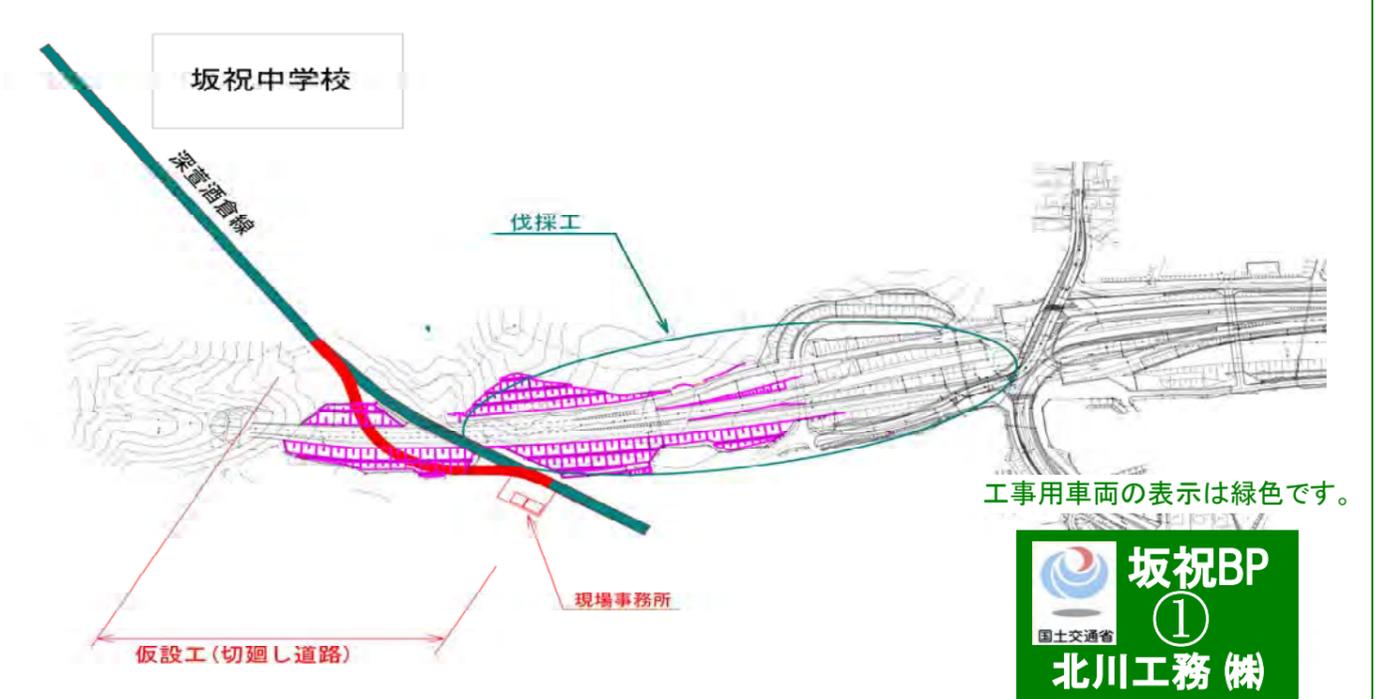

坂祝中学校

深萱酒會棟

伐採工

現場事務所

仮設工(切廻し道路)

工事用車両の表示は緑色です。

