



国道21号線 坂祝バイパス工事のお知らせ

初秋の候、暑い日が続きますが、皆様には日頃から、坂祝バイパス工事にご理解とご協力を頂きありがとうございます。
 ご迷惑をお掛けしますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工いたしますので、ひきつづきご理解、ご協力の程お願い致します。
 又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解賜りますようお願い致します。
 尚、なにかお気づきの点がございましたら、ご遠慮なく申し付け下さい。**平成25年10月度工事予定**をお知らせ致します。

発注者
 国土交通省 中部地方整備局
多治見砂防国道事務所

土岐出張所 0572-54-3722

中央公民館にご意見箱を設置しています。各工事についてお気づきの点がございましたら、ご意見箱に投函していただくか、各現場事務所にてご意見を承ります。



ご意見箱

施工業者

1 **kuriyama**

業者名 現場代理人 現場事務所 進捗率	(株)栗山組 森田 金也 0574-42-8640 89.0%
お知らせ	11月は門型函渠内の側溝及び舗装を行います。
10月の作業予定	門型函渠の足場の解体、および支保工の解体をおこないます。

施工業者

2

業者名 現場代理人 現場事務所 進捗率	小池土木(株) 土田 裕紀 0574-27-1161 20.0%
お知らせ	11月より葦洞池周辺で擁壁の生コン打設の作業を行います。
10月の作業予定	葦洞池付近で地盤改良工事を行います。資材運搬のトラックが多く通行しますので、ご協力をお願いします。

施工業者

3

業者名 現場代理人 現場事務所 進捗率	三井住友建設(株) 西海 康弘 0574-23-0460 3.5%
お知らせ	11月は1号トンネルの掘削、残土搬出の作業が主体となります。
10月の作業予定	トンネル掘削、土砂運搬工事を行います。10月20日頃、防音扉を設置します。部分的に発破を使用する可能性があります。ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

施工業者


4

業者名 現場代理人 現場事務所 進捗率	北川工務(株) 飯田 正則 0574-49-7282 11.2%
お知らせ	10月中旬頃より深萱酒倉線の仮設道路の切通しを行います。
10月の作業予定	伐採工事を行います。勝山BPへの進入路を開始しますので、ご協力を御願致します。

※各現場責任者のヘルメットには『現場代理人』・『監理技術者』と赤いシールが貼ってありますので、ご気軽に声をお掛けください。

現場代理人 監理技術者

各工事範囲と期間

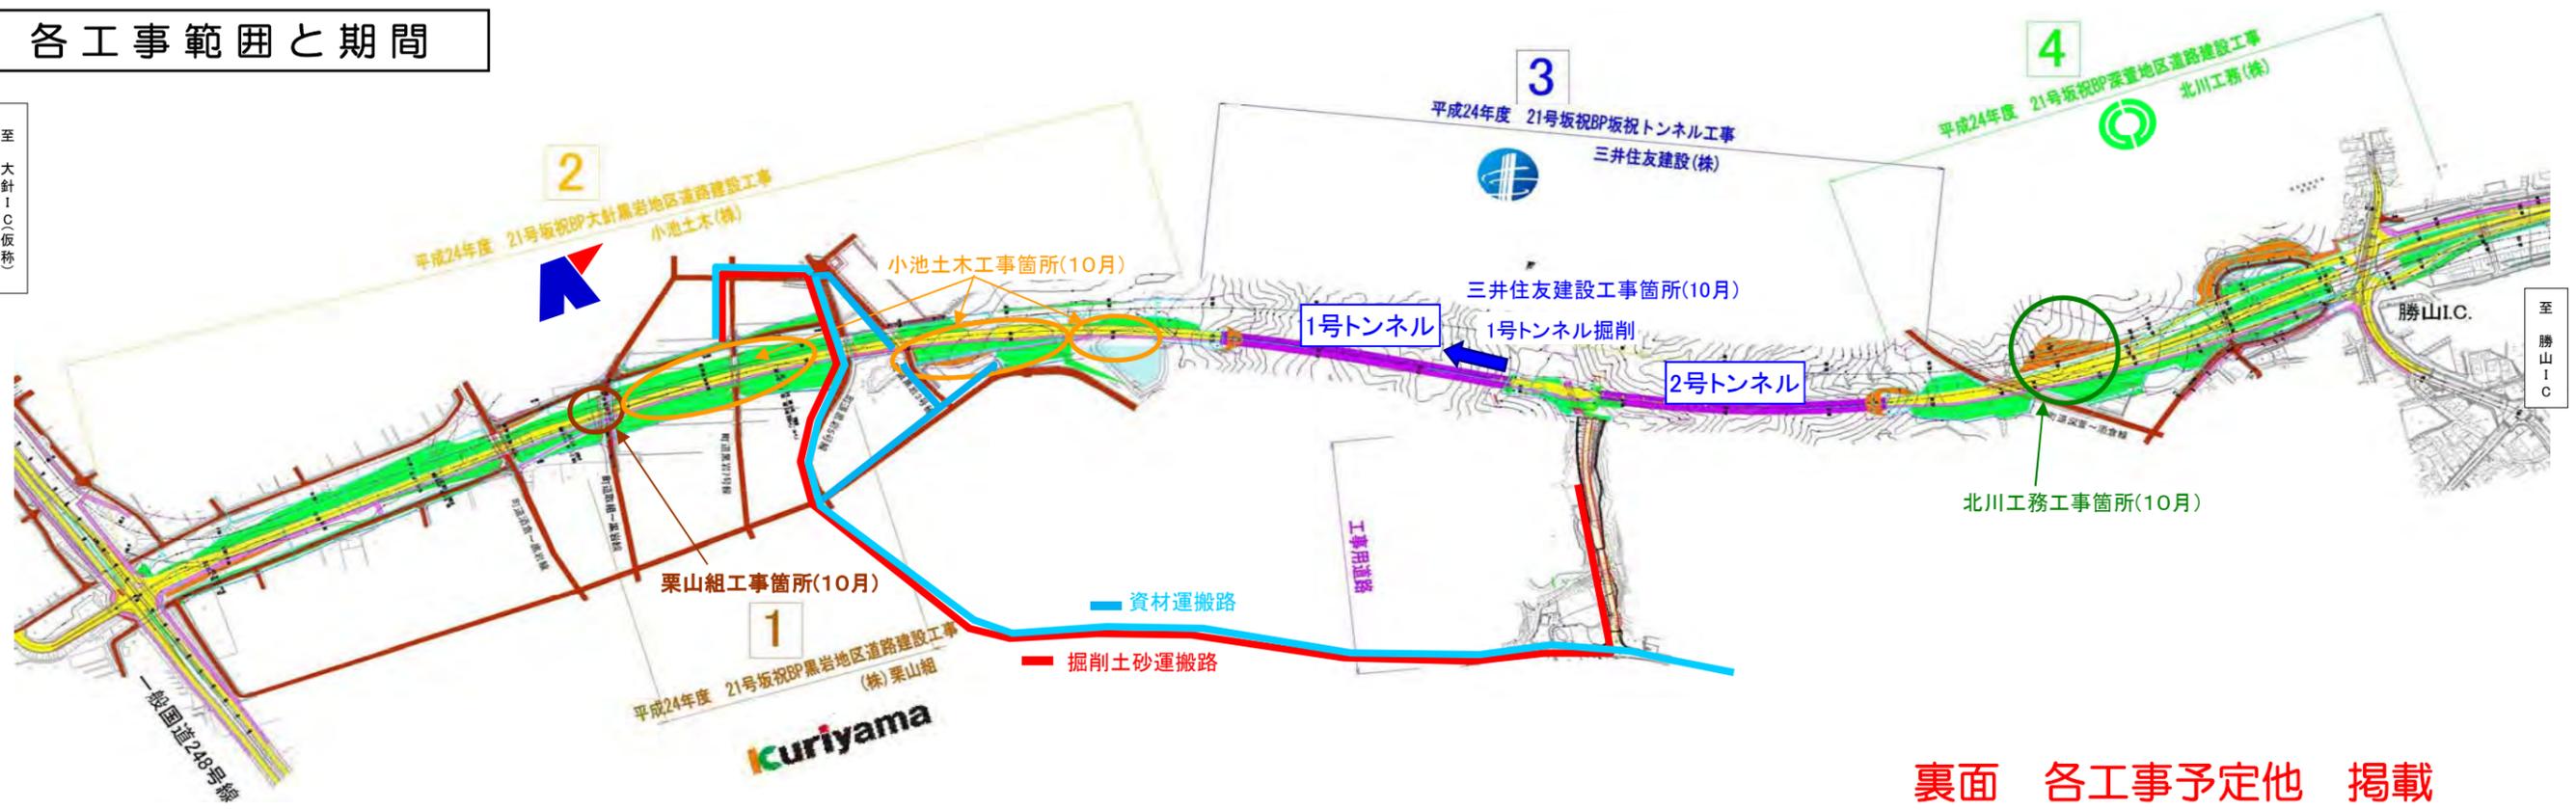

裏面 各工事予定他 掲載


平成25年 10月 (予定)

裏面

1

平成24年度 21号坂祝BP黒岩地区道路建設工事 施工業者:(株)栗山組 

標準断面図

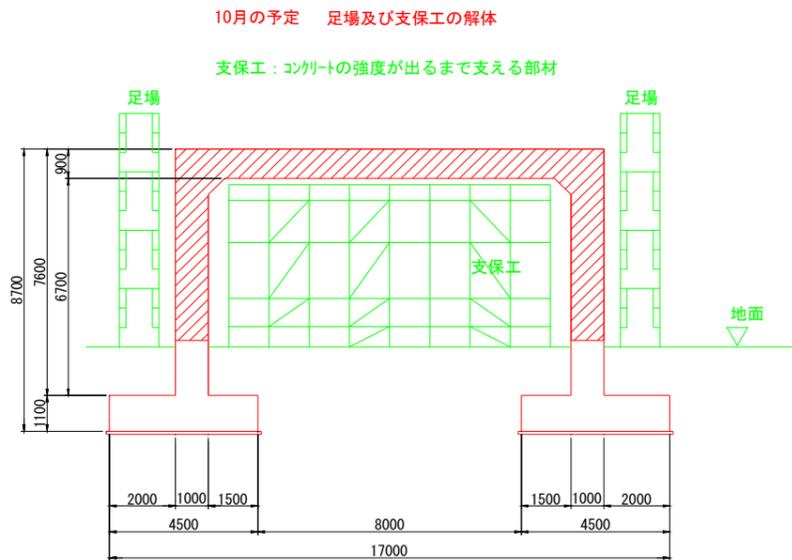


※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。お気づきの点かございましたら御連絡お願い申し上げます。

工事用車両の表示は白色です。



3

平成24年度 21号坂祝BP坂祝トンネル工事 施工業者:三井住友建設(株) 

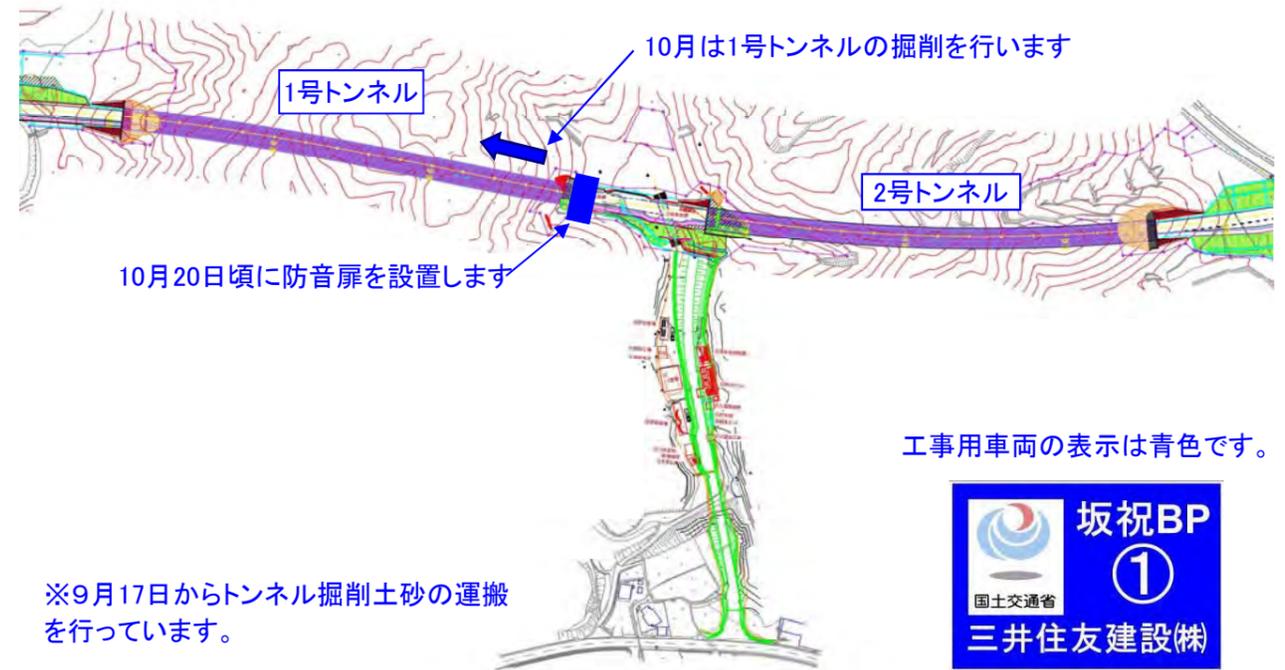

工事用車両の表示は青色です。




※9月17日からトンネル掘削土砂の運搬を行っています。

※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。


2

平成24年度 21号坂祝BP大針黒岩地区道路建設工事 施工業者:小池土木(株) 

パワーブレンド-工法概要図

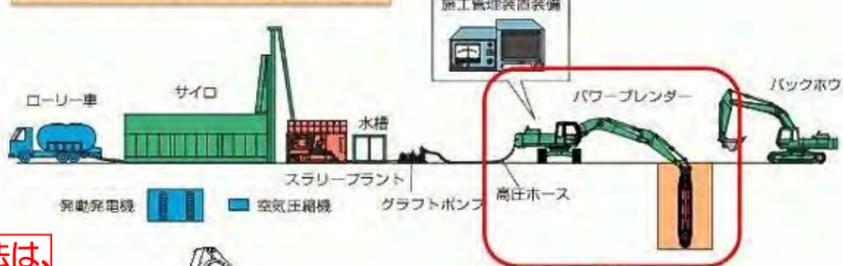

パワーブレンド-工法は、地盤改良を行うものです。

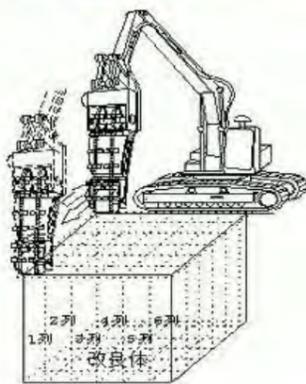

工事用車両の表示は黄色です。



※現場事務所は坂祝町黒岩234-1(黒岩7号線沿い)にあります。

4

平成24年度 21号坂祝BP深萱地区道路建設工事 施工業者:北川工務(株) 

