

地域の皆様へ



国道21号線 坂祝バイパス工事のお知らせ

木枯らしの冷たさが身にしみる季節になりましたが、皆様には日頃から、坂祝バイパス工事にご理解とご協力を頂きありがとうございます。ご迷惑をお掛けしますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工いたしますので、ひきつづきご理解、ご協力の程お願い致します。

又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解賜りますようお願い致します。尚、なにかお気づきの点がございましたら、ご遠慮なく申し付け下さい。平成25年12月度工事予定をお知らせ致します。

平成25年12月

表面

発注者




土岐出張所 0572-54-3722

中央公民館にご意見箱を設置しています。各工事についてお気づきの点がございましたら、ご意見箱に投函していただくか、各現場事務所にてご意見を承ります。



ご意見箱

<p>1 業者名 栗山組 kuriyama 現場代理人 森田 金也 現場事務所 0574-42-8640 進捗率 100.0%</p>	<p>2 業者名 小池土木(株) 現場代理人 土田 裕紀 現場事務所 0574-27-1161 進捗率 47.0%</p>	<p>3 業者名 三井住友建設(株) 現場代理人 西海 康弘 現場事務所 0574-23-0460 進捗率 17.5%</p>	<p>4 業者名 北川工務(株) 現場代理人 飯田 正則 現場事務所 0574-49-7282 進捗率 58.7%</p>
<p>お知らせ 11月29日をもって、無事に工事を完了することが出来ました。皆様のご理解・ご協力に心より感謝申し上げます。</p> <p>12月の作業予定 完了</p>	<p>お知らせ 1月は引続き葦洞池周辺の擁壁工事・堤体工事を行います。中央公民館北側で、盛土および地盤改良工事を行います。</p> <p>12月の作業予定 葦洞池付近で擁壁工事を行います。資材運搬のダンプトラックが多く通行しますので、ご協力をお願いします。</p>	<p>お知らせ 1月は1号トンネルの掘削、残土搬出の作業および2号トンネルの入口部分の工事、さらに、1号トンネルの中央公民館側の工事を行います。</p> <p>12月の作業予定 トンネル掘削、土砂運搬工事を行います。発破を使用する作業となります。ご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。</p>	<p>お知らせ 1月も本線の掘削・盛土作業を行います。</p> <p>12月の作業予定 本線の掘削・盛土作業を行います。また、切土箇所の法面保護として吹付けを行います。</p>
<p>5 業者名 青協建設(株) 現場代理人 林 伸一 現場事務所 0574-42-8056 進捗率 3.0%</p> <p>お知らせ 12月からプールと総合グラウンド間の町道黒岩2号線を通行止めにして工事を行います。1月は地盤改良工事を行います。</p> <p>12月の作業予定 通行止め予定日：12月5日～ 調整池に進入する為、道路から進入路を設置して掘削を行います。通行止めによりご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い致します。</p>	<p>6 業者名 北川工務(株) 現場代理人 所 和之 現場事務所 0574-49-7199 進捗率 4.0%</p> <p>お知らせ 1月は仮排水路の設置を行います。</p> <p>12月の作業予定 12月は、仮排水路の掘削、土砂運搬を行います。土砂運搬車両が通行します。ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力をよろしくお願い致します。</p>	<p>7 業者名 市川工務店 現場代理人 山口 豪 現場事務所 0574-27-5380 進捗率 0.0%</p> <p>お知らせ 1月は切回し迂回路の工事と、地下横断歩道の東側の工事を予定しています。</p> <p>12月の作業予定 今月は現地調査等、準備工を行います。その後、場内の整備・整地を行います。ご迷惑をおかけします。よろしくお願い致します。</p>	<p>お知らせ 国土交通省多治見砂防国道事務所HPを是非ご覧ください。 http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/r21/sakahogibp/</p>

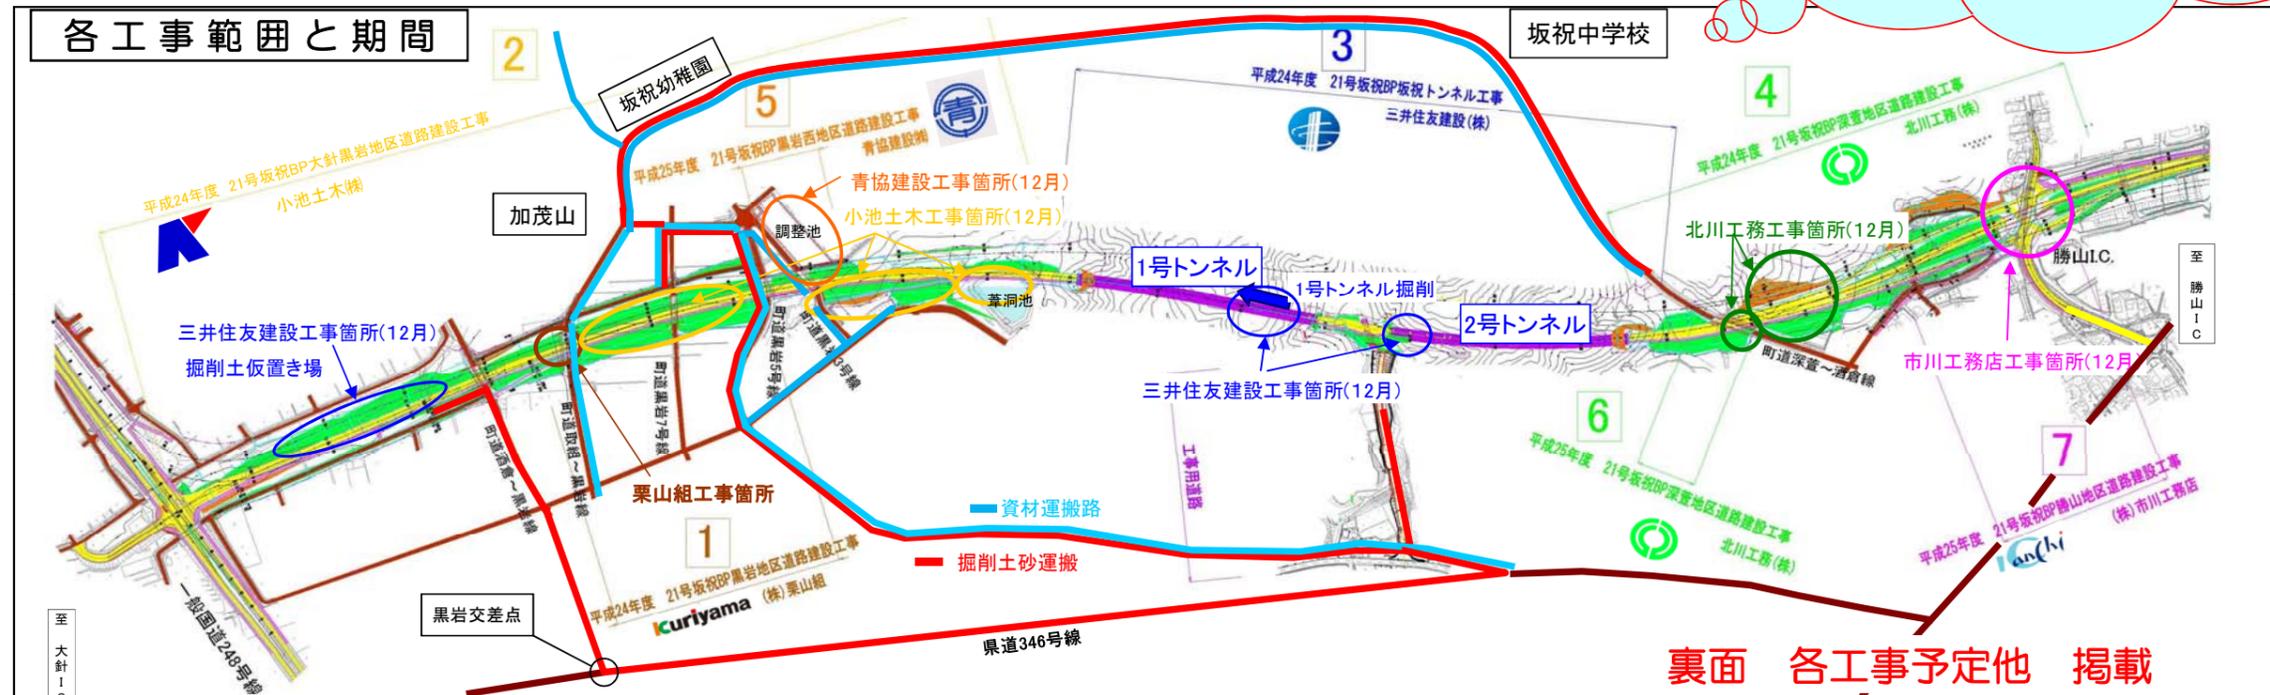

裏面 各工事予定他 掲載


1 平成24年度 21号坂祝BP黒岩地区道路建設工事
施工業者:(株)栗山組



長い間、町道の通行の際にはご不便をおかけしましたが、11月29日をもって工事を完了することが出来ました。

工事全体として約13ヶ月の間、皆様のご理解のもとに工事を施工できたことに御礼申し上げます。


2 平成24年度 21号坂祝BP大針黒岩地区道路建設工事
施工業者:小池土木(株)

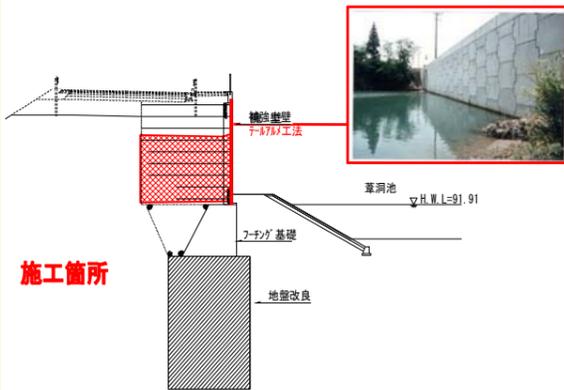

※現場事務所は坂祝町黒岩234-1 (黒岩7号線沿い) にあります。お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

工事用車両の表示は黄色です。

3 平成24年度 21号坂祝BP坂祝トンネル工事
施工業者:三井住友建設(株)

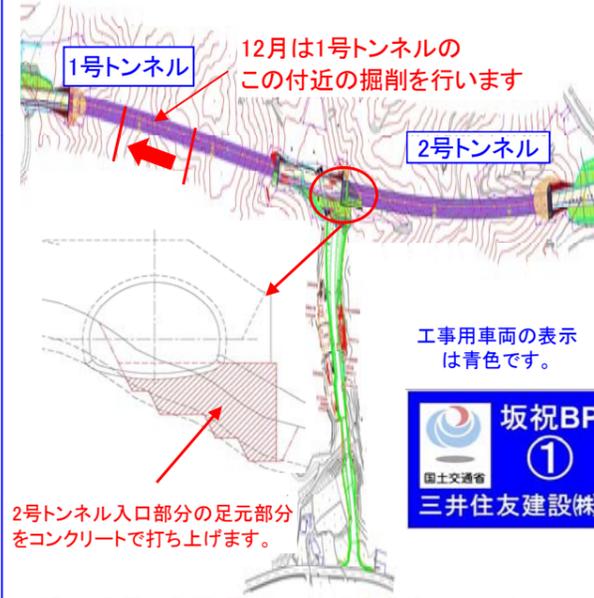

12月は1号トンネルのこの付近の掘削を行います

2号トンネル入口部分の足元部分をコンクリートで打ち上げます。

工事用車両の表示は青色です。

※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

4 平成24年度 21号坂祝BP深萱地区道路建設工事
施工業者:北川工務(株)



※現場事務所は坂祝町深萱(教員住宅跡地)東側にあります。お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

工事用車両の表示は緑色です。

5 平成25年度 21号坂祝BP黒岩西地区道路建設工事
施工業者:青協建設(株)



当社の工事では総合グラウンド北側にて、調整池内の擁壁工事を行います。12月は擁壁工の掘削工事と進入路の設置を行います

工事用車両の表示はオレンジ色です。

※現場事務所は坂祝町黒岩字宮前(加茂山団地駐車場内)に設置しました。お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

工事用車両の表示はオレンジ色です。

6 平成25年度 21号坂祝BP深萱地区道路建設工事
施工業者:北川工務(株)



12月は仮排水路(町道深萱酒倉線に並行する水路の切り直し)を行います。

工事用車両の表示は緑色です。

※現場事務所は坂祝町深萱(教員住宅跡地)に設置いたしました。お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

工事用車両の表示は緑色です。

7 平成25年度21号坂祝BP勝山地区道路建設工事
施工業者:㈱市川工務店



地下横断歩道と町道切り回し迂回路を作成する工事です。

工事用車両の表示はピンク色です。

※現場事務所を坂祝町深萱79-6に設置しました。お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

工事用車両の表示はピンク色です。
